



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓...../๒๕๖๖.....

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชด ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอัคระเดชา ตำแหน่ง รจก.(ท.) กฟจ.สพ.

ด้วยการไฟฟ้าสุพรรณบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อรื้อถอน ปักเสาและพาดสายแรงสูง สถานีสุพรรณบุรี๒ บริเวณเลยร้านเจ๊อหมูนเตอร์-Disลานตากข้าวสามเหลี่ยม ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน...๑...แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	๑๐ สพ.๒	๑๘/๑๑/๖๖	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	รื้อถอนปักเสา และพาดสาย เส้นเลี้ยงเมือง	DDE จุด A	DOA ๐๙5-๐๙	โทร.๐๙๘- ๒๗๕๓๖๔๐

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธนากร สุวรรณประทีป ตำแหน่ง พทง.๖ (สข.) โทร ๐๘๑-๔๓๒๐๒๖๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอัคระเดชา.....)

ตำแหน่ง..... รจก.(ท.) กฟจ.สพ.....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ SPB10 จาก ขั้วแรงดัน ๑๑๐KV ถึง DOA 9S-09.

ในวันที่ 18 พ.ย. 66 ตั้งแต่เวลา ๐8.๐๐ น. ถึง 17.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1661/2566

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย พัทธนันท์ พิชราสุวรรณชด ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายธนากร สุวรรณประทีป

(นาย พัทธนันท์ พิชราสุวรรณชด)

ว.ศ.ก. 5 บ.ท.น. ขย.ค.ค.

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผคฟ. (สถานี.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟจ. สพ

อก.บช.(ก.๓),.....

อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รจก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิทชิง

1. สถานที่ทำงาน	เลยโรงงานเจ็ญหมอินเตอร์					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	18 พ.ย. 66	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	18 พ.ย. 66	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ.สพ.	งานที่ทำ	รีดถอนเสา ปักเสา พาดสาย		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1661/2566	
4. เตรียมการสวิทชิงโดย	นายพนิต ราชบุรีนิยม			วันที่	12 พฤศจิกายน 2566	
5. ตรวจสอบสวิทชิงโดย				วันที่	12 พฤศจิกายน 2566	
6. อนุมัติสวิทชิงโดย				วันที่	12 พฤศจิกายน 2566	
7. สั่งทำสวิทชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนเฑาะ 2. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต 3. นายนครินทร์, นส.พิชยา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	<u>ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิทชิง</u>						
2	SPB10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPB		-
3	<u>เมื่อพร้อมดับไฟ</u>						
4	<u>แจ้งกฟจ.สพ.ไลน์โหลด บริเวณเลยโรงงานเจ็ญหมอินเตอร์ (ตามผังแนบ)</u>						
5	<u>เมื่อกฟจ.สพ.ไลน์โหลด บริเวณเลยโรงงานเจ็ญหมอินเตอร์ (ตามผังแนบ) แล้วเสร็จ</u>						
6	<u>แจ้งชุดขอทไลน์กระแสเข้าตัดเดท บริเวณเลยโรงงานเจ็ญหมอินเตอร์ (ตามผังแนบ)</u>						
7	<u>หลังจากชุดขอทไลน์กระแสเข้าตัดเดท บริเวณเลยโรงงานเจ็ญหมอินเตอร์ (ตามผังแนบ) แล้วเสร็จ</u>						
8	<u>แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานทราบ</u>						
9	<u>แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1</u>						
10	<u>แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2</u>						
11	<u>เมื่อชุดปฏิบัติงาน Test ไฟ และ Short Ground พร้อมลงใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว</u>						
12	<u>แจ้งชุดปฏิบัติงานลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว</u>						
13	SPB10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPB		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
14	<u>เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานแล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหลดกลับ</u>						
15	SPB10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPB		-
16	<u>แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1</u>						
17	<u>แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2</u>						
18	<u>ยืนยันการลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว</u>						
19	<u>แจ้งชุดขอทไลน์กระแสเข้าเชื่อมเดท บริเวณเลยโรงงานเจ็ญหมอินเตอร์ (ตามผังแนบ)</u>						
20	<u>หลังจากชุดขอทไลน์กระแสเข้าเชื่อมเดท บริเวณเลยโรงงานเจ็ญหมอินเตอร์ (ตามผังแนบ) แล้วเสร็จ</u>						
21	<u>แจ้งกฟจ.สพ.นำโหลด บริเวณเลยโรงงานเจ็ญหมอินเตอร์ กลับตามปกติ</u>						
22	<u>เมื่อกฟจ.สพ.นำโหลด บริเวณเลยโรงงานเจ็ญหมอินเตอร์ กลับตามปกติ แล้วเสร็จ</u>						
23	SPB10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPB		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบ.กฟจ.สพ.

ถึง ผจก.กฟจ.สพ.

เลขที่ ก.๓ สพ.(ปบ.)-

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖


เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟจ.สพ./รจก.กฟจ.สพ.

ด้วยในวันที่...๑๘...เดือน...พฤศจิกายน...พ.ศ. ...๒๕๖๖... ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. กฟจ.สุพรรณบุรี มีแผนงานดับไฟฟ้าบริเวณ ...เลยโรงงานเจ็ทหมูอินเตอร์-ลานตากข้าวสามเหลี่ยม ...เพื่อ...รื้อถอน,ปักเสาแรงสูงและพาดสายแรงสูง สถานีสุพรรณบุรี๒...โดยมีรายละเอียดที่ขอปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้


พีดเดอร์ ..๑๐.. สถานีฯ ...สุพรรณบุรี ๒... ตั้งแต่บริเวณ ..เลยโรงงานเจ็ทหมูอินเตอร์-ลานตากข้าวสามเหลี่ยม


กฟจ.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้นาย เดชาวัต คงเจริญ พง.๖ ผจก.กฟจ.สพ. เบอร์โทรศัพท์ ...๐๙๐-๑๔๓๙๑๑๔.. เป็นผู้ควบคุมงานและให้..นายวรพล สุทธิไกร ..ตำแหน่ง หน.กส.กฟจ.สพ..เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ..๐๙๘-๒๗๕๓๖๔๐..เป็นผู้ประสานงานการดับไฟเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด

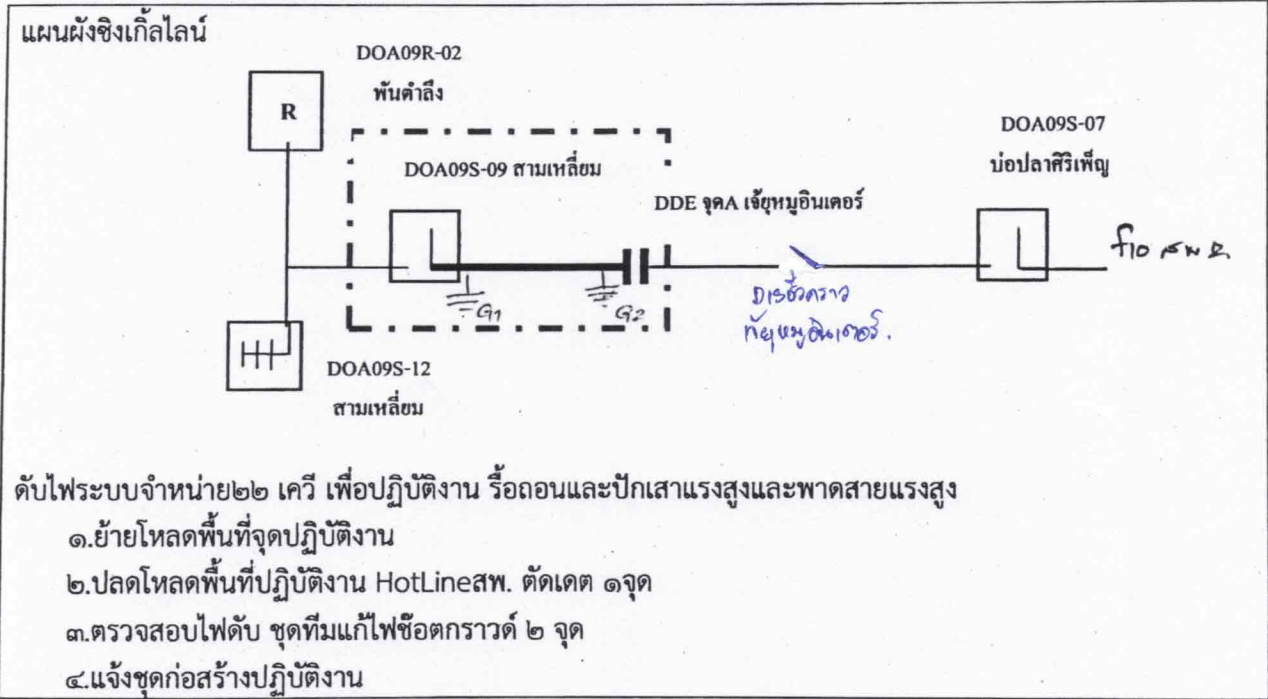


- ดับไฟระบบจำหน่าย๒๒ เควี เพื่อปฏิบัติงาน รื้อถอนและปักเสาแรงสูงและพาดสายแรงสูง
- ๑.ย้ายโหลดพื้นที่จุดปฏิบัติงาน
 - ๒.ปลดโหลดพื้นที่ปฏิบัติงาน HotLineสพ. ตัดเด็ด ๑จุด
 - ๓.ตรวจสอบไฟดับ ชุดทีมแก้ไขข้อบกพร่อง ๒ จุด
 - ๔.แจ้งชุดก่อสร้างปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย

อนุมัติ 


 (นายกิตติพัฒน์ สุวรรณประทีป)
 พง.๖(สข.) ผบ.กฟจ.สพ.

(นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอัครเดชา)
 รองผู้จัดการปฏิบัติงานแทนผู้จัดการ
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรี

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา 
 โทร. ๐๓๕-๕๓๕๑๖๗-๘ , ๑๔๘๕๕ , ๑๔๘๖๐
