



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.ตสร. - ๒๕๖๕ / ๒๕๖๕

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายสันติ โรจนธรรมเจริญ

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟย.บ.ตสร.

ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาซอยบ้านตลาดสำโรง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง สถานีไฟฟ้า ท.ท.ม.ว.๒. ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	ไฟฟ้าดับจาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	F๑	๒๓ ต.ค. ๒๕๖๕	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	ป.ระบบจำหน่ายแรงสูง ย้ายแนว บริเวณบ้านค้อละออม	หน้า สนง.กฟย.บ. ตสร. SF๖ TMS-11	หน้าวัดบ้านใหม่ SF๖ TMA4S-12	นายนิติรักษ์ ศรีอนันต์

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บ้านค้อละออม

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายชลพัฒน์ ศรีเกิดศรีน ตำแหน่ง พชง.๖ กฟย.บ.ตสร. โทร. ๐๖๒-๔๐๗-๔๑๓๔.

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสันติ โรจนธรรมเจริญ..)

ผจก.กฟย.บ.ตสร.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ TMV1 จาก TMV1S-11 ถึง TMA4S-12  
ในวันที่ 23 ต.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 08-00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1662/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย อมร โมกขพันธ์ 18 ต.ค. 65  
ประสานงานการขอดับไฟกับ นายเลฬินทร์ ศรีภักดิ์

สทพร ตันธักเศรษฐกิจ  
(ทยรทพร ตันธักเศรษฐกิจ)  
วศท.7 ปฏิบัติงานแทน นย.ฉพ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กพร.ทพ., กพช.ตลธ.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น  
แผนผังแนบ 1 แผ่น



ผจพ. - (สถานี - )

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลฬังค์ แก่นจันทร์)  
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลฬังค์ แก่นจันทร์)  
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)


## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน บริเวณบ้านค้อละออม
2. กำหนดวันที่ทำงาน 23 ต.ค. 65      ระหว่าง 08.00 น.      ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กพย.ตสร.      งานที่ทำ ปรับปรุงระบบจำหน่าย      ตามใบขอปฏิบัติงาน 1662/2565
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายอมร โมกขพันธ์      วันที่ 19 ตุลาคม 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย       วันที่ 19 ตุลาคม 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย       วันที่ 19 ตุลาคม 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายโมฆ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
  2. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
  3. นายเพชรรัตน์, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์และสวิตซ์ตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	TMA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA		- โหลด 3.38 MW
3	TMV01R-02	Normal	Non-Reclosing		ตสร.		R กลางทุ่งบ้านหนองพังตรู
4	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน เวลา 08.00 น.						
5	TMV01S-11	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ตสร.		SF6 ช่าง สนง.สำโรง
6	ตรวจสอบสถานะ SF6 รหัส TMA04S-12 (วัดบ้านใหม่) อยู่ตำแหน่ง "ปลด" พร้อมล็อคคาน						
7	แจ้ง กพย.ตสร. ทำการทดสอบ, ข้อตกลงจุด G1						
8	แจ้ง กพย.ตสร. ทำการทดสอบ, ข้อตกลงจุด G2						
9	แจ้ง กพย.ตสร. ทำการทดสอบ, ข้อตกลงจุด G3						
10	แจ้ง กพย.ตสร. ทำการทดสอบ, ข้อตกลงจุด G4						
11	แจ้งรถกระเช้า ทมง. ทำการตัด DDE จุด A บริเวณบ้านค้อละออม ออกทั้ง 3 เฟส						
12	แจ้งรถกระเช้า ทมง. ทำการตัด DDE จุด B บริเวณบ้านค้อละออม ออกทั้ง 3 เฟส						
13	หลังจากรถกระเช้า ทมง. ดำเนินการแล้วเสร็จทั้ง 2 จุด						
14	แจ้ง กพย.ตสร. ทำการปลดข้อตกลงจุด G3						
15	แจ้ง กพย.ตสร. ทำการปลดข้อตกลงจุด G4						
16	TMV01S-11	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ตสร.		SF6 ช่าง สนง.สำโรง
17	TMA04S-12	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ทมง.		SF6 วัดบ้านใหม่
18	หลังจาก กพย.ตสร. ดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย						
19	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ กพย.ตสร. รับทราบและปฏิบัติงานได้						
20	TMA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA		-
21	TMV01R-02	Non-Reclosing	Normal		ตสร.		R กลางทุ่งบ้านหนองพังตรู
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
22	เมื่อ กพย.ตสร. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
23	TMA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA		-
24	TMV01R-02	Normal	Non-Reclosing		ตสร.		R กลางทุ่งบ้านหนองพังตรู
25	TMV01S-11	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ตสร.		SF6 ช่าง สนง.สำโรง
26	TMA04S-12	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ทมง.		SF6 วัดบ้านใหม่

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	แจ้ง กพย.ตสร. ทำการทดสอบ, ข้อตรวจวัดจุด G3						
28	แจ้ง กพย.ตสร. ทำการทดสอบ, ข้อตรวจวัดจุด G4						
29	หลังจาก กพย.ตสร. ดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย						
30	แจ้งรถกระเช้า ทมข. ทำการเชื่อม DDE จุด A บริเวณบ้านค้อละออม เข้าทั้ง 3 เฟส						
31	แจ้งรถกระเช้า ทมข. ทำการเชื่อม DDE จุด B บริเวณบ้านค้อละออม เข้าทั้ง 3 เฟส						
32	หลังจากรถกระเช้า ทมข. ดำเนินการแล้วเสร็จทั้ง 2 จุด						
33	แจ้ง กพย.ตสร. ทำการปลดข้อตรวจวัดจุด G1						
34	แจ้ง กพย.ตสร. ทำการปลดข้อตรวจวัดจุด G2						
35	แจ้ง กพย.ตสร. ทำการปลดข้อตรวจวัดจุด G3						
36	แจ้ง กพย.ตสร. ทำการปลดข้อตรวจวัดจุด G4						
37	จ่ายไฟคืนสู่ระบบ						
38	TMV01S-11	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ตสร.		SF6 ข้าง สนง.สำรอง
39	TMA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA		- -
40	TMV01R-02	Non-Reclosing	Normal		ตสร.		R กลางทุ่งบ้านหนองพังตรู
สิ้นสุด Switching							

แผนดับไฟฟ้า วันอาทิตย์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น ถึง เวลา ๑๗.๐๐ น

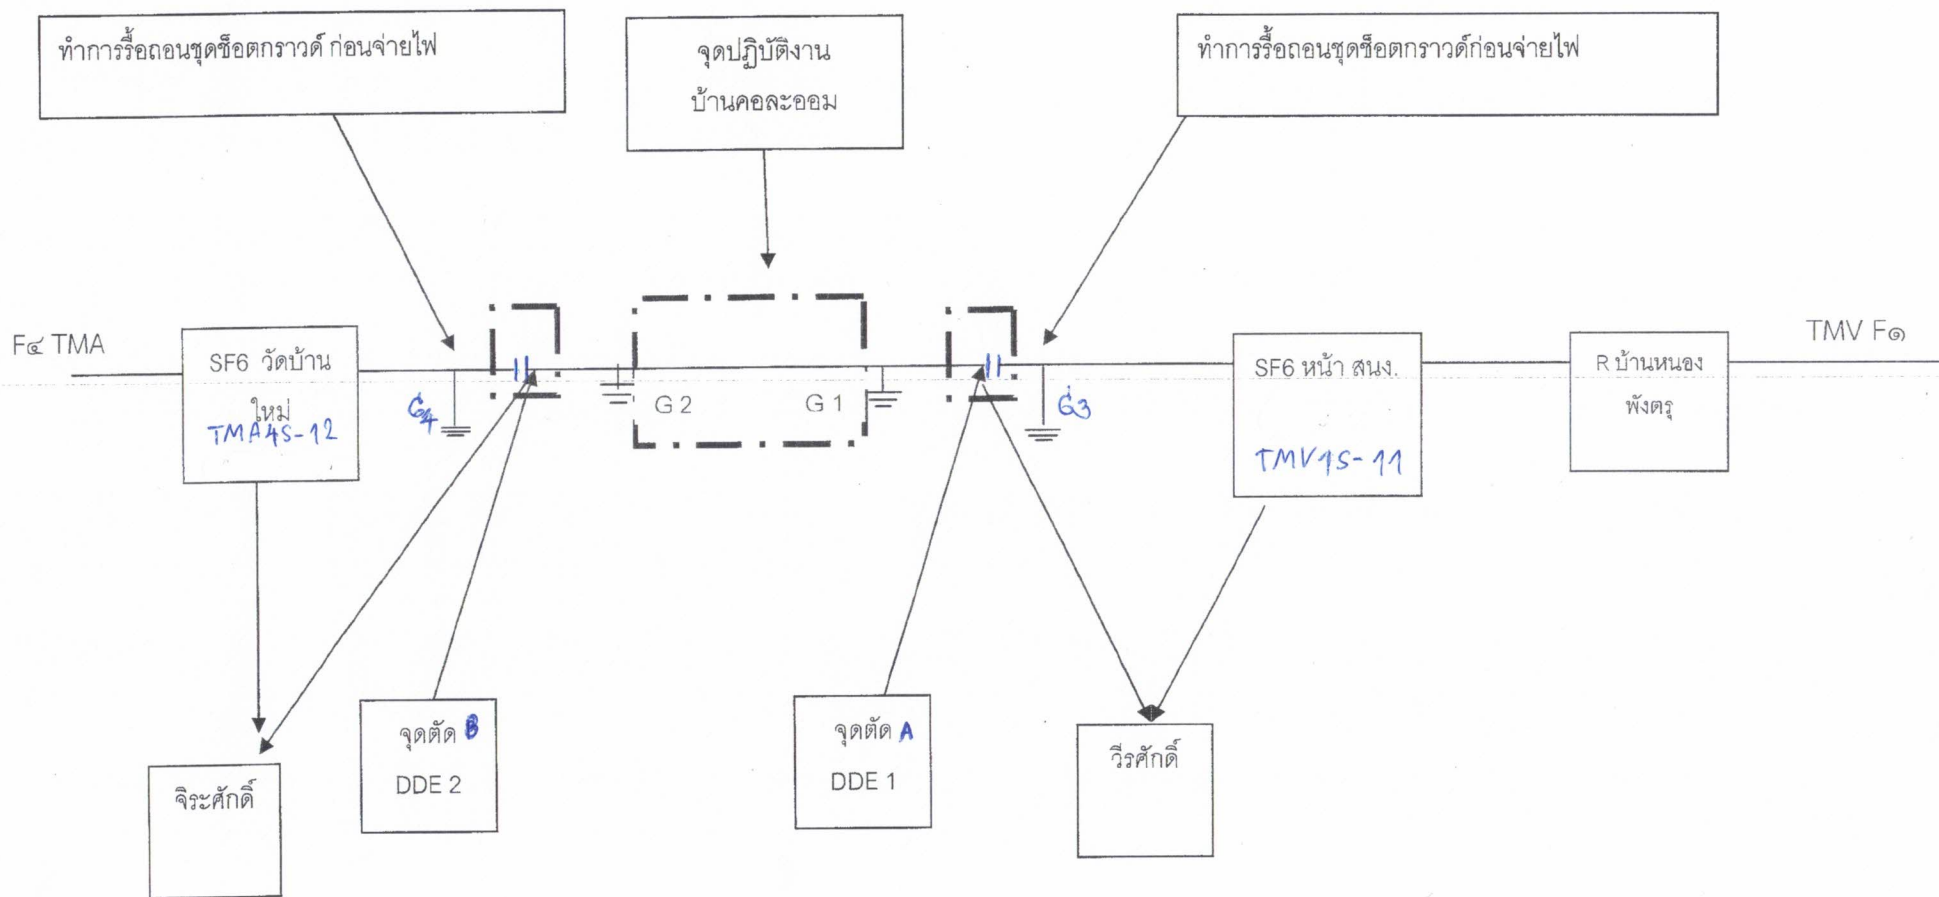

หมายเหตุ เมื่อทำการตัดจุด DDE ๑ และ DDE ๒ แล้วเสร็จก็จะทำการจ่าย SF๖ หน้า สนง. และ SF๖ วัตบ้านใหม่ ไปเบรกที่จุดตัด DDE ๑ และ DDE ๒
