

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PUBLIC ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3.ดบ.(ปบ) 1098 /2567
 ชื่อผู้รับ นายพจน์นัท พิชราสุวรรณิชล
 ชื่อผู้ส่ง นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี

วันที่ 5 พ.ย. 2567
 ตำแหน่ง ออ.ปบ.(ก3)
 ตำแหน่ง รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.ดบ.

ด้วย กฟส.เดิมบางนางบวช ขอตัดไฟวงจร DBA ๐๖ เพื่อปฏิบัติงานแก้ไขสายแรงสูงชำรุด ตามแผนผังสั่งเขบแนบ
 จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	DBA 06	15 พ.ย.67	10.00 น.	12.00 น.	แก้ไขสายแรงสูงชำรุด บริเวณก่อนแยกคลอง ๗ (ฮล.สุพรรณบุรี)	จุดตัดเตตกลาง สแปนก่อนแยก คลอง 7 (ฮล.สุพรรณ)	ดิสชั่วคราว ก่อนแยกคลอง 7	นายวรวิทย์ ศรีศักดิ์ดา โทร.080- 8476904

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) -

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวรวิทย์ ศรีศักดิ์ดา ตำแหน่ง ชผ.ปบ โทร. 080-847-6904

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓. พิกัดพื้นที่ดับไฟ

3.1 เริ่มต้น Lat : ...14.894411... Long: ...100.091667.....

3.2 สิ้นสุด Lat : ...14.899683... Long: ...100.093764.....

ลงชื่อ.....

(นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.ดบ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน ออ.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ DBA06 จาก Dis.ชก. ก่อนแยกคลอง 7 ถึง จุดตัด DDE กลางสแปน
 ในวันที่ 15 พ.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 10:00 น. ถึง 12:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข 1663/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข

พนักงานศูนย์ฯ นันท์ ลุกงา วรต์บุญมาก ประสานงานการขอตัดไฟกับ

รุจิรา
 (นางสาวรุจิรา วรต์บุญมาก)

๑๗๖-5 แทน น.ผคฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส. ดบ.

อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ 1 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจพ. (สถานี -)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน ออ.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง


1. สถานที่ทำงาน	ก่อนแยกคดลอง 7		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	15 พ.ย. 67	ระหว่าง	10.00 น. ถึง 12.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ตบ.	งานที่ทำ	แก้ไขสายแรงสูงชำรุด
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นางสาวสุภัชชา วงศ์บุญมาก		วันที่ 6 พฤศจิกายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 6 พฤศจิกายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 6 พฤศจิกายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	 1. นายสินรินทร์, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร, น.ส.สุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	DBA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		Load = 3.52 MW
3	แจ้งให้ชุด HL ทำการเชื่อม Dis ชั่วคราวก่อนแยกคดลอง 7						
4	เมื่อชุด HL ทำการเชื่อม Dis ชั่วคราวก่อนแยกคดลอง 7 พร้อมดำเนินการย้ายโหลด						
5	DBA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		Load = 5.33 MW
6	ย้ายโหลด DBA06 บางส่วนไปรับไฟจาก DBA05						
7	DBA05S-08	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ตบ.		SF6 โรงสีบุญเจริญ
8	Dis ชด. ในไลน์ DBA06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ตบ.		DIS ชด. ก่อนแยกคดลอง 7
9	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 10.00 น.						
10	แจ้งชุด HL ดำเนินการตัด DDE กลางสแปน ออกจากกันทั้ง 3 เฟส ตามผังแนบ (ไม่มีโหลดผู้ใช้ไฟฟ้า)						
11	เมื่อชุด HL ดำเนินการตัด DDE กลางสแปน ออกจากกันทั้ง 3 เฟส ตามผังแนบ (ไม่มีโหลดผู้ใช้ไฟฟ้า) แล้วเสร็จ						
12	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ กฟส.ตบ. รับทราบ						
13	เมื่อ กฟส.ตบ. ทำการ Test ไฟ พร้อมลงข้อมูลใน WeSafe เรียบร้อยแล้ว แจ้งให้ชุดปฏิบัติงานได้						
14	DBA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		
15	DBA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
16	เมื่อ กฟส.ตบ. แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
17	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
18	DBA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		
19	DBA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		
20	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
21	แจ้งชุด HL ดำเนินการเชื่อม DDE กลางสแปน เข้าสู่กันทั้ง 3 เฟส ตามผังแนบ						
22	เมื่อชุด HL ดำเนินการเชื่อม DDE กลางสแปน เข้าสู่กันทั้ง 3 เฟส ตามผังแนบ แล้วเสร็จ						
23	Dis ชด. ในไลน์ DBA06	ปลด	สับ		ตบ.		DIS ชด. ก่อนแยกคดลอง 7
24	DBA05S-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ตบ.		SF6 โรงสีบุญเจริญ
25	DBA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		
26	DBA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							



แผ่นที่ 1

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ดับไฟ เพื่อแก้ไขสายแรงสูงชำรุด
วงจร DBA06 ตั้งแต่จุดตัดเดกกลางสแปน ถึง ดิสชั่วคราวก่อนแยกคลอง 7
วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2567 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 12.00 น.

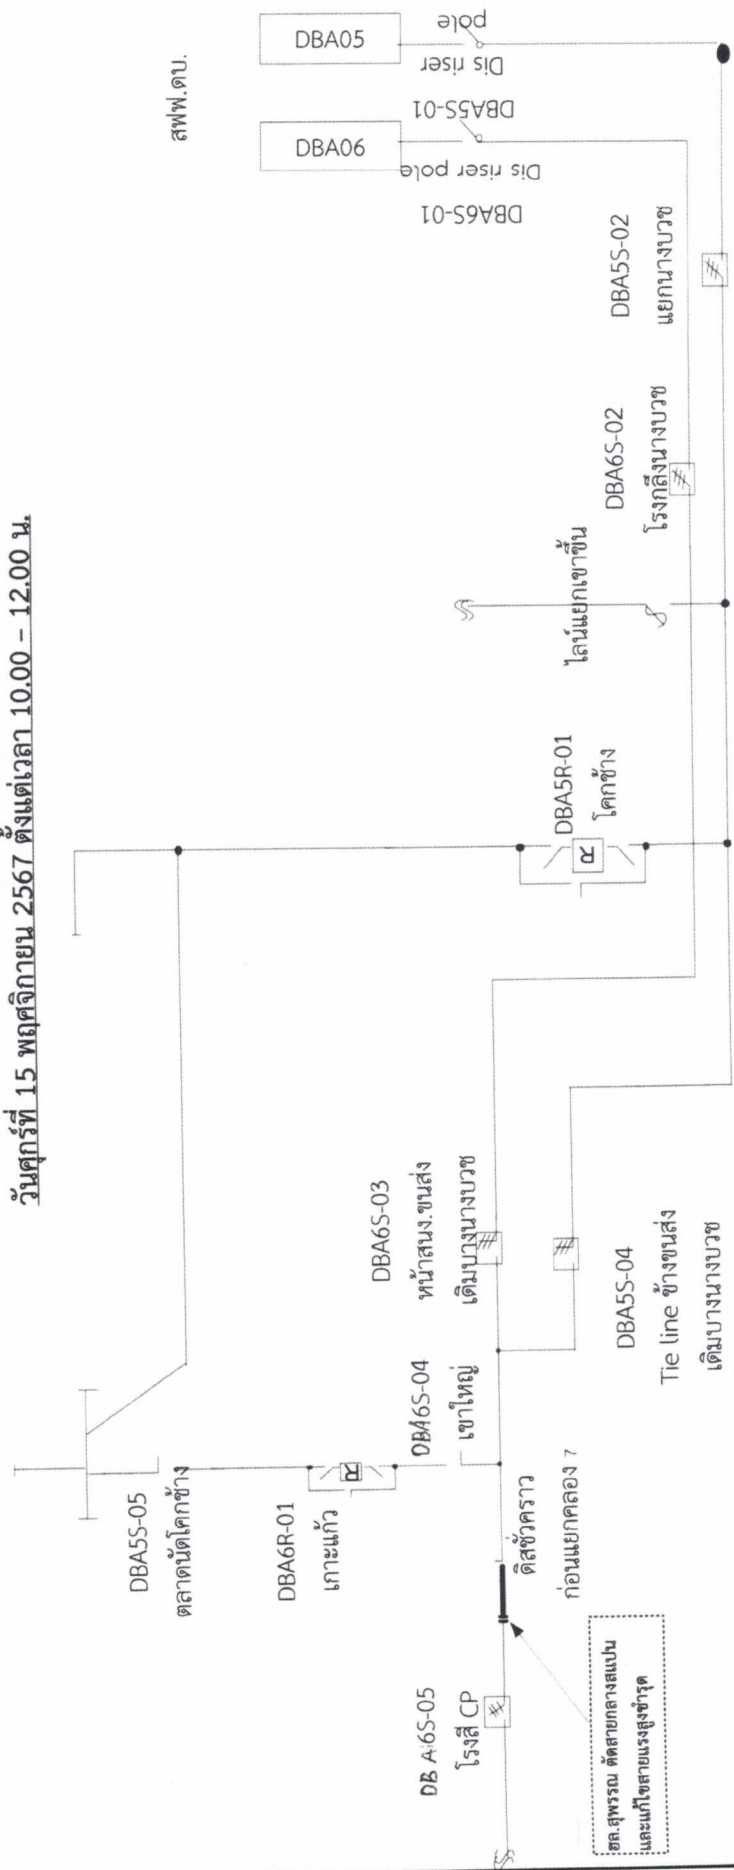

Handwritten signature

สถานะ การจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน

วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2567 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 12.00 น.
 ดับไฟเพื่อแก้ไขสายแรงสูงชำรุด
 หมายเหตุ — บริเวณที่ขอดับไฟปฏิบัติงาน
