



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กฟส.สค.๒(บพ) ๑๒๑๘/๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายฉัตร สวงวนพานิช

Switching Deadline

15 พ.ย. 67

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ตำแหน่ง ออ.บพ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.สค.๒(บพ)

ด้วย กฟส.สค.๒(บพ) ขอตัดไฟ วงจรที่ ๐๔ สถานีบ้านแพ้ว เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงบริเวณสะพานวัดมอญ ถึง สะพานหลักสอง ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๓ แผนนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	BNP๐๔	๑๖ พ.ย. ๒๕๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปรับปรุงระบบจำหน่าย แรงสูงบริเวณสะพานวัด มอญ ถึง กิจไพศาลศิลป์ คำไม้	BNP๔S-๐๕ (หน้าวัดมอญ)	D/F ชั่วคราว (กิจไพศาลศิลป์คำไม้)	นายเจษฎา คงทุกา ตำแหน่ง พชง.๗ โทรศัพท์ ๐๘๓-๔๒๘๘๓๕๖

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บริเวณสะพานวัดมอญ ริมคลองดำเนินสะดวก

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอรรถนันท์ นวัสงค์ ตำแหน่ง ชผ.บพ. โทร ๐๘๖-๓๖๓๓๑๑๐

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓. พิกัดพื้นที่ดับไฟ ๓.๑ เริ่มต้น Lat ๑๓.๖๐๑๐๓๔ Long ๑๐๐.๑๒๙๓๗๒

๓.๒ สิ้นสุด Lat ๑๓.๖๐๕๓๙๓ Long ๑๐๐.๑๓๗๖๓๓

เรียน ผจก.กฟภ.สมุทรสาคร

เพื่อโปรดทราบ

(นายฉัตร สวงวนพานิช)

ผจก.กฟส.สค.๒(บพ)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน ออ.บพ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ I พิดเดอร์ BNP4 จาก BNP4S-05 ถึง P/F ๕๑. กิจไพศาลศิลป์คำไม้
ในวันที่ 16 พ.ย. ๖๗ ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่ 1678/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย วิษณุ วัฒนศิริไพฑูริย์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายอรรถนันท์ นวัสงค์

8 พ.ย. 67

(นายเจษฎา คงทุกา)
ตำแหน่ง พชง.๗
โทรศัพท์ ๐๘๓-๔๒๘๘๓๕๖

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟล. พว.

อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 3 แผ่น

ผจฟ. - (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม



ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)


ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	หน้าวัดมอญ ถึง สะพานหลักสอง		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	16 พ.ย. 67	ระหว่าง 08.00 น.	ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ.สค2.(บพว.)	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวัฒนา สามศรีโพธิ์แก้ว		วันที่ 8 พฤศจิกายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 8 พฤศจิกายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 8 พฤศจิกายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพิรภัทร, น.ส.สุกษา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
	2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิช, นายโมช, นายวรรณพงษ์		(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
	3. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวิชัย, นายอมร		(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)


ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ดับไฟเพื่อตัด DDE บริเวณตู้มเจอร์รี่ ถึง ปากคลองเขื่อนชั้น เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย ระยะเวลาประมาณ 1 เดือน							
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดก่อนทำสวิตชิง						
2	KTE07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		CB
3	BNP04R-02	Normal	Nonreclosing		บพว.		R ริมคลองดำเนิน
4	ตรวจสอบ DDE บริเวณปากคลองเขื่อนชั้น และ สะพานวัดมอญ อยู่สถานะ "ปลดออกจากกันทั้ง 3 เฟส"						
5	พร้อมดับไฟ เวลา 08.00 น.						
6	BNP04S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บพว.	SCADA	SF6 หน้าวัดมอญ
7	D/F ชั่วคราว BNP04	สับ	ปลด(ใช้ไหลดบัสเตอร์)		บพว.		D/F กิ่งโพธิ์ศาลหลักห้าไม้
8	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
9	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
10	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
11	แจ้งลงข้อมูลใน We Safe ก่อนปฏิบัติงาน						
12	แจ้งหน่วยงานปฏิบัติงานได้						
13	KTE07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		CB
14	BNP04R-02	Nonreclosing	Normal		บพว.		R ริมคลองดำเนิน
%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%							
15	เมื่อหน่วยงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
16	ตรวจสอบ DDE บริเวณสะพานวัดมอญ อยู่สถานะ "เชื่อมกันทั้ง 3 เฟส"						
17	ตรวจสอบ DDE บริเวณปากคลองเขื่อนชั้น และ ตู้มเจอร์รี่ อยู่สถานะ "ปลดออกจากกันทั้ง 3 เฟส"						
18	KTE07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		CB
19	BNP04R-02	Normal	Nonreclosing		บพว.		R ริมคลองดำเนิน
20	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1						
21	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2						
22	BNP04S-05	ปลด, ล็อคคาน	สับ		บพว.	SCADA	SF6 หน้าวัดมอญ
23	D/F ชั่วคราว BNP04	ปลด	สับ		บพว.		D/F กิ่งโพธิ์ศาลหลักห้าไม้

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
24	KTE07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		CB	
25	BNP04R-02	Nonreclosing	Normal		บพว.		R	รีเซ็ตคองดำเนินการ
%%%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%								

แผนผัง Single Line Diagram ก่อนปฏิบัติงาน

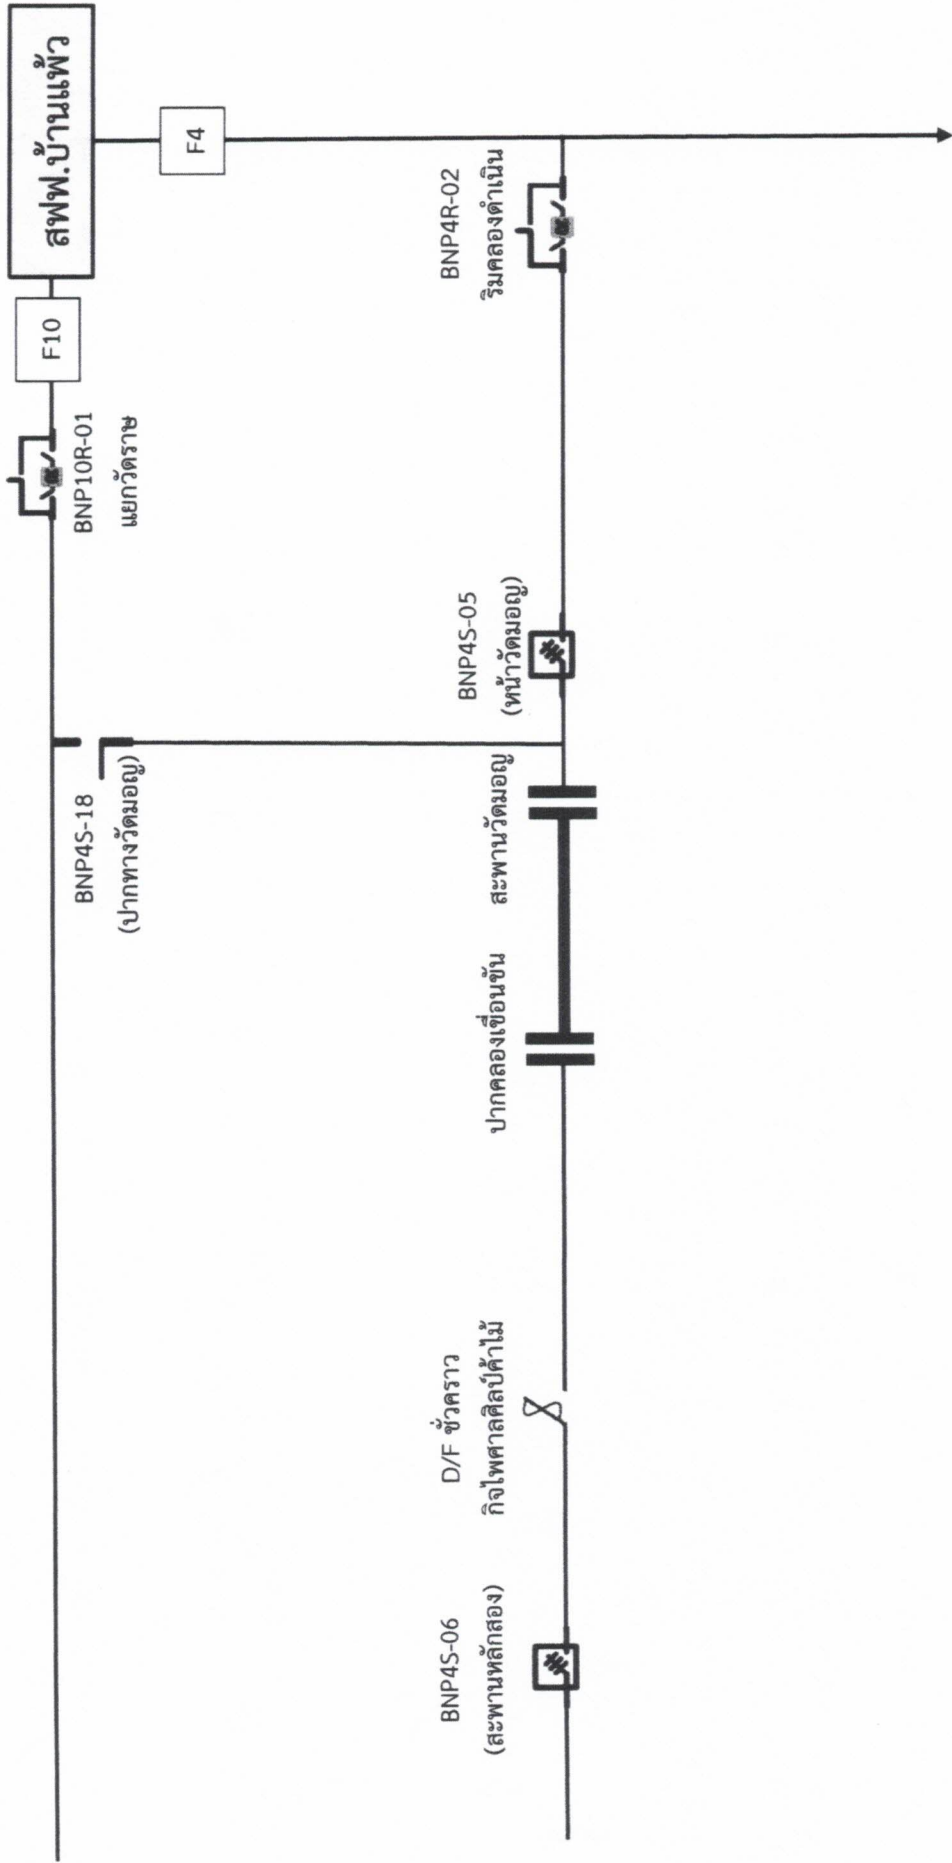

แผนผัง Single Line Diagram แสดงพื้นที่ที่ไฟฟ้าดับ พร้อมระบุจุด Short Ground หน้า/หลัง จุดปฏิบัติงาน

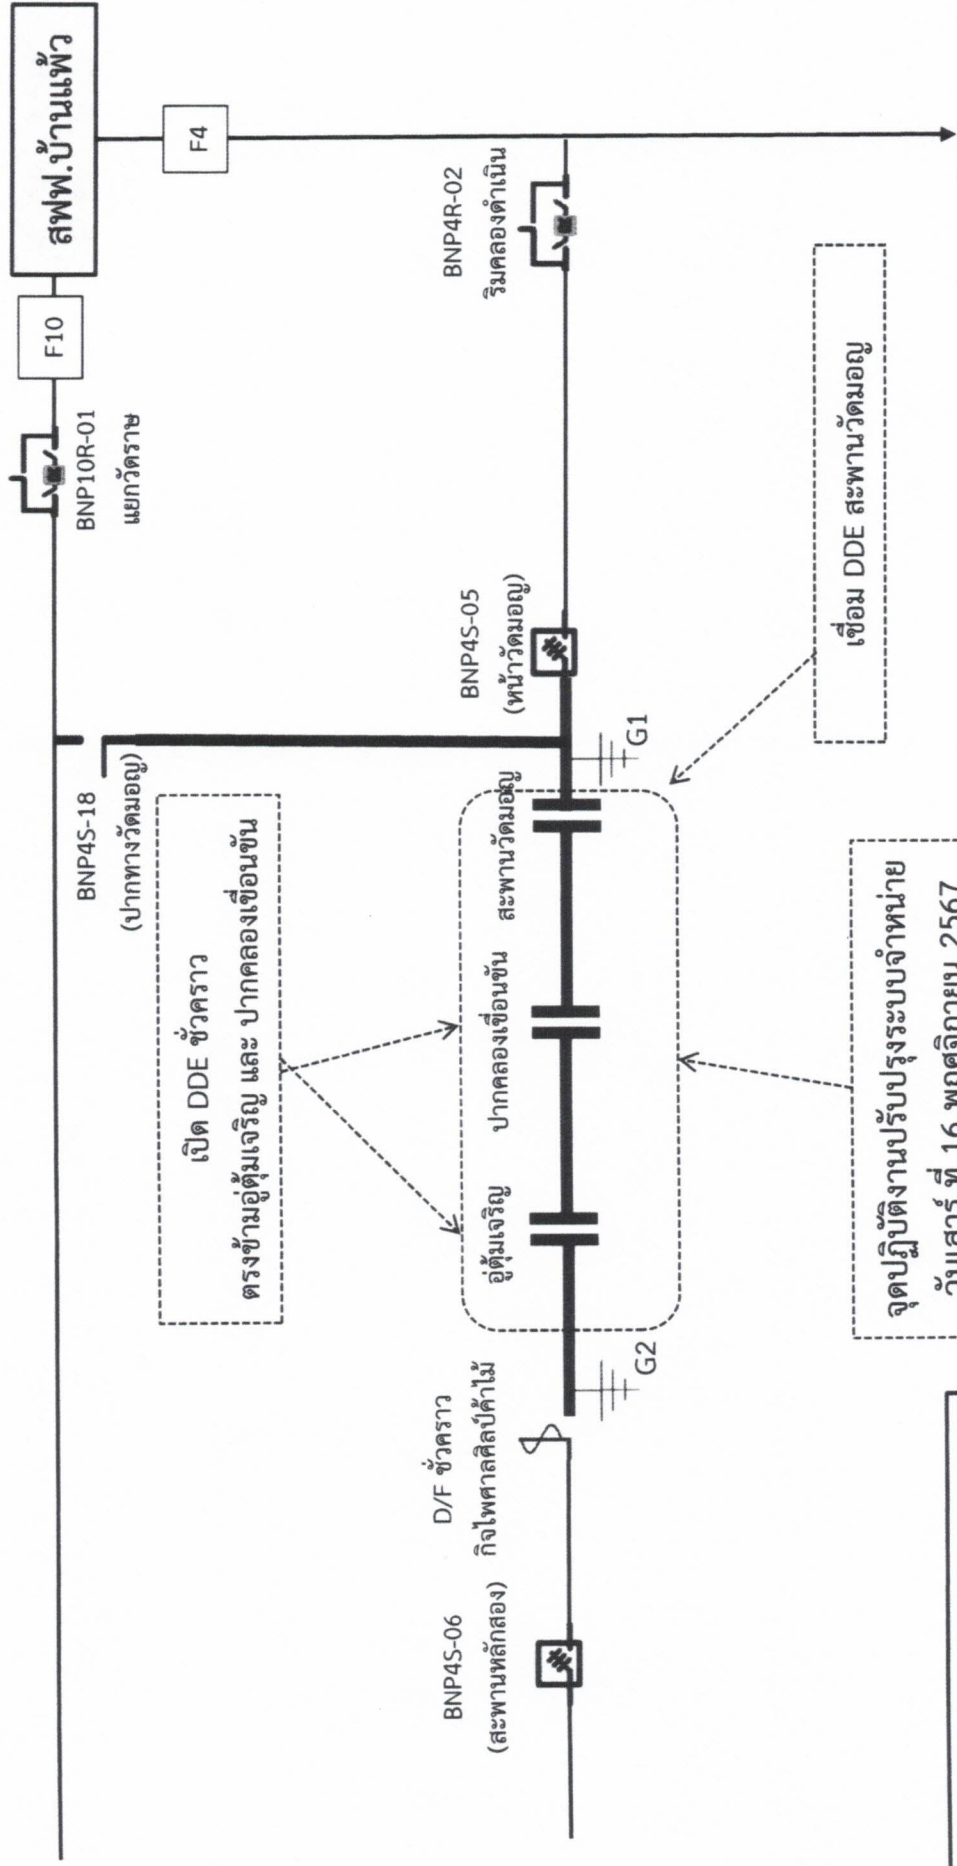

จุดปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย
วันเสาร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2567

เส้นที่แสดงพื้นที่ที่ดับไฟ

ตำแหน่งจุด Short Ground

แผนผัง Single Line Diagram หลังปฏิบัติงานแล้วเสร็จ

