



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 17 ธ.ค. 64

เลขที่ ก.๓ กทบ.(ปบ.)- ๓๐๓๒ /๒๕๖๔

ชื่อผู้รับ นายสมบุรณ์ สิงห์โตทอง

ชื่อผู้ส่ง นายอารุณ จรตล

วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.กทบ.

ด้วยการไฟฟ้า กฟอ.กทบ. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปักเสาสายเคเบิลแรงสูงเพิ่มเติมวงจรใหม่ ตามแผนผังสังเขป
แบบ จำนวน =๒= แผ่น ดังนี้

ที่	พิกัด	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	KTE ๑๐	๑๔ ธ.ค. ๖๔	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ชุดก่อสร้าง กฟอ.กทบ. ปักเสาสายเคเบิลแรงสูงวงจรใหม่เพิ่มเติม ร่องรับงานสถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร ๑๐	จุดปลด DDE ตรงสายไฟแรงต่ำชอยมงคล	DIS ชั่วคราวตรงข้ามปากทางเข้าหมู่บ้านล้อมสุข	นายปรีชา แก้วสีม่วง หม.กส.กทบ. โทร.๐๘๒-๒๕๑๕๖๘๑

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบจำนวน ๗๐ รายจากการตัดไฟปฏิบัติงาน

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายสมชาย มาบัณฑิตย์ ตำแหน่ง หม.ปบ.กฟอ.กทบ. โทร ๐๘๒-๐๐๙๔๙๔๓

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสข่าจรต ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสข่าจรต ๑.๒ ไม่มีโอกาสข่าจรต
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายอารุณ จรตล)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.กทบ.

๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

DDE ส่งไฟแดง

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิกัด KTE10 จาก ท้ายชอยมงคล ถึง DIS ชั่วคราวตรงข้ามปากทางเข้าหมู่บ้านล้อมสุข
ในวันที่ 19 ธ.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่ 1678/2564

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิกัด จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อรุณ โมกข์โพธิ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายสมบุรณ์ สิงห์โตทอง
16 ธ.ค. 64

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ. กทบ.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(รทพร ตันติเพชรกิจ)
วคก. 7 แทน นว.ฉฝ.

ขั้นตอนการสวิชซึ่ง 2 แผ่น

แผนผังแบบ 3 แผ่น

ผจก. (สถานี)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

บริเวณสี่แยกไฟแดงท้ายซอยมงคล - ตรงข้ามปากซอยหมู่บ้านล้อมสุข


1. สถานที่ทำงาน	บริเวณสี่แยกไฟแดงท้ายซอยมงคล - ตรงข้ามปากซอยหมู่บ้านล้อมสุข		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	19 ธ.ค. 64	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.กทบ.	งานที่ทำ	ปักเสาพาดสายแรงสูง ตามใบขอปฏิบัติงาน 1678/64
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอมร โมกขพันธ์		วันที่ 16 ธันวาคม 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 16 ธันวาคม 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 16 ธันวาคม 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศุภสวัสดิ์, นายพนิต 2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์และสวิตซ์ตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	KTE06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		- L = 3.51 MW
3	KTE10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		- L = 4.44 MW
4	ย้ายโหลด KTE10 บางส่วน ฝาก KTE6						
5	KTE06S-07	ปลด	ล๊ပ်		กทบ.		DIS ซอยมงคล
6	DIS ชั่วคราวติดตั้งใหม่	ล๊ပ်	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กทบ.		DIS ตรงข้ามปากซอยหมู่บ้านล้อมสุข
7	เมื่อ กฟอ.กทบ. พร้อมดับไฟปฏิบัติงาน เวลา 08.00 น.						
8	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการโอนโหลดหม้อแปลงในระบบออกทั้ง 3 เฟส						
9	แจ้งชุดฮอทไลน์กระเช้า ทำการตัด DDE จุด A บริเวณสี่แยกไฟแดงท้ายซอยมงคล ออกทั้ง 3 เฟส						
10	หลังจากชุดฮอทไลน์กระเช้า ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย						
11	แจ้ง กฟอ.กทบ. ทำการเทสไฟ, ช็อตกราวด์จุด G1						
12	แจ้ง กฟอ.กทบ. ทำการเทสไฟ, ช็อตกราวด์จุด G2						
13	หลังจาก กฟอ.กทบ. ดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย						
14	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ กฟอ.กทบ. รับทราบและปฏิบัติงานได้						
15	KTE06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		-
16	KTE10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
17	เมื่อ กฟอ.กทบ. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
18	KTE06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		-
19	KTE10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		-
20	แจ้ง กฟอ.กทบ. ทำการปลดช็อตกราวด์จุด G1 ออก						
21	แจ้ง กฟอ.กทบ. ทำการปลดช็อตกราวด์จุด G2 ออก						
22	หลังจาก กฟอ.กทบ. ดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย						
23	จ่ายไฟคืนสู่ระบบ						
24	แจ้งชุดฮอทไลน์กระเช้า ทำการเชื่อม DDE จุด A บริเวณสี่แยกไฟแดงท้ายซอยมงคล เข้าทั้ง 3 เฟส						
25	หลังจากชุดฮอทไลน์กระเช้า ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย						
26	ย้ายโหลด KTE10 บางส่วน กลับจาก KTE6						
27	DIS ชั่วคราวติดตั้งใหม่	ปลด	ล๊ပ်		กทบ.		DIS ตรงข้ามปากซอยหมู่บ้านล้อมสุข
28	KTE06S-07	ล๊ပ်	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กทบ.		DIS ซอยมงคล

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	KTE06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		- -
30	KTE10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		- -
สิ้นสุด Switching							

แผนผังสถานะปัจจุบัน ก่อนดับไฟ บริเวณสี่แยกไฟแดงถนนสายโยธก-หมู่บ้านด้อมตุซ
เพื่อให้ ผศ.กทบ. ปฏิบัติงานปักเสาแรงสูงและพาดสายเคเบิลแรงสูงเพิ่มเติมอีก 1 วงจรรองรับสถานีฯ สค.10
ในวันอาทิตย์ ที่ 19 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00 - 17.00 น.
(ตามอนุมัติ ก.3 กทบ.(กส.)-070 ลว. 11 ม.ค. 2564) WBS:P-TDD02.3-I-KYNNA.0003

หมายเหตุ
มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบจำนวน 70 ราย

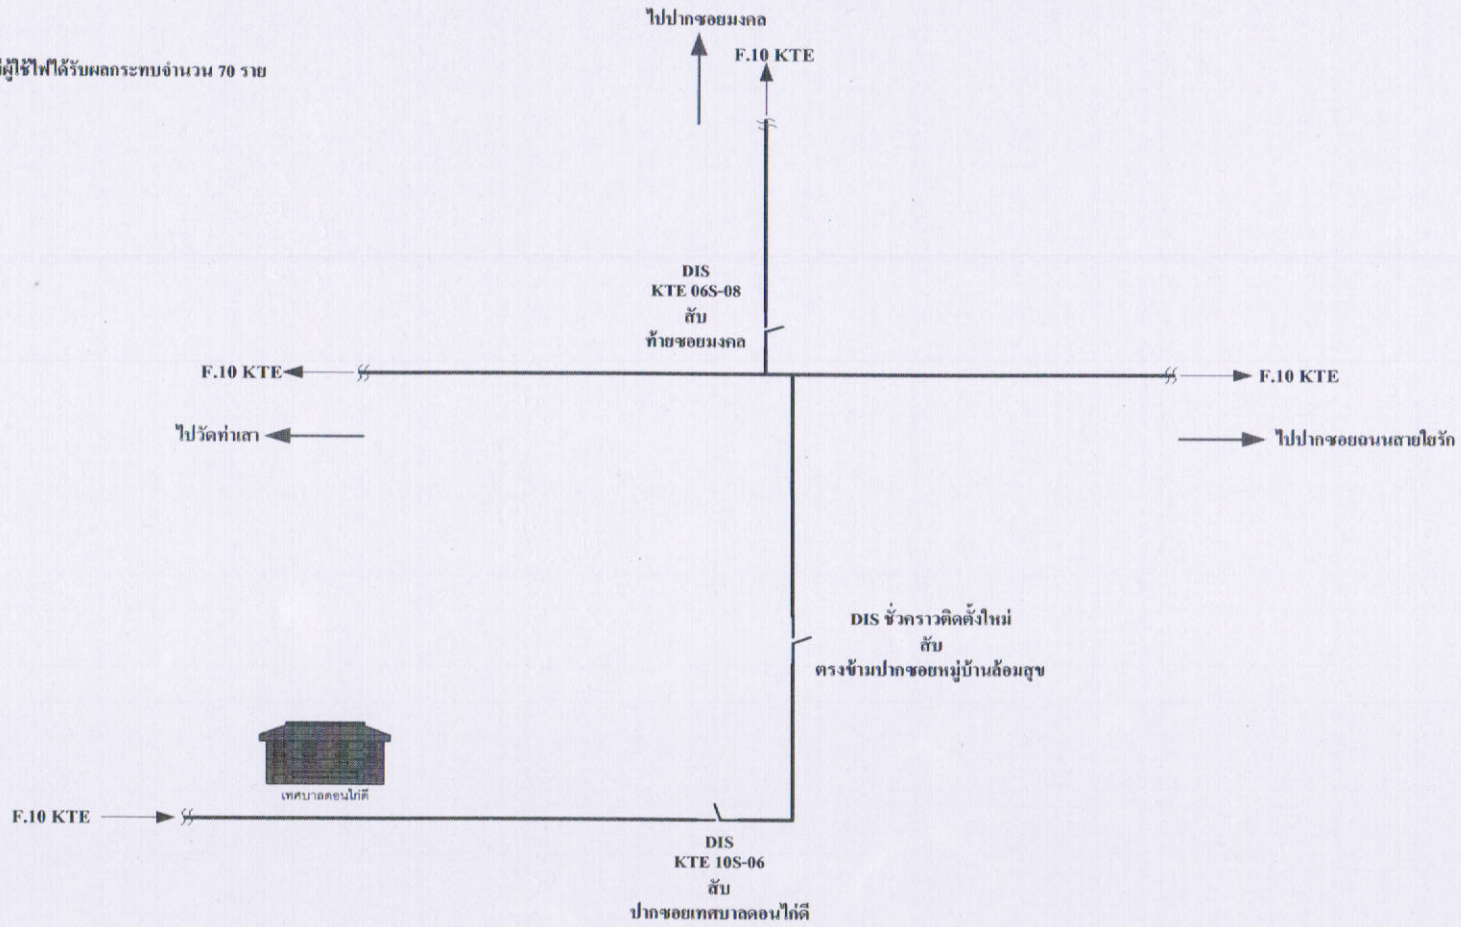

แผนผังสถานะบึงจัน หลังดับไฟ บริเวณสี่แยกไฟแดงถนนสายโยรัก-หมู่บ้านล้อมสุข
 เพื่อให้ ผศ.ศ.ทบ. ปฏิบัติงานปักเสาแรงสูงและพาดสายเคเบิลแรงสูงเพิ่มเติมอีก 1 วงจรรองรับสถานีฯ สท.10
 ในวันอาทิตย์ ที่ 19 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00 - 17.00 น.
 (ตามอนุมัติ ก.3 กทบ.(กส.)-070 ลว. 11 ม.ค. 2564) WBS:P-TDD02.3-I-KYNNA.0003

