



Switching Deadline

โทรสารขอตัดไฟ

17 พ.ย. 66

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.ด.ม.ข.(ก.ป.) ๑๐๑๕ / ๒๕๖๖
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชด
ชื่อผู้ส่ง นายจรัญ ศรีบัวงแพรง

วันที่ ๑๓ พ.ย. ๒๕๖๖
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.อ.ด.ม.ข.

ด้วย ผ.จก.กฟส.อ.ด.ม.ข.มีแผนก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี DMA๑๐ ในระบบสายส่ง/สถานีไฟฟ้า ด่านมะขามเตี้ย ดังนี้

ที่	ระบบ/สถานี	วัน/เดือน/ปี	เริ่มเวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	สพ.ด.ม.ข. DMA10	๒๒ พ.ย. ๖๖	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี DMA๑๐	Dis ชั่วคราว บ.ท่ากระบือ ช.๒	DMA10S-04 อบต.เกาะสำโรง	นายประสาน ๗ โทร ๐๘-๔๑๕๕-๕๕๑๒

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บริเวณบ้านท่ากระบือ ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายประสาน ประสพผล ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.อ.ด.ม.ข. โทร. ๐๓๔-๖๗๒๖๔๘. ๐๘๔-๑๕๕๕๕๑๒ พื้นที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผ.ค.ส.ก.ร.ส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ 
(นายจรัญ ศรีบัวงแพรง)
ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.อ.ด.ม.ข.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผ.ค.ฟ.) กฟภ.๓
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผ.ค.ฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเดอร์ DMA 10 จาก บ.ท่ากระบือ ช.๒ ถึง ส.๒ ๐๓.๓๖.๖๖
ในวันที่ ๒๒ พ.ย. ๖๖ ตั้งแต่เวลา ๘.๐๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1680/66


อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ... พิดเดอร์... จาก... ถึง...
ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่...

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ... พิดเดอร์... จาก... ถึง...
ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่...

พนักงานศูนย์ฯ นาย วิเศษ สิมศิริโพธิ์ ๒ กวี ประสานงานการขอตัดไฟกับ นางประสาน ประสพผล
14 พ.ย. 66

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ป.บ.(ค.ฟ.)
เรียน ผ.จก. กฟภ.๓, กฟส.๓, กฟร.๓, กฟน.๓,
อก.บ.ข.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย


(นายสรณรัตน์ สอนรัตน์)
๑๐๑.๕๓๓๓๓-๐๗.



ขั้นตอนการสวิตซ์ 3 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผ.จก. (สถานี...)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ
นครปฐม ตั้งแต่เวลา... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

หน้าที 1 จาก 3
ใบสั่งทำสวิตชิง

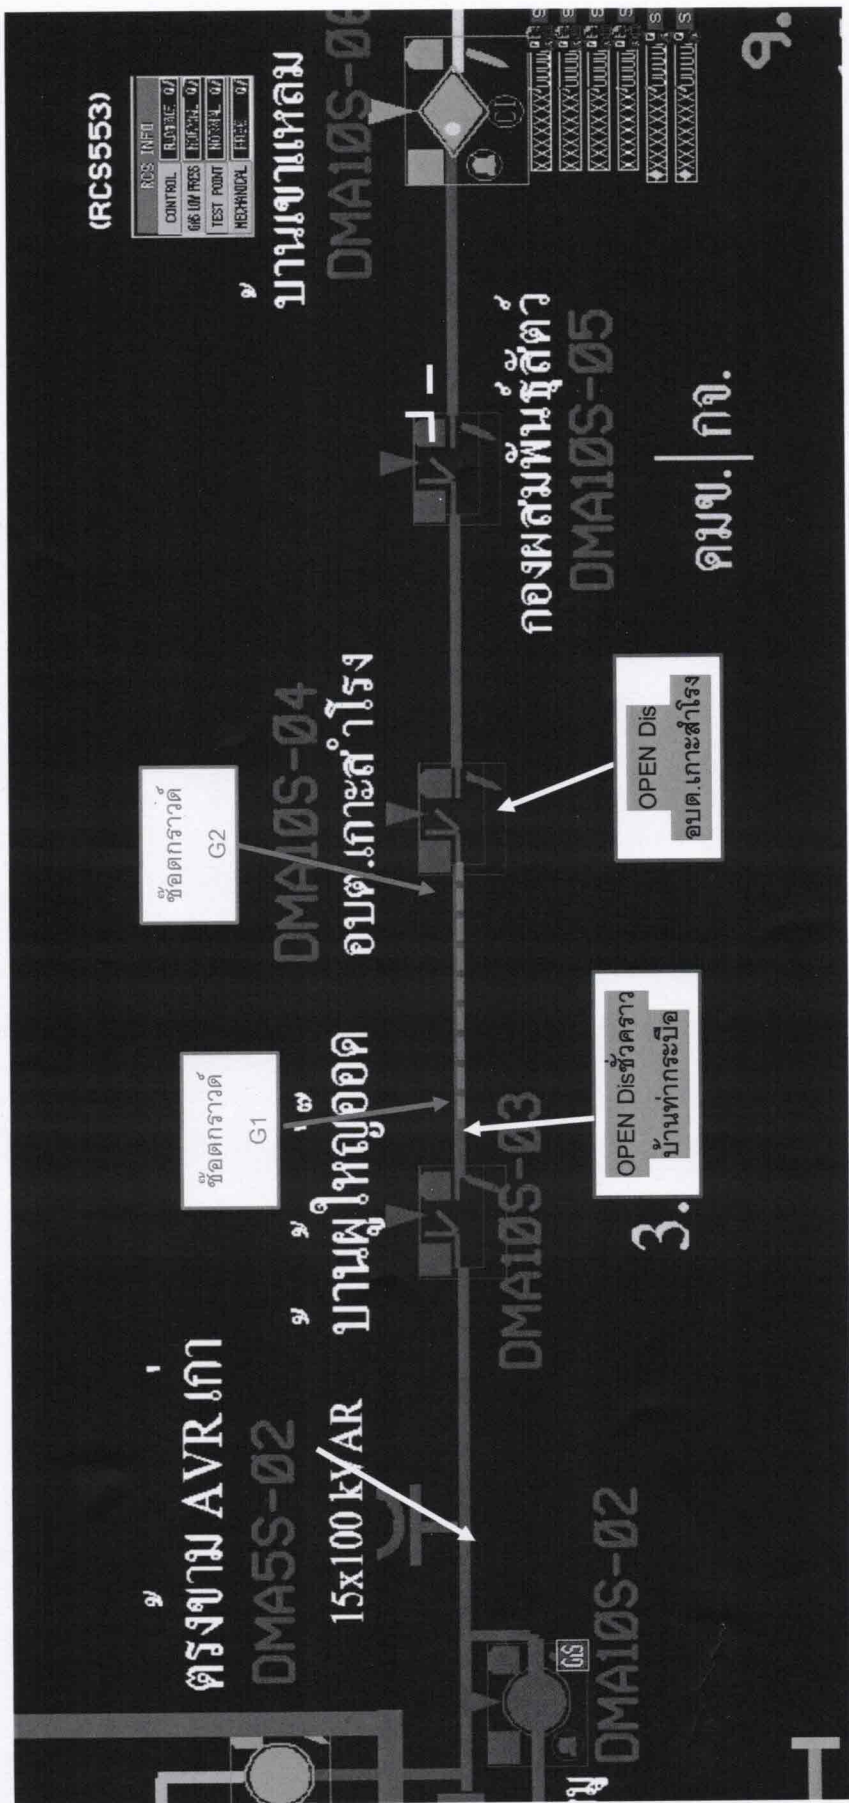
1. สถานที่ทำงาน	บริเวณ บ้านท่ากระเบื้อง						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	22 พ.ย. 66	ระหว่าง	08.00	น.	ถึง	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ดมข.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย			ตามใบขอปฏิบัติงาน	1680/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวัฒนา สามศรีโพธิ์แก้ว				วันที่	16 พฤศจิกายน 2566	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	16 พฤศจิกายน 2566	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	16 พฤศจิกายน 2566	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนอช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	DMA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DMA		Load = 5.4 MW
3	DMA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DMA		
4	DMA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DMA		Load = 0.1 MW
5	TMA-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		Load = 7.1 MW
6	TMA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA		
7	TMA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA		Load = 3.5 MW
8	KCA-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
9	KCA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		
10	KCC-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KCC		
11	KCC10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCC		
12	KCC09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCC		
13	ย้ายโหลด DMA10 บางส่วน ไปรับไฟจาก TMA02						
14	ตรวจสอบ KCA05VB-01 สถานะ "OPEN + TRUCK IN SERVICE"						
15	ตรวจสอบ KCA05S-01 สถานะ "สับ"						
16	DMA10S-06	ปลด, ล็อคคาน	สับ		กจ.	SF6	บ้านเขาแหลม
17	KCA02S-11	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ทมจ.	SF6	ก่อนปั๊มแก๊ส
18	KCA05VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KCA	CB	
19	DMA05S-08	ปลด, ล็อคคาน	สับ		กจ.	SF6	ก่อน ว.เกษตร
20	DMA10S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดมข.	DIS	อบต.เกาะสำโรง
21	KCA02S-11	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ทมจ.	SF6	ก่อนปั๊มแก๊ส
22	KCA05VB-01	สับ	ปลด		KCA	CB	
23	DMA05S-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กจ.	SF6	ก่อน ว.เกษตร

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
24	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.00 น.						
25	DIS ชค.บ้านท่ากระเปือ	สับ	ปลด(ใช้โหดบัสเตอร์)		ดมข.	DIS	DIS ชค.บ้านท่ากระเปือ
26	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ กฟส.ดมข. รับทราบ						
27	แจ้ง กฟส.ดมข. Test ไฟพร้อม Short Ground จุด G1						
28	แจ้ง กฟส.ดมข. Test ไฟพร้อม Short Ground จุด G2						
29	แจ้ง กฟส.ดมข. ลงรายละเอียด We Safe ให้เรียบร้อยก่อนปฏิบัติงาน						
30	แจ้ง กฟส.ดมข. ปฏิบัติงานได้						
31	DMA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DMA		
32	DMA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DMA		
33	DMA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DMA		
34	TMA-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
35	TMA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA		
36	TMA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA		
37	KCA-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
38	KCA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		
39	KCC-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KCC		
40	KCC09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCC		
41	KCC10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCC		
<u>สิ้นสุด Switching (ช่วงเช้า)</u>							
42	เมื่อ กฟส.ดมข. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
43	DMA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DMA		
44	DMA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DMA		
45	DMA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DMA		
46	TMA-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
47	TMA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA		
48	TMA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA		
49	KCA-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
50	KCA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		
51	KCC-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KCC		
52	KCC10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCC		
53	KCC09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCC		
54	แจ้ง กฟส.ดมข. ปลด Short Ground จุด G1						
55	แจ้ง กฟส.ดมข. ปลด Short Ground จุด G2						
56	DIS ชค.บ้านท่ากระเปือ	ปลด	สับ		ดมข.	DIS	DIS ชค.บ้านท่ากระเปือ

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
57	ย้ายโหลด DMA10 บางส่วน กลับจาก TMA02						
58	KCA02S-11	ปลด,ล๊อคคาน	ล๊ับ		ทมง.		SF6 ก่อนปั๊มแก๊ส
59	KCA05VB-01	ปลด	ล๊ับ คง OFF Auto Reclose		KCA		CB
60	DMA05S-08	ปลด,ล๊อคคาน	ล๊ับ		กจ.		SF6 ก่อน ว.เกษตร
61	DMA10S-04	ปลด	ล๊ับ		ดมข.		DIS อบต.เกาะสำโรง
62	DMA10S-06	ล๊ับ	ปลด,ล๊อคคาน		กจ.		SF6 บ้านเขาแหลม
63	KCA02S-11	ล๊ับ	ปลด,ล๊อคคาน		ทมง.		SF6 ก่อนปั๊มแก๊ส
64	KCA05VB-01	ล๊ับ	ปลด		KCA		CB
65	DMA05S-08	ล๊ับ	ปลด,ล๊อคคาน		กจ.		SF6 ก่อน ว.เกษตร
66	DMA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DMA		
67	DMA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DMA		
68	DMA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DMA		
69	TMA-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
70	TMA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA		
71	TMA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA		
72	KCA-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
73	KCA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		
74	KCC-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KCC		
75	KCC09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCC		
76	KCC10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCC		
<i>สิ้นสุด Switching ทั้งหมด</i>							

ผังเดินไฟฟ้างาน ก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย
DMA๑๐ วันที่ ๒๒ พ.ย. ๒๕๖๖



พื้นที่ปฏิบัติงาน -----
