



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROFESSIONAL ELECTRICITY AUTHORITY

### วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่ ก.๓.กจ.(ป.บ) ๒๖๗๗ / ๒๕๖๕  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์ราสุวรรณ  
ชื่อผู้ นายชัชชัย เขิดชูสุวรรณ


วันที่ ๒๕ ต.ค. ๖๕  
ตำแหน่ง อก.ป.บ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟภ.กจ.

ด้วย กฟภ. กจ. จะขอตัดไฟเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ KV ในระบบจำหน่าย/สถานีไฟฟ้า ภาณุจนวนบุรี วงจร F6 บริเวณ ก่อนถึงสะพานข้ามแม่น้ำแคว ต.ทามะขาม อ.เมือง จ.ภาณุจนวนบุรี ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผน ดังนี้

ที่	ระบบ/สถานี	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่วเวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	F6 สฟ.กจ.1	๙ พ.ย. ๖๕	๐๘.๓๐	๑๗.๐๐	รีดคอน/บีกเสา๒๒.๒๐ ม. จำนวน๒๐ต้น พวดสาย SAC๑๘๕ บริเวณก่อนถึง สะพานข้ามแม่น้ำแคว	DIS ชั่วคราว ร้านอิมจึงหมูกระทะ	DIS ชั่วคราว ท้ายซอยอินเต็ย KCA6S-05 ซอยสิงคโปร์	นายสมปอง กำจรกิตติคุณ ๐๘๑-๕๔๕๒๕๕๕

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บริเวณก่อนถึงสะพานข้ามแม่น้ำแคว ซอยสิงคโปร์ ต.ทามะขาม อ.เมือง จ.ภาณุจนวนบุรี ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสุพจน์ เอื้อเพื่อ ตำแหน่ง พทช.๖ โทร ๐๘๑-๕๒๖๘๘๕๗ / ๐๓๕-๕๑๑๕๕๑ / ๐๓๕-๕๑๒๕๕๖ พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ   
( นายชัชชัย เขิดชูสุวรรณ )  
ตำแหน่ง รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟภ.กจ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ(ผคฟ.) กฟภ.๓  
เรียน อก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ 1 พิดเตอร์ KCA-6 จาก DIS ชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ ๙ พ.ย. ๖๕ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่ 1709/2565


อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิดเตอร์ จาก ถึง ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิดเตอร์ จาก ถึง ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ม.โพธิ์ ทอจ (๐๕) ประสานงานการขอตัดไฟกับ นางสุภัทรา เขิดชูสุวรรณ

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)  
เรียน ผจก. กฟภ.กจ.  
อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)  
อนุมัติ และแจ้ง จบ เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

  
( นายปวงวงศ์ พงษ์วงษ์ )  
๒๕๖๕.๑๑.๐๙



ขั้นตอนการสวิชซึ่ง 2 แผน  
แผนผังแนบ 1 แผน

ผจฟ. (สถานี) -  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

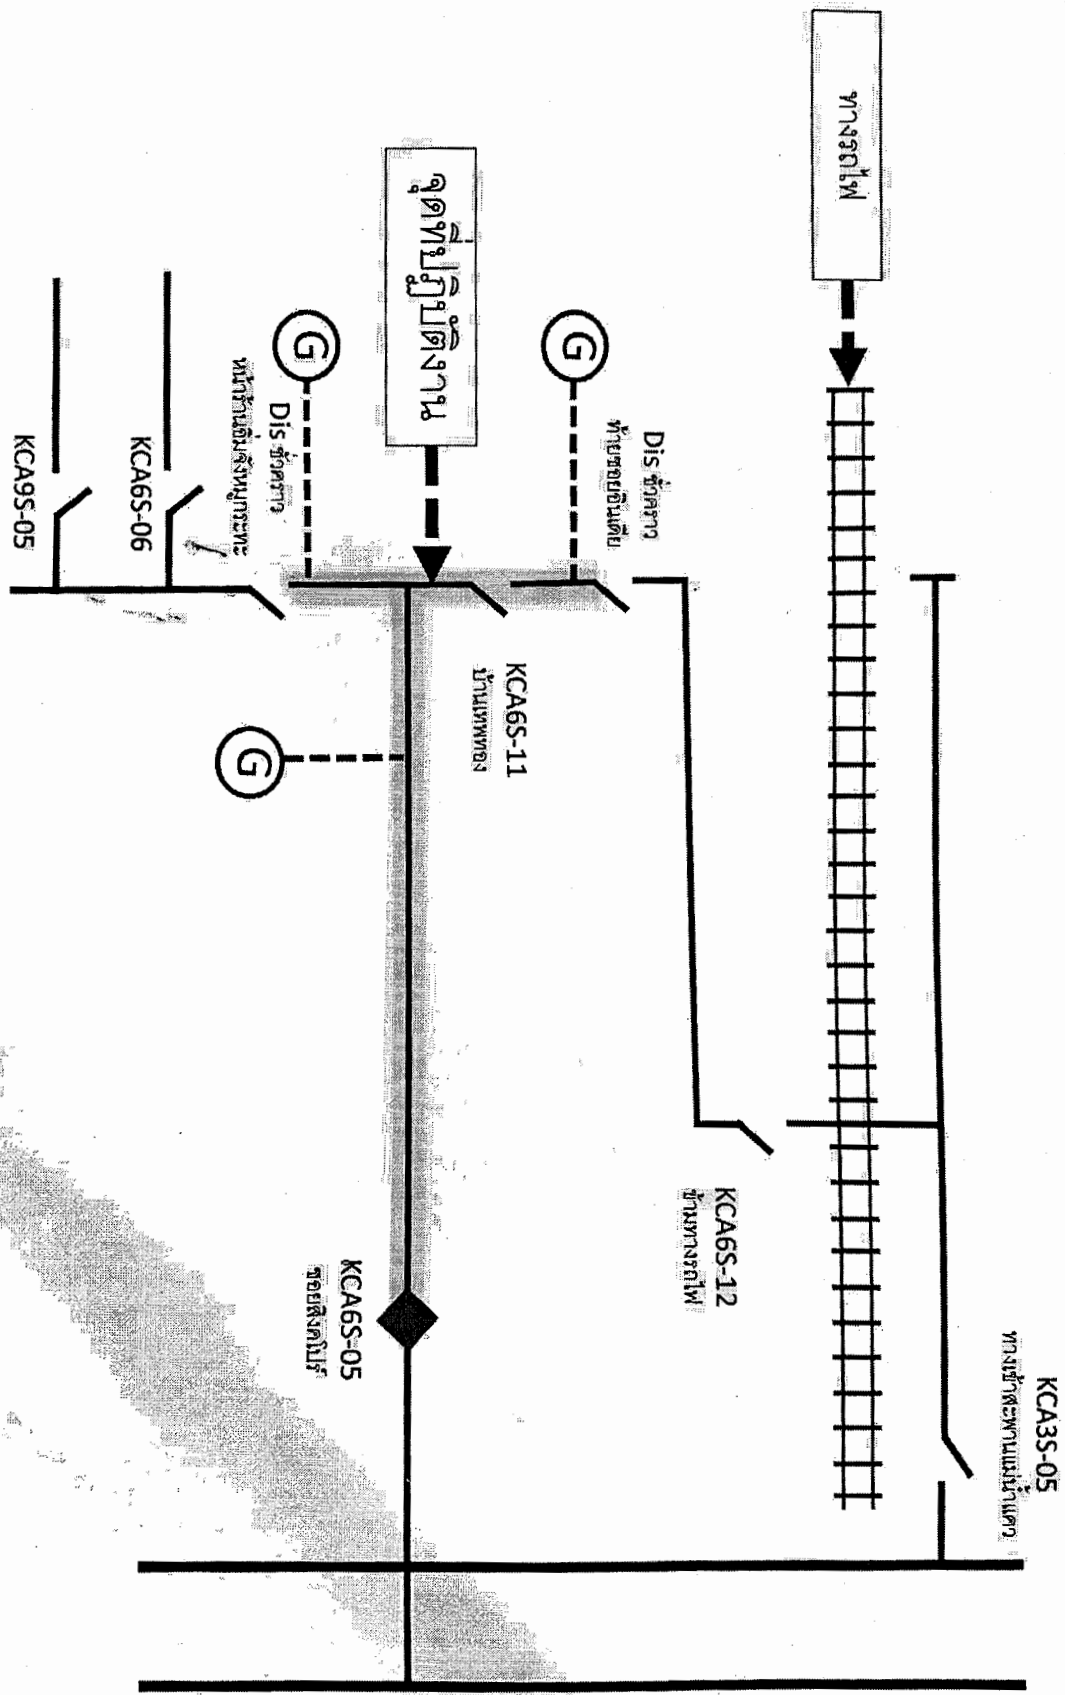
รท.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ป.บ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ก่อนถึงสะพานข้ามแม่น้ำแคว ซอยสิงคโปร์						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	9 พ.ย. 65	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	9 พ.ย. 65	17.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.กจ.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย			ตามใบขอปฏิบัติงาน 1709/2565	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมน โชน ทงย้อย				วันที่	29 ตุลาคม 2565	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	29 ตุลาคม 2565	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	29 ตุลาคม 2565	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 2. นายสถาพร, นายพิชชา, นายสุธี, นายอมร 3. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	KB-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
3	KCA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA	-	-
4	KB-KT1A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
5	KCA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA	-	-
6	*ย้ายโหลด KCA06 บางส่วนไปรับไฟจาก KCA03*						
7	KCABVB-01	ปลด	สับ		KCA	-	ขนานบัส
8	KCA03S-05	ปลด	สับ		กจ.	DIS	ทางเข้าสะพานข้ามแม่น้ำแคว
9	DIS ชั่วคราว KCA06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กจ.	DIS	ท้ายซอยอินเดีย
10	KCABVB-01	สับ	ปลด		KCA	-	ขนานบัส
11	แจ้ง กฟผ.กจ. ตรวจสอบสถานะ SF6 รหัส KCA06S-05(ซอยสิงคโปร์) อยู่ตำแหน่งปลด โขว์ OFF และให้ดำเนินการล๊อคคาน						
12	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.30 น.						
13	DIS ชั่วคราว KCA06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กจ.	DIS	รั้วหมู่กระทะอิมจิ่ง
14	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานทราบ						
15	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
16	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
17	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G3						
18	หลังจากชุดปฏิบัติงาน Test ไฟ และ Short Ground พร้อมลงใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
19	แจ้งชุดปฏิบัติงานปฏิบัติงานได้						
20	KB-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
21	KCA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA	-	-
22	KB-KT1A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
23	KCA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA	-	-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
24	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานแล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหลดกลับ						
25	KB-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
26	KCA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA	-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
27	KB-KT1A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-	-
28	KCA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		-	-
29	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1							
30	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2							
31	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G3							
32	ยืนยันการลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว							
33	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ เวลา 17.00 น.							
34	DIS ชั่วคราว KCA06	ปลด	สับ		กจ.		DIS	รำหูกกระทบอิมจึง
35	*ย้ายโหนด KCA06 บางส่วนกลับคืนจาก KCA03*							
36	KCABVB-01	ปลด	สับ		KCA		-	ขนานบัส
37	DIS ชั่วคราว KCA06	ปลด	สับ		กจ.		DIS	ท้ายซอยอินเดีย
38	KCA03S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กจ.		DIS	ทางเข้าสะพานแม่น้ำแคว
39	KCABVB-01	สับ	ปลด		KCA		-	ขนานบัส
40	แจ้ง กพจ.กจ. ให้ดำเนินการปลดล๊อคคาน SF6 รหัส KCA06S-05(ซอยสิงคโปร์)							
41	KB-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
42	KCA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		-	-
43	KB-KT1A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
44	KCA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		-	-
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							





บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง. ผจก. กฟ. กปด. กบ ถึง ผจก./ทพ. กฟ. กปด. กจ  
เลขที่ กบ. กค. กสจ 2472 วันที่ 20 ต.ค. 2565  
เรื่อง ขออนุมัติดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน  
อ้างถึง

เรียน ผจก. ทพ. กฟ. กปด. กจ  
ตามอนุมัติที่ กวว. กวว 2303 ต. 08-12-64 ให้แผนกก่อสร้างดำเนินการขยาย  
เขต/ปรับปรุงระบบจำหน่ายชื่องาน 215 แรงดัน 110KV - 215KV กว. กค. กสจ  
อำเภอ 6509 จังหวัด กทม. กค. กสจ WBS. P-GE202.0-I-K&I-00.0094  
โครงข่าย 600 1188756 หมายเลขงาน

ปัจจุบันกรมได้ดำเนินการเตรียมแผนการปฏิบัติงานดังนี้  
๑. ปิดเคเบิ้ล 12-20 ม. 215KV 20 ต้น (แควมเคเบิ้ล)  
๒. กอ. เคเบิ้ล 12 ม. 215KV 20 ต้น / สายแรงดันแปลง 315 KV 1 สาย, 110 KV 1 สาย  
๓. ภาคสาร 185 GAE 215KV 0.5 กม.  
ในการดำเนินการมีการจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าแรงสูง ในวันที่ 9 พ.ย. 65  
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง เวลา 17.00 น. หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนกำหนด

จะจ่ายไฟฟ้าให้ก่อน ดังนั้นขอความอนุเคราะห์ให้ทาง ผจก. - กปด. กจ ดำเนินการดังนี้  
ผจก. กปด. กจ

- ดำเนินการประกาศแจ้งผู้ใช้ไฟในบริเวณดังกล่าวทราบในวัน, เวลา ตามระเบียบ
- ดำเนินการ ออกรหัสไฟไม่มีการรับ และ ปิดการตัดขั้วที่ ในอันตราเวลา ดังกล่าว  
ออกให้เสร็จก่อน รวมขอแจ้งทาง กอ. กค. กสจ ในจังหวัด และเวลา ดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการให้ต่อไป

(.....) (.....)  
ตำแหน่ง ผจก. กฟ. กปด. กบ

อนุมัติตามเสนอ

(นายชัชชัย เชิดชูสุวรรณ)  
รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก. กฟ. กจ.

20/10/65  
๒๑ ต.ค. ๖๕
