



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓๒๗๗-๒๖๖๒๒๕๒๕  
ชื่อผู้รับ นายพิพัฒน์ ทรัพย์สุวรรณชล  
ชื่อผู้ส่ง นายพัฒนา หงษ์อินทร์

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕  
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ร.จก.(ท.) รักษาการแทน ผจก.ภ.ฟ.อ.บ.บ.

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติงาน/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	BPB12VB	5 พ.ย. 65	08.00 น.	ก่อสร้าง สะพาน แล้วเสร็จ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	DIS ชั่วคราว บริเวณบ้านยายน้ก	จุดตัดเขต(A)	นายวิทยา เรือนสา

ด้วยการไฟฟ้า อ.บ้านโป่ง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย สถานีไฟฟ้า บ้านโป่ง ๒ ตาม  
แผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผน ดังนี้

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) \_\_\_\_\_

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวิทยา เรือนสา ตำแหน่ง ช.บ.บ.รักษาการแทน อ.ก.ป.บ.ฟ.อ.บ.บ. โทร ๐๕๖-๕๑๖๒๕๑๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชั่วคราว ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชั่วคราว ๑.๒  ไม่มีโอกาสชั่วคราว

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายพัฒนา หงษ์อินทร์)

ร.จก.(ท.)รักษาการแทน ผจก.ภ.ฟ.อ.บ.บ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

BPB12VB-๐๑, DIS ๕๑.

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ I. ฟีดเดอร์ จากบริเวณบ้านยายน้ก ถึง จุดตัด DDE (A).

ในวันที่ 5 พ.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 12.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1712/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก \_\_\_\_\_ ถึง \_\_\_\_\_

ในวันที่ \_\_\_\_\_ ตั้งแต่เวลา \_\_\_\_\_ น. ถึง \_\_\_\_\_ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ \_\_\_\_\_

พนักงานศูนย์ฯ นาย สมศักดิ์ ทรัพย์สุวรรณชล ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย วิทยา เรือนสา

28 ๐๙.๖๕

นายวิทยา เรือนสา  
รักษาการแทน ผจก.ภ.ฟ.อ.บ.บ.  
๐๕๖.๕๑๖๒๕๑๕

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กทบ.(คพ)

เรียน อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓) ผจก. กฟอ. ๒๒๖.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

ขั้นตอนการสวิตชิง..... 1 ..... แผ่น

แผนผังแนบ..... 1 ..... แผ่น

ผจพ. .... (สถานี.....)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)


รท.ทบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ทบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	DIS ชค.บริเวณร้านยายนิก - จุดตัด DDE (A)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	5 พ.ย. 65	ระหว่าง	08.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	บปง.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์		วันที่ 28 ตุลาคม 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 28 ตุลาคม 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 28 ตุลาคม 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร</li> <li>2. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ</li> <li>3. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช</li> </ol>		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1712/2565  (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการสวิตชิง							
1	BPB12R-01	Normal	Nonreclosing, ALT,GND		บปง.	R	หน้าโรงเรียนบ้านหนองเสือ
2	BPB10R-01	Normal	Nonreclosing, ALT,GND		บปง.	R	บ้านโคกหม้อ
3	ย้ายโหลด BPB12 บางส่วนไปรับไฟจาก BPB10						
4	BPB10S-11	ปลด	สับ		บปง.	DIS	โรงสีสามแยกบ้านยาง
5	DIS ชค.โลน BPB12	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บปง.	DIS	บริเวณร้านยายนิก
6	กพอ.บปง.แจ้งบริเวณจุดตัด DDE (A) ถึง DIS ชค.บริเวณบ้านยายนิกไม่มีโหลดผู้ใช้ไฟ						
7	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.00 น.						
8	แจ้ง HL ทำการตัด DDE จุด A ออกทั้ง 3 เฟสได้						
9	เมื่อ HL ทำการตัด DDE จุด A ออกทั้ง 3 เฟสแล้วเสร็จ						
10	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กพอ.บปง.ทราบ						
11	แจ้งให้ กพอ.บปง.ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
12	BPB12R-01	Nonreclosing, ALT, GND	Normal		บปง.	R	หน้าโรงเรียนบ้านหนองเสือ
13	BPB10R-01	Nonreclosing, ALT, GND	Normal		บปง.	R	บ้านโคกหม้อ
14	แจ้งชุดปฏิบัติงานให้สามารถปฏิบัติงานได้						
*****กพอ.บปง.แจ้งจะย้ายโหลดกลับสภาพเดิมเมื่องานสร้างสะพานจะแล้วเสร็จ*****							
*****สิ้นสุด Switching ทั้งหมด*****							

แผนผัง Singleline Diagram แสดงพื้นที่ดับกระแสไฟและจุดช็อตกราวด์

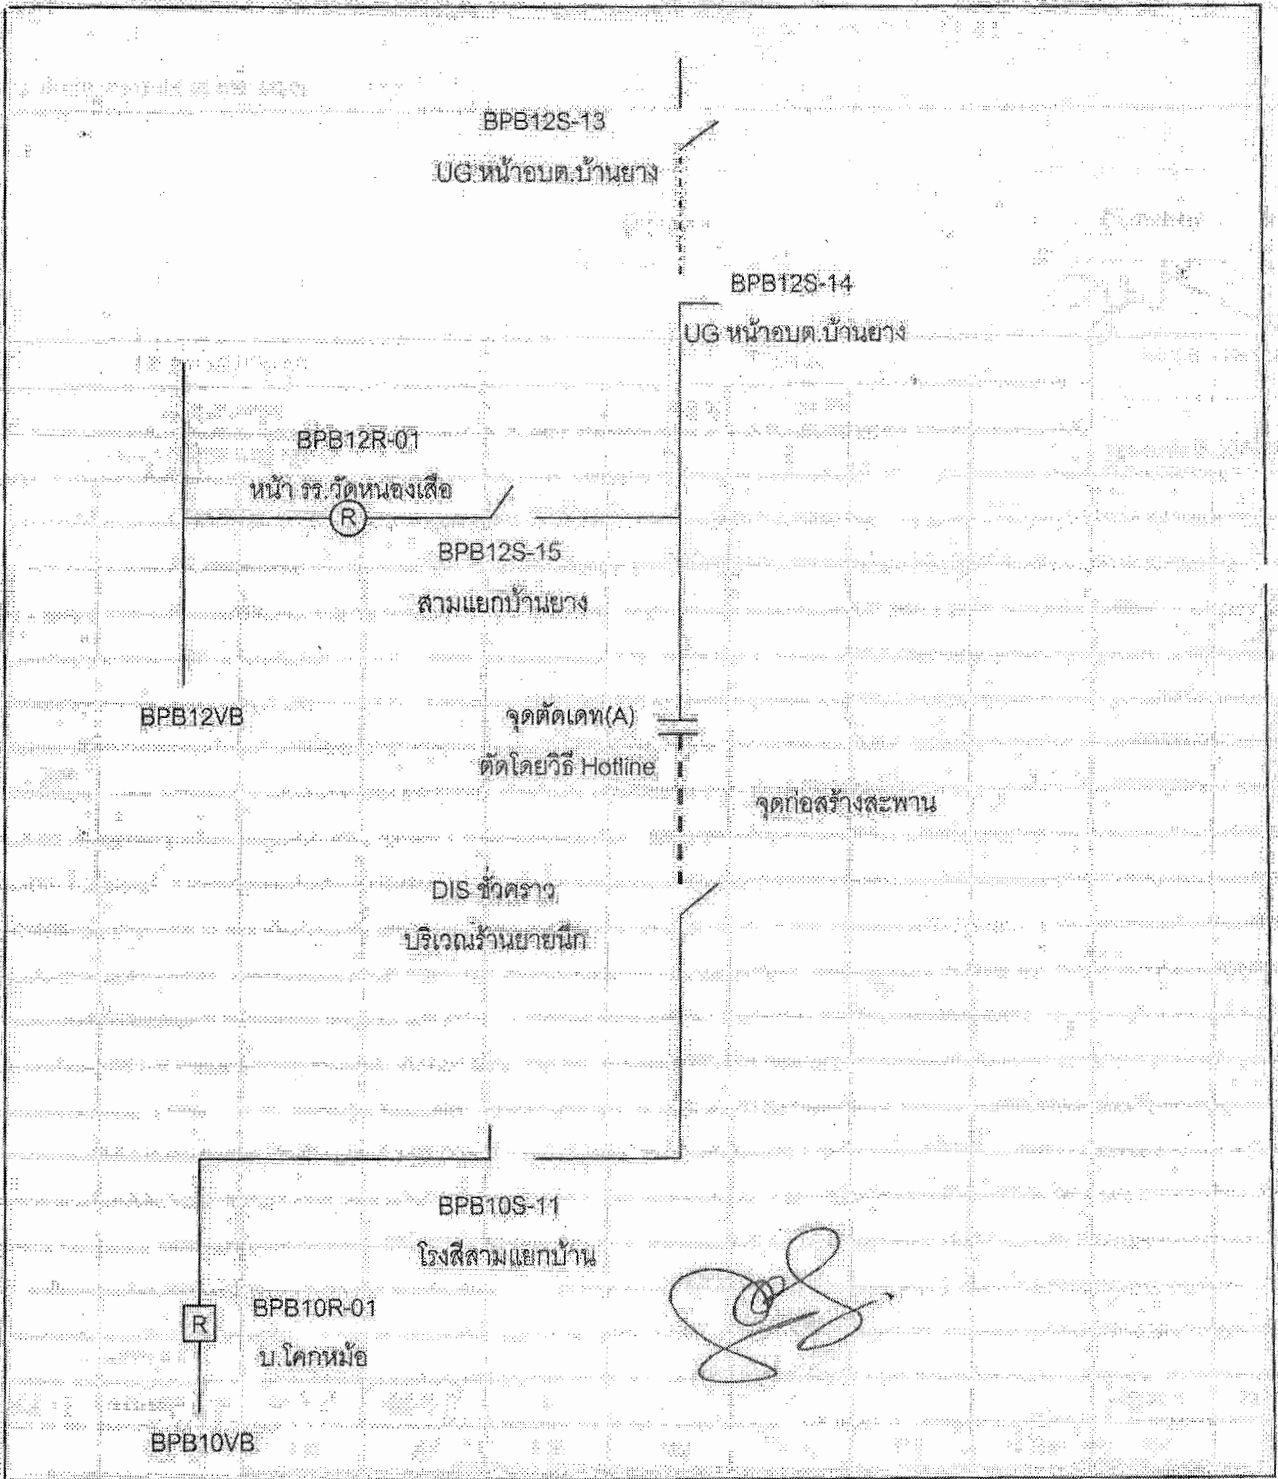

หมายเหตุ

- เส้นแสดงพื้นที่ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน
- ⊥ ตำแหน่งจุด Short Ground
- || จุดตัดเคท

ผู้ควบคุมงาน นายวิทยา เรือนสา  
 ผู้ Short Ground นายพลกิจ จงวัชรสถิตย์  
 จป.

สำนักงานการไฟฟ้า  
 ๑๖ ต.ค. ๒๕๖๕
