



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

12 ธ.ค. 66

วิทย์ขอตัดไฟ

เลขที่ ก.3 กสพ.(สก.) 207/2566
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่ ลว.10 พ.ย. 2566
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)
ตำแหน่ง อก.สพ.(ก3)

ด้วยการไฟฟ้า กสพ.(ก3) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า สถานี 2
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	TP.1 Bus 1	15 ธ.ค. 66 16	08.00 น.	16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole) เพื่อ บำรุงรักษาเบรคเกอร์, รีเลย์ และ เคเบิล 22 kV. บำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 kV. และบำรุงรักษา OLTC หม้อแปลง TP.1	-	-	นายเชาว์ลิต นิลรอด โทร. 081-3657367

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเชาว์ลิต นิลรอด ตำแหน่ง พชง.6 โทร. 081-3657367

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ สมหมาย ชื่นด้วง
(นายสมหมาย ชื่นด้วง)
ตำแหน่ง อก.สพ.(ก3)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3
เรียน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

ใน วันที่ 16 5-12-66 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 พิดเดอร์ TP.1 จาก UTV 14B-01 pothead
ตั้งแต่เวลา 08-00 น. ถึง 16-00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1728/66
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ พิดเดอร์ จาก ถึง
ใน วันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
พนักงานศูนย์ฯ นาย จรรณพงษ์ กนกมล ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเชาว์ลิต นิลรอด.

(นายเชาว์ลิต นิลรอด)
26ก.5 แทน นว.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ)
เรียน อก.สพ.(ก3), อก.วว.(ก3) ผจก. กฟภ. อก.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 3 แผ่น
แผนผังแนบ แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจพ. 1 (สถานี UTV)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 7.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเชาว์ลิต นิลรอด)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเชาว์ลิต นิลรอด)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

13 ธ.ค. 66

เลขที่ ก.๓.อท.(ปบ) 5811 /๒๕๖๖
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตวารมณี
ชื่อผู้ส่ง นายสรายุทธ์ เกตุมนี

วันที่ ๒๘ พ.ย. ๒๕๖๖
ตำแหน่ง อท.ปบ.(ก๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟล.อุทอง

ด้วยการไฟฟ้า อุทอง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณ ใต้ไลน์สายส่ง 115 เควี บริษัท อุทองพลาสมา เอ็นเนอร์ยี จำกัด ตามแผนผังสังเขปแนบจำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	F.1 (UTV)	16 ธ.ค.2566	08.00	17.00	ปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณ ใต้ไลน์สายส่ง 115 เควี บริษัท อุทองพลาสมา เอ็นเนอร์ยี จำกัด	บริเวณ Dis ชั่วคราว จุด A 14.51044, 99.91647	บริเวณ Dis ชั่วคราว จุด B 14.51274, 99.91531	นายจกส ไพธิกุล ชม.ปบ.กฟล.อุทอง โทร.๐๘๕-๒๖๖๘๘๘๘๘

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)..... * ๓๗ ร้อย ๓๗ พ. UTV 1728 *

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายจกส ไพธิกุล ตำแหน่ง ชม.ปบ. โทร๐๘๕-๒๖๖๘๘๘๘๘

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟล. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสรายุทธ์ เกตุมนี)

ตำแหน่ง รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟล.อุทอง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟล.๓

เรียน อท.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ 1 พิดเดอร์ UTV จาก Dis จุด A ถึง Dis จุด B
ในวันที่ 16 ธ.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1763/66

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย วรณพงษ์ นกนที ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายจกส ไพธิกุล

(นายจกส ไพธิกุล)
๐๘๕-๒๖๖๘๘๘๘๘

ขั้นตอนการสวิชชิง 5 แผ่น
แผนผังแนบ 2 แผ่น

ผจก. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟล.๓๗๐, กฟล.๓๗๑


อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อท.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตซิง

1. สถานที่ทำงาน	UTV-TP1 สถานีไฟฟ้า อุโมง 2 และ งานปรับปรุงระบบจำหน่าย UTV 1		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	16 ธ.ค. 66	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสพ.(ก3), กฟอ.บล. งานที่ทำ	บำรุงรักษา ตามวาระ, ปรับปรุงระบบจำหน่าย	ตามใบขอปฏิบัติงาน 1728,1763/66
4. เตรียมการสวิตซิงโดย	นายวรรณพงษ์ นกเทศ		วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
5. ตรวจสอบสวิตซิงโดย			วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
6. อนุมัติสวิตซิงโดย			วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
7. สั่งทำสวิตซิงโดย	1. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต 2. นายศุภสวัสดิ์, นายวรรณพงษ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนเฑียร 3. นายจิรวัฒน์, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	งานที่ทำมี 2 งาน						
2	**งานที่1 กฟอ.อหง.ปรับปรุงระบบจำหน่าย UTV1 ตั้งแต่ DIS ชค.จุด A ถึง DIS ชค.จุดB**						
3	**งานที่2 กสพ.(ก3.) บำรุงรักษาหม้อแปลง TP1,เบรกเกอร์,รีเลย์,เคเบิล Main Bus 1 ไม่มีไฟ ปลด pothead **						
4	แจ้งบริษัท อุโมงโอบีโอเพาเวอร์ และ บริษัท อุโมงโอบีโอแมส ให้ทำการหยุดขนานก่อนทำการสวิตซิง						
5	**งานที่ 1**						
6	ตรวจสอบสวิตตัดตอนและอุปกรณ์ป้องกันก่อนทำการสวิตซิง						
7	UTV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTV		
8	UTV01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTV		
9	UTV02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTV		
10	UTV01R-01	Normal	Nonreclosing,GND		UTV		
11	- Bypass UTV01R-01 R.ตรงข้ามทางเข้าอุโมงโอบีโอเพาเวอร์						
12	sw.bypass	ปลด	สับ		อหง.	sw	UTV01R-01
13	UTV01R-01	สับ	ปลด		อหง.	R	ตรงข้ามทางเข้าอุโมงโอบีโอเพาเวอร์
14	- ย้ายโหลด UTV01 บางส่วนไปรับไฟจาก UTV02						
15	UTV15-08	ปลด	สับ		อหง.	DIS	แยกจรั้าใหม่
16	DIS ชค. UTV01	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อหง.	DIS	ชค.จุด B
17	- ดับไฟ เวลา 08.00 น.						
18	DIS ชค. UTV01	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อหง.	DIS	ชค.จุด A
19	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ อหง.รับทราบ						
20	แจ้ง กฟอ.อหง.ทำการเทสไฟดับให้เรียบร้อย						
21	แจ้ง กฟอ.อหง.ทำการShort ground จุด G1						
22	แจ้ง กฟอ.อหง.ทำการShort ground จุด G2						
23	แจ้งกฟอ.อหง.ลง We safe และปฏิบัติงานได้						
24	UTV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTV		
25	UTV01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTV		
26	UTV02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTV		
27	สิ้นสุด Switching เข้า **งานที่ 1**						


ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	**งานที่ 2**						
29	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		
30	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		
31	UTG02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		
32	UTG07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		
33	UTG08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		
34	UTV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTV		
35	UTV01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTV		
36	UTV02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTV		
37	UTV03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTV		
38	UTV04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTV		
39	DOA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTV		
40	DOA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTV		
41	- ย้ายโหลด UTV01 บางส่วนไปรับไฟจาก UTG08 **ลดโหลด**						
42	UTV1S-10	ปลด	สับ		สดง.		SF6 วัดโรงช้าง
43	UTV1S-09	สับ	ปลด, ล็อคคาน		อทง.		SF6 แยกดินเบ็ด
44	- ย้ายโหลด UTG02 บางส่วนไปรับไฟจาก DOA08 **ลดโหลด**						
45	DOA08S-14	ปลด	สับ		สพ.		SF6 วัดสามเหลี่ยม
46	UTG07S-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สดง.		SF6 บ้านดอนแจ่ง
47	- ย้ายโหลด UTV04 บางส่วนไปรับไฟจาก UTV03 **ลดโหลด**						
48	UTV03S-06	ปลด	สับ		อทง.	SCADA	SF6 หนองกาห้อง
49	UTV04R-01	สับ	ปลด		อทง.	SCADA	R รง.น้ำตาล
50	- ย้ายโหลด UTV01 ไปรับไฟจาก UTV03						
51	UTV1S-02	ปลด	สับ		อทง.		SF6 หน้า UTV
52	UTV1VB-01	สับ	ปลด		UTV		CB UTV01
53	- ย้ายโหลด UTV01,03 ไปรับไฟจาก UTG02						
54	UTG02S-07	ปลด	สับ		อทง.	SCADA	SF6 รร.รัตนศึกษา
55	UTV3VB-01	สับ	ปลด		UTV		CB UTV03
56	- ย้ายโหลด UTV02 ไปรับไฟจาก UTV04						
57	UTV2S-02	ปลด	สับ		อทง.		SF6 ตรงข้าม UTV
58	UTV2VB-01	สับ	ปลด		UTV		CB UTV02
59	- ย้ายโหลด UTV02,04 ไปรับไฟจาก UTG07						
60	UTG07S-23	ปลด	สับ		อทง.		SF6 อุโมงนคร
61	UTV4VB-01	สับ	ปลด		UTV		CB UTV04
62	- ดับไฟ UTV-TP1 เวลา 08.00 น.						
63	UTV01BVB-01	สับ	ปลด		UTV		CB 22 kv. IN01
64	UTV01YB-01	สับ	ปลด		UTV		CB 115 kv. TP1
65	UTV01YS-01	สับ	ปลด		UTV		ใบมีด 115 kv.
66	UTV01S-01	สับ	ปลด		UTV.		Pothead F1

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
67	UTV02S-01	สับ	ปลด		UTV		Pothead F2
68	UTV03S-01	สับ	ปลด		UTV		Pothead F3
69	UTV04S-01	สับ	ปลด		UTV		Pothead F4
70	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		
71	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		
72	UTG02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		
73	UTG07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		
74	UTG08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		
75	DOA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTV		
76	DOA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTV		
77	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กบข.รับทราบ						
78	แจ้งกบข. Test ไฟดับเรียบร้อยพร้อมลง We safe						
79	แจ้งกบข.ปฏิบัติงานได้ทุกชุด						
80	สิ้นสุด Switching เข้า **งานที่ 2**						
81	หลังจากกบข.ปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด ** งาน 2 **						
82	ตรวจสอบสวิตต์ตัดตอนและอุปกรณ์ป้องกันก่อนทำการสวิตซิง						
83	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		
84	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		
85	UTG02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		
86	UTG07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		
87	UTG08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		
88	DOA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTV		
89	DOA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTV		
90	- จ่ายไฟ UTV-TP1						
91	UTV01S-01	ปลด	สับ		UTV		Pothead F1
92	UTV02S-01	ปลด	สับ		UTV		Pothead F2
93	UTV03S-01	ปลด	สับ		UTV		Pothead F3
94	UTV04S-01	ปลด	สับ		UTV		Pothead F4
95	UTV01YS-01	ปลด	สับ		UTV		ใบมีด 115 kV.
96	UTV01YB-01	ปลด	สับ		UTV	CB	115 kV. TP1
97	UTV01BVB-01	ปลด	สับ		UTV	CB	22 kV. IN01
98	ปรับแรงดัน UTV-TP1 ไว้ 22.5 kV.						
99	- ย้ายโหลด UTV02,04 กลับจาก UTG07						
100	UTV4VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		UTV	CB	UTV04
101	UTG07S-23	สับ	ปลด, ล็อคคาน		อทง.	SF6	อุโมงนคร
102	- ย้ายโหลด UTV02 กลับจาก UTV04						
103	UTV2VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		UTV	CB	UTV02
104	UTV2S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		อทง.	SF6	ตรงข้าม UTV
105	- ย้ายโหลด UTV01,03 กลับจาก UTG02						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
106	UTV3VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		UTV		CB	UTV03
107	UTG02S-07	สับ	ปลด		อทง.	SCADA	SF6	รร.รัตนศึกษา
108	- ย้ายโหลด UTV01 กลับจาก UTV03							
109	UTV1VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		UTV		CB	UTV01
110	UTV1S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		อทง.		SF6	หน้า UTV
111	- ย้ายโหลด UTV01 บางส่วนกลับจาก UTG08 **ลดโหลด**							
112	UTV1S-09	ปลด	สับ		อทง.		SF6	แยกดินเปิด
113	UTV1S-10	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สตง.		SF6	วัดโรงช้าง
114	- ย้ายโหลด UTG02 บางส่วนกลับจาก DOA08 **ลดโหลด**							
115	UTG07S-08	ปลด	สับ		สตง.		SF6	บ้านดอนแจง
116	DOA08S-14	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพ.		SF6	วัดสามเหลี่ยม
117	- ย้ายโหลด UTV04 บางส่วนกลับจาก UTV03 **ลดโหลด**							
118	UTV04R-01	ปลด	สับ		อทง.	SCADA	R	รง.น้ำตาล
119	UTV03S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		อทง.	SCADA	SF6	หนองกร้าง
120	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG			
121	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG			
122	UTG02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG			
123	UTG07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG			
124	UTG08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG			
125	DOA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTV			
126	DOA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTV			
127	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด **งานที่ 2**							
128	หลังจากกฟอ.อทง.ปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด ** งาน 1 **							
129	แจ้ง กฟอ.อทง.ทำการปลด Short ground จุด G1							
130	แจ้ง กฟอ.อทง.ทำการปลด Short ground จุด G2							
131	ตรวจสอบสวิตตัดตอนและอุปกรณ์ป้องกันก่อนทำการสวิตชิง							
132	UTV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTV			
133	UTV01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTV			
134	UTV02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTV			
135	- จ่ายไฟ							
136	DIS ชค. UTV01	ปลด	สับ		อทง.		DIS	ชค.จุด A
137	- ย้ายโหลด UTV01 บางส่วนไปรับไฟจาก UTV02							
138	DIS ชค. UTV01				อทง.		DIS	ชค.จุด B
139	UTV1S-08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อทง.		DIS	แยกจรัใหม่
140	- Bypass UTV01R-01 R.ตรงข้ามทางเข้าอุโมงค์ไปโอพาวเวอร์							
141	UTV01R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing	block	อทง.		R	ตรงข้ามทางเข้าอุโมงค์ไปโอพาวเวอร์
142	sw.bypass	สับ	ปลด		อทง.		SW	UTV01R-01
143	UTV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTV			
144	UTV01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTV			

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
145	UTV02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTV		
146	UTV01R-01	Nonreclosing,GND	Normal		UTV		
147	แจ้งบริษัท อู่ทองไบโอเพาเวอร์ และ บริษัท อู่ทองไบโอแมส ให้ทำการขนานไฟได้ตามปกติ						
148	สิ้นสุด Switching ** งาน 1 **						

แผนผังงานดับไฟ ปรับปรุงระบบจำหน่าย ใต้สายส่ง 115 เควี
บริษัท อุทองพลาสมา เอ็นเนอร์ยี จำกัด SPP กอนดับไฟ

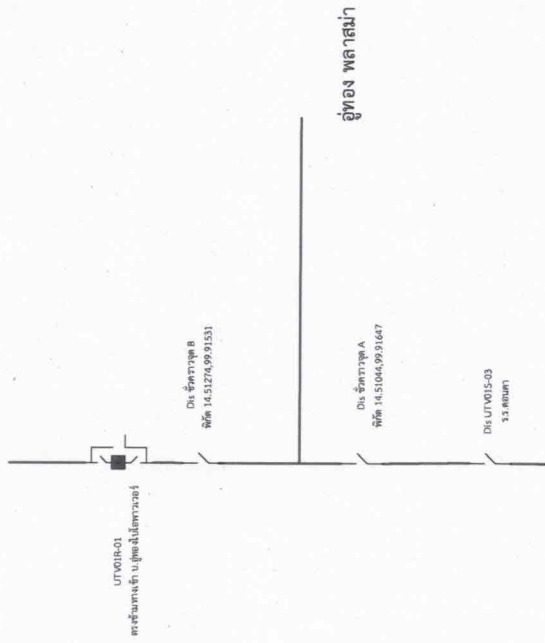

แผนผังงานดับไฟ ปรับปรุงระบบจำหน่าย ใต้ดินสายส่ง 115 เควี
บริษัท อู่ทองฟลาสมา เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด SPP หลังดับไฟ

