



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ 04037
เลขที่ ก.๓.สพ.ร.(ปบ.)
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ ธิงโตทอง
ชื่อผู้ส่ง นายวิฑูรย์ ชาติวัฒนานนท์

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า...สามพราน...จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ แก้ไขอุปกรณ์ต้น SAC๓S-๐๑, SAC๔S-๐๑ ให้กรมทางหลวงวางท่อ
ระแนงน้ำหน้าสถานี SAC...ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน...๑...แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงาน/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SAC๐๓	๘-๑๘ พ.ย. ๖๕	๐๖.๐๐	๑๘.๐๐	-แก้ไขอุปกรณ์ต้น Riser Pole -กรมทางหลวงวางท่อระบายน้ำ	SAC๐๓	SAC๓S-๐๑, SAC๔S-๐๑	นายรัชชัย วงศ์บุญมาก ๐๘๙-๙๘๑๔๓๗๒
๒	SAC๐๔	๘-๑๘ พ.ย. ๖๕	๐๖.๐๐	๑๘.๐๐	-แก้ไขอุปกรณ์ต้น Riser Pole -กรมทางหลวงวางท่อระบายน้ำ	SAC๐๔	SAC๒S-๐๒, Dis	
3	SAC 2, 7	๘ พ.ย. 65					ชั่วคราวก่อนถึงคอค่า	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)..... ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ.....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายรัชชัย วงศ์บุญมาก..... ตำแหน่ง ทส.ปบ..... โทร. ๐๘๙-๙๘๑๔๓๗๒

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟก. (หากมีโอกาสรูด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสรูด ๑.๒ ไม่มีโอกาสรูด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....
(นายวิฑูรย์ ชาติวัฒนานนท์)
ผจก.กฟอ.สามพราน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเดอร์ SAC03 จาก SAC03V8-01 ถึง SAC3S-02, 03
ในวันที่ 8-18 พ.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึง 18.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1732/65

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 2 พิดเดอร์ SAC04 จาก SAC04V8-01 ถึง SAC4S-02, Dis. รว. ทอ. ๖๐๕๑๑๑

ในวันที่ 8-18 พ.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึง 18.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 3 พิดเดอร์ SAC02 จาก SAC02V8-01 ถึง SAC2S-02, Pis. ทอ. ๖๐๕๑๑๑

ในวันที่ 8 พ.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึง 18.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 3 พิดเดอร์ SAC07 จาก SAC07V8-01 ถึง PMB1S-01, SAC2S-02, SAC3S-02

ในวันที่ 8 พ.ย. 65 ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย อภิสิทธิ์ ธีรพงษ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายรัชชัย วงศ์บุญมาก

ลงชื่อ.....
(นายอภิสิทธิ์ ธีรพงษ์)
๐๑๑-4 พ.ย. ๖๕

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ.๓, กฟอ.๖, กฟอ.๗๗๗.
อก.บช.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์..... 3 แผ่น
แผนผังแนบ..... 2 แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th



ผจก. (.....) (สถานี..... SAC.....)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา 05.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ผคฟ.๐๑-(rev.๐๒/๒๕๖๑)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณหน้าสถานีฯ สามพราน 3 (ถาวร) (SAC03,09,02,07)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	8-18 พ.ย.65	เวลา	06.00 น.	ถึง	18.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.สพร.	งานที่ทำ	กรมทางฯ วางท่อระบายน้ำ		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1732/2565	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศุภสวัสดิ์ เทียงผดุง			วันที่	4 พฤศจิกายน 2565	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	4 พฤศจิกายน 2565	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	4 พฤศจิกายน 2565	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
งานที่ทำ : 1. วันที่ 8 พ.ย. 65 (เวลา 06.00-18.00) ดับไฟวงจร SAC02,07 ให้ กบข. แก่ไข่อุปกรณ์ต้น Riser Pole							
2. วันที่ 8-18 พ.ย. 65 (เวลา 06.00-18.00) ดับไฟวงจร SAC03,09 ให้กรมทางฯ วางท่อระบายน้ำ (ดับเข้า-จ่ายเย็น)							
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC		-
3	SAC02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		Load 0.86 MW
4	SAC03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		Load 2.94 MW
5	SAC07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		Load 2.0 MW
6	SAC09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		Load 0.43 MW
7	PMB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB		-
8	PMB06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		Load 1.46 MW
9	PMB08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		Load 1.12 MW
10	PMB10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		Load 5.33 MW
11	NCS-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
12	NCA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		Load 3.20 MW
13	ย้ายโหลด SAC03 ไปจ่ายจาก PMB08						
14	PMB08S-05	ปลด	สับ		นช.	SCADA	SF6 แบงค์ชาติ
15	SAC03VB-01	สับ	ปลด		SAC		CB SAC03
16	ย้ายโหลด SAC09 ไปจ่ายจาก NCA10						
17	NCA10S-11	ปลด	สับ		นช.	SCADA	SF6 ทุ่งขี้ผึ้ง
18	SAC09VB-01	สับ	ปลด		SAC		CB SAC09
19	ย้ายโหลด SAC02 ไปจ่ายจาก PMB06						
20	SAC02S-04	ปลด	สับ		พทช.	SCADA	SF6 แก้วฟ้าตุ๊กตา
21	SAC02VB-01	สับ	ปลด		SAC		CB SAC02
22	ย้ายโหลด SAC07 บางส่วนไปจ่ายจาก PMB10						
23	PMB10S-18	ปลด	สับ		พทช.		SF6 ตรงข้ามคักดีศรีเจมมอน
24	SAC07S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		พทช.	SCADA	SF6 ปากซอยหอมเกร็ด 2
25	เมื่อพร้อมดับไฟ						
26	SAC07VB-01	สับ	ปลด		SAC		CB SAC07
27	SAC03S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6 ร้านดอยคำ(บน)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	Dis.ชั่วคราว SAC09	สับ	ปลด(ใช้โหดบัสเตอร์)		สพร.		DIS ชด.ก่อนถึงดอยคำ
29	Dis.ชั่วคราว SAC02	สับ	ปลด(ใช้โหดบัสเตอร์)		สพร.		DIS ชด.หน้าเดินท่รถ(Bird รดสวย)
30	SAC02S-01	สับ	ปลด		สพร.		- POT HEAD F.2
31	SAC07S-01	สับ	ปลด		สพร.		- POT HEAD F.7
32	SAC02VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SAC		CB SAC02
33	SAC07VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SAC		CB SAC07
34	แจ้งพนักงานสถานีฯ ตรวจสอบไปยอนที่เบรกเกอร์ รหัส SAC02, 07VB-01 ตรวจสอบแล้วไม่มีไปยอน ให้สับกราวด์						
35	SAC02VG-01	ปลด	สับ		SAC		- กราวด์ F2
36	SAC07VG-01	ปลด	สับ		SAC		- กราวด์ F7
37	แจ้ง กพอ.สามพราน ตรวจสอบสถานะ SF6 SAC02S-02 หน้าสถานีฯ อยู่ตำแหน่ง Open พร้อม ล็อคคาน						
38	แจ้ง กพอ.สามพราน ตรวจสอบสถานะ SF6 SAC03S-02 หน้าเดินท่รถ อยู่ตำแหน่ง Open พร้อม ล็อคคาน						
39	แจ้ง กพอ.พุทธมณฑล ตรวจสอบสถานะ SF6 PMB01S-04 แก้วฟ้าตุ๊กตา อยู่ตำแหน่ง Open พร้อม ล็อคคาน						
40	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานทราบ						
41	แจ้ง กพอ.สามพราน ทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G1						
42	แจ้ง กพอ.สามพราน ทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G2						
43	แจ้ง กพอ.สามพราน ทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G3						
44	แจ้ง กพอ.สามพราน ทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G4						
45	หลังจาก กพอ.สามพราน ทำการ Test ไฟ Short Ground ครบทุกจุด พร้อมลงรายละเอียดใน We safe เรียบร้อย						
46	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC		-
47	PMB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PMB		-
48	PMB06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		-
49	PMB08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		-
50	PMB10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		-
51	NCS-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
52	NCA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		-
53	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
54	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
55	แจ้ง กพอ.สามพราน ทำการปลด Short Ground จุด G1						
56	แจ้ง กพอ.สามพราน ทำการปลด Short Ground จุด G2						
57	แจ้ง กพอ.สามพราน ทำการปลด Short Ground จุด G3						
58	แจ้ง กพอ.สามพราน ทำการปลด Short Ground จุด G4						
59	หลังจาก กพอ.สามพราน ทำการปลด Short Ground ครบทุกจุด พร้อมยืนยันใน We safe เรียบร้อย						
60	SAC02VG-01	สับ	ปลด		SAC		- กราวด์ F2
61	SAC07VG-01	สับ	ปลด		SAC		- กราวด์ F7
62	SAC02VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SAC		CB SAC02
63	SAC07VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SAC		CB SAC07
64	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC		-
65	PMB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB		-
66	PMB06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
67	PMB08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		-
68	PMB10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		-
69	NCS-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
70	NCA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		-
71	SAC02S-01	ปลด	สับ		สพร.		- POT HEAD F.2
72	SAC07S-01	ปลด	สับ		สพร.		- POT HEAD F.7
73	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
74	SAC07VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SAC		CB SAC07
75	SAC03S-03	ปลด	สับ		นช.		SF6 รั้นคดยค้ำ(บน)
76	Dis.ชั่วคราว SAC09	ปลด	สับ		สพร.		DIS ชค.ก่อนถึงคดยค้ำ
77	Dis.ชั่วคราว SAC02	ปลด	สับ		สพร.		DIS ชค.หน้าเต็นท์รถ(Bird รถสวย)
78	ย้ายโหลด SAC03 กลับจาก PMB08						
79	SAC03VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SAC		CB SAC03
80	PMB08S-05	สับ	ปลด		นช.	SCADA	SF6 แบงค์ชาติ
81	ย้ายโหลด SAC09 กลับจาก NCA10						
82	SAC09VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SAC		CB SAC09
83	NCA10S-11	สับ	ปลด		นช.	SCADA	SF6 ทุ่นซีฝั่ง
84	ย้ายโหลด SAC02 กลับจาก PMB06						
85	SAC02VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SAC		CB SAC02
86	SAC02S-04	สับ	ปลด		พทท.	SCADA	SF6 แก้วฟ้าตุ๊กตา
87	ย้ายโหลด SAC07 บางส่วนกลับจาก PMB10						
88	SAC07S-02	ปลด	สับ		พทท.	SCADA	SF6 ปากซอยหอมเกร็ด 2
89	PMB10S-18	สับ	ปลด,ลือคคาน		พทท.		SF6 ตรงข้ามคักดีศรีเจมออน
90	แจ้ง กพอ.สามพราน ปลดลือคคาน SF6 SAC02S-02 หน้าสถานีฯ หลังจากปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ในวันที่ 18 พ.ย. 65						
91	แจ้ง กพอ.สามพราน ปลดลือคคาน SF6 SAC03S-02 หน้าเต็นท์รถ หลังจากปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ในวันที่ 18 พ.ย. 65						
92	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC		-
93	SAC02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		-
94	SAC03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		-
95	SAC07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		-
96	SAC09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		-
97	PMB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PMB		-
98	PMB06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		-
99	PMB08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		-
100	PMB10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		-
101	NCS-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
102	NCA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

งานดับไฟ วันที่ ๘-๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ แก๊วอุปกรณ์ต้น SAC๓S-๐๑, SAC๙S-๐๑ และเพื่อให้กรมทางหลวงวางท่อระบายน้ำ ถ.บรมพิด็จเข้า กทม.

SAC

← PMSYB


NCA SYB

*****หมายเหตุ*****

วันที่ 8 พ.ย.65 กับ SAC02, SAC07, SAC03, SAC09 แก๊วอุปกรณ์

BUS 1
BUS 2

E-03NY

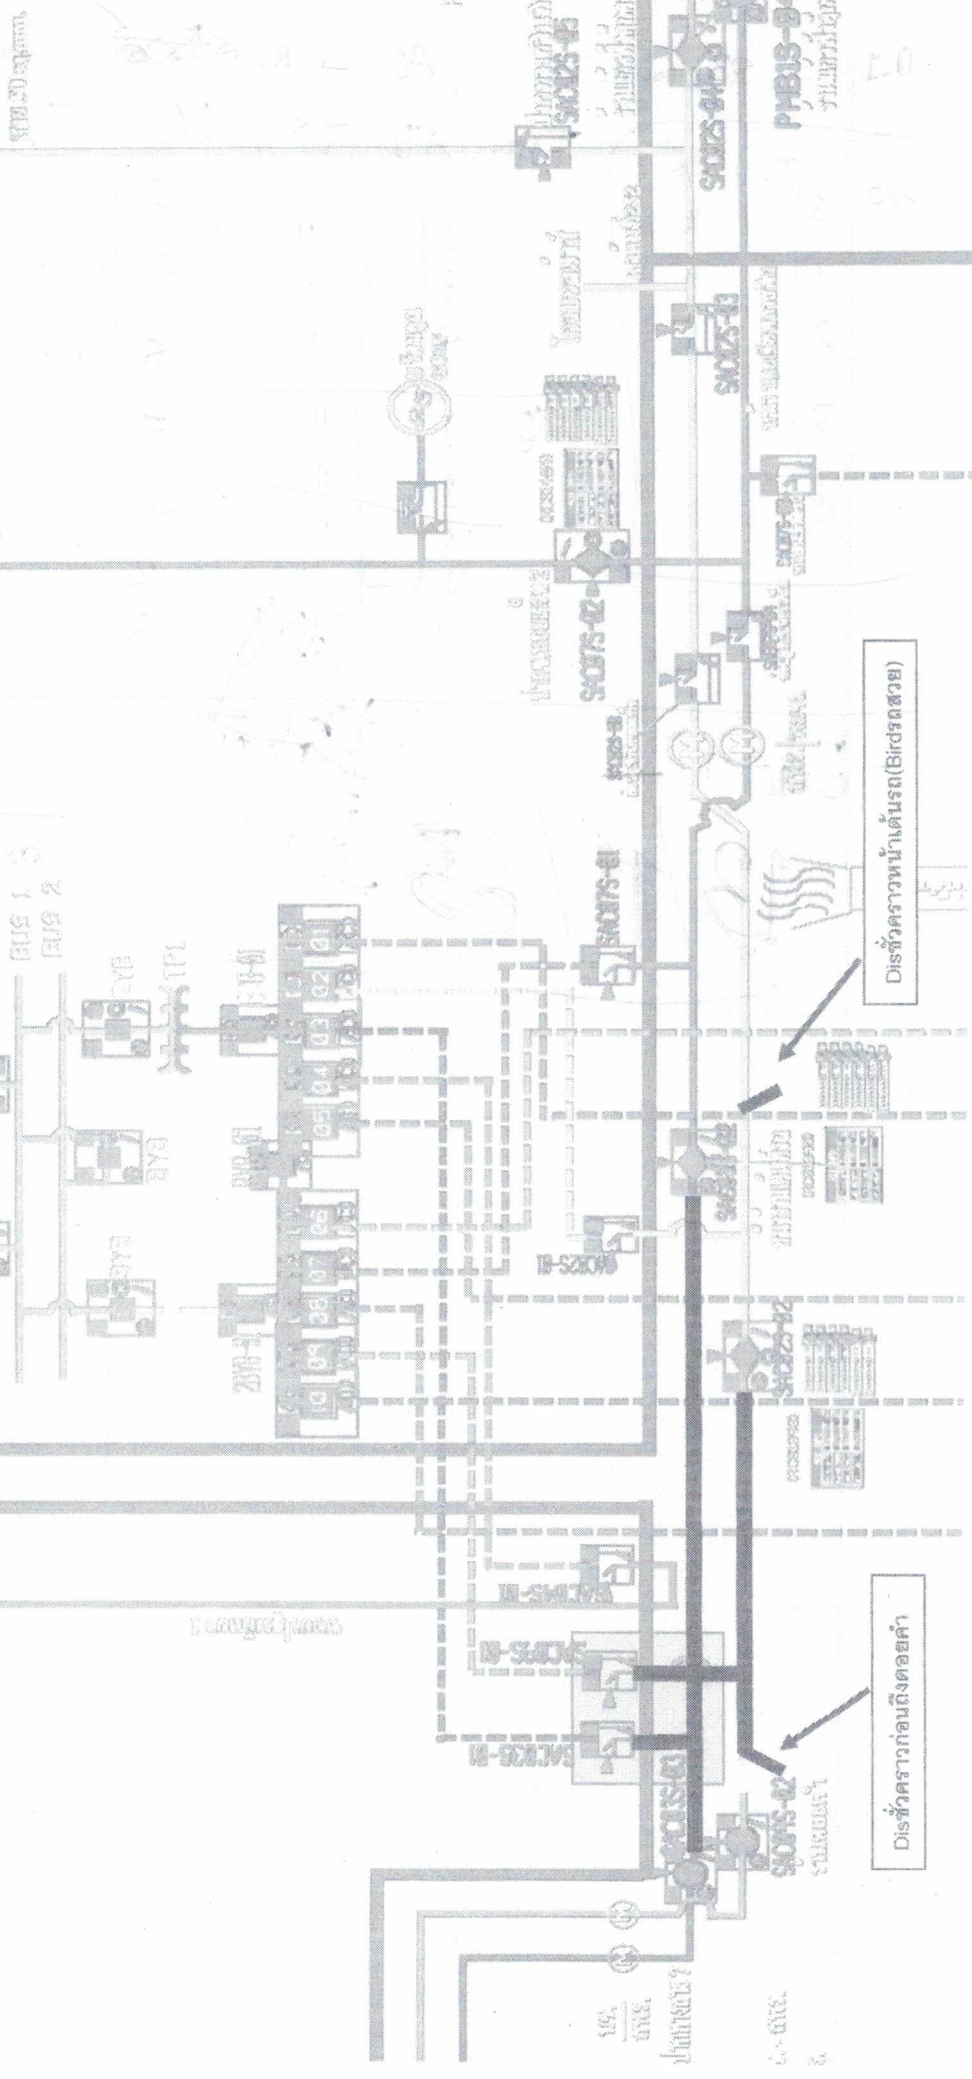

Disตัวตรวจหน้าต้นรถ(Birdรอดสวย)
