



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

22 พ.ย. 67

เลขที่ ก.3.ดบ.(ปบ).1131./2567
ชื่อผู้รับ นายพิชิตนันท์ พิชิตสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายสมนติ ยศศักดิ์ศรี

วันที่ 14 พ.ย. 2567
ตำแหน่ง ออ.ปบ.(ก3)
ตำแหน่ง รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.ดบ.

ด้วย กฟผ.เดิมบางนางนวข. ขอตัดไฟเพื่อให้ บ.ศรีชลธร ปฏิบัติงานพาดสายส่ง 115 เควี ขนาด 2x400 ต.มม. ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	DBA 05	24 พ.ย. 67	08.30 น.	16.30 น.	พาดสายส่ง 115 เควี ขนาด 2x400 ต.มม.	ดิสชั่วคราวร้านขาย ของเก่าแยกยางนอน	ดิสชั่วคราวแยก วัดเขาขึ้น	นายอำนาจ กิตติโพธิ์นันท์ วศก.9 กบล. (ก3) 086-2691259
	DBA 06	24 พ.ย. 67	08.30 น.	16.30 น.	แยกยางนอน ถึง แยก วัดเขาขึ้น	DBA 6S-02 โรงกลึงนางบวช	DBA 6S-03 หน้า สนง.ขนส่งเดิม บางนางบวช	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หมู่ที่ 5 ต.นางนวข.

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวรวิทย์ ศรีศักดิ์ ตำแหน่ง ชผ.ปบ โทร. 080-847-6904

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

3. พิกัดพื้นที่ดับไฟ 3.1 เริ่มต้น lat..... 14.831575.....long.....100.113682.....

3.2 สิ้นสุด Lat :... 14.814228... Long:... 100.118554.....

ลงชื่อ.....

(นายสมนติ ยศศักดิ์ศรี)

ตำแหน่ง รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.ดบ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.ก

เรียน ออ.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเดอร์ DBA 5 จาก DIS ริมถนนเก่าแยกยางนอนถึง DIS แยกวัดเขาขึ้น
ในวันที่ 24 พ.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 8-30 น. ถึง 16-30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่ 1733/67



อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พิดเดอร์ DBA 6 จาก DBA 6S-02 ถึง DBA 6S-03
ในวันที่ 24 พ.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 8-30 น. ถึง 16-30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่ 1733/67

พนักงานศูนย์ฯ นาย นวรัตน์ อภิรักษ์อินทร์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายวรวิทย์ ศรีศักดิ์

(นวรัตน์ อภิรักษ์อินทร์)

๑๑๐.๑ 11๓๖ พ.ศ.๖๗.

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	แยกยางนอน ถึง แยกวัดเขาขึ้น วงจร DBA05, DBA06		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	24 พ.ย. 67	ระหว่าง	08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.ดบ.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 1733/67
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายนครินทร์ อังสนาวิน		วันที่ 18 พฤศจิกายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 18 พฤศจิกายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 18 พฤศจิกายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสุภัสร์สวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมนโฆช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพิรภัทร, นส.สุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง							
1	DBA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		-
2	DBA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		-
3	ย้ายโหลด DBA05 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก DBA06						
4	DBA05S-04	ปลด	สับ		ดบ.	SCADA	SF6
5	DIS ชค.ไลน์ DBA05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดบ.		DIS
6	ย้ายโหลด DBA06 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก DBA05						
7	DBA05S-08	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ดบ.		SF6
8	DBA06S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ดบ.		SF6
9	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.30 น.						
10	DIS ชค.ไลน์ DBA05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดบ.		DIS
11	DBA06S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ดบ.		SF6
12	แจ้ง กฟส.ดบ Test ไฟดับแล้วทำการ Short Ground จุด G1						
13	แจ้ง กฟส.ดบ Test ไฟดับแล้วทำการ Short Ground จุด G2						
14	แจ้ง กฟส.ดบ Test ไฟดับแล้วทำการ Short Ground จุด G3						
15	แจ้ง กฟส.ดบ Test ไฟดับแล้วทำการ Short Ground จุด G4						
16	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงาน รับทราบ						
17	แจ้งให้ผู้ควบคุมงานทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อย						
18	DBA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-
19	DBA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
20	เมื่อ กฟส.ดบ.แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
21	DBA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		-
22	DBA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		-
23	แจ้ง กฟส.ดบ ทำการปลด Short Ground จุด G1						
24	แจ้ง กฟส.ดบ ทำการปลด Short Ground จุด G2						
25	แจ้ง กฟส.ดบ ทำการปลด Short Ground จุด G3						
26	แจ้ง กฟส.ดบ ทำการปลด Short Ground จุด G4						
27	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
28	DIS ชค.ไลน์ DBA05	ปลด	สับ		ดบ.		DIS	แยกวัดเขาขึ้น
29	DBA06S-02	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		ดบ.		SF6	โรงกึ่งนางบวช
30	ย้ายโหลด DBA06 บางส่วนกลับจาก DBA05							
31	DBA06S-03	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		ดบ.		SF6	หน้าขนส่งเดิมบาง
32	DBA05S-08	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		ดบ.		SF6	โรงสีบุญเจริญ
33	ย้ายโหลด DBA05 บางส่วนกลับจาก DBA06							
34	DIS ชค.ไลน์ DBA05	ปลด	สับ		ดบ.		DIS	ร้านขายของเก่าแยกยางนอน
35	DBA05S-04	สับ	ปลด		ดบ.	SCADA	SF6	ช่างขนส่ง
36	DBA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-	-
37	DBA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-	-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด								

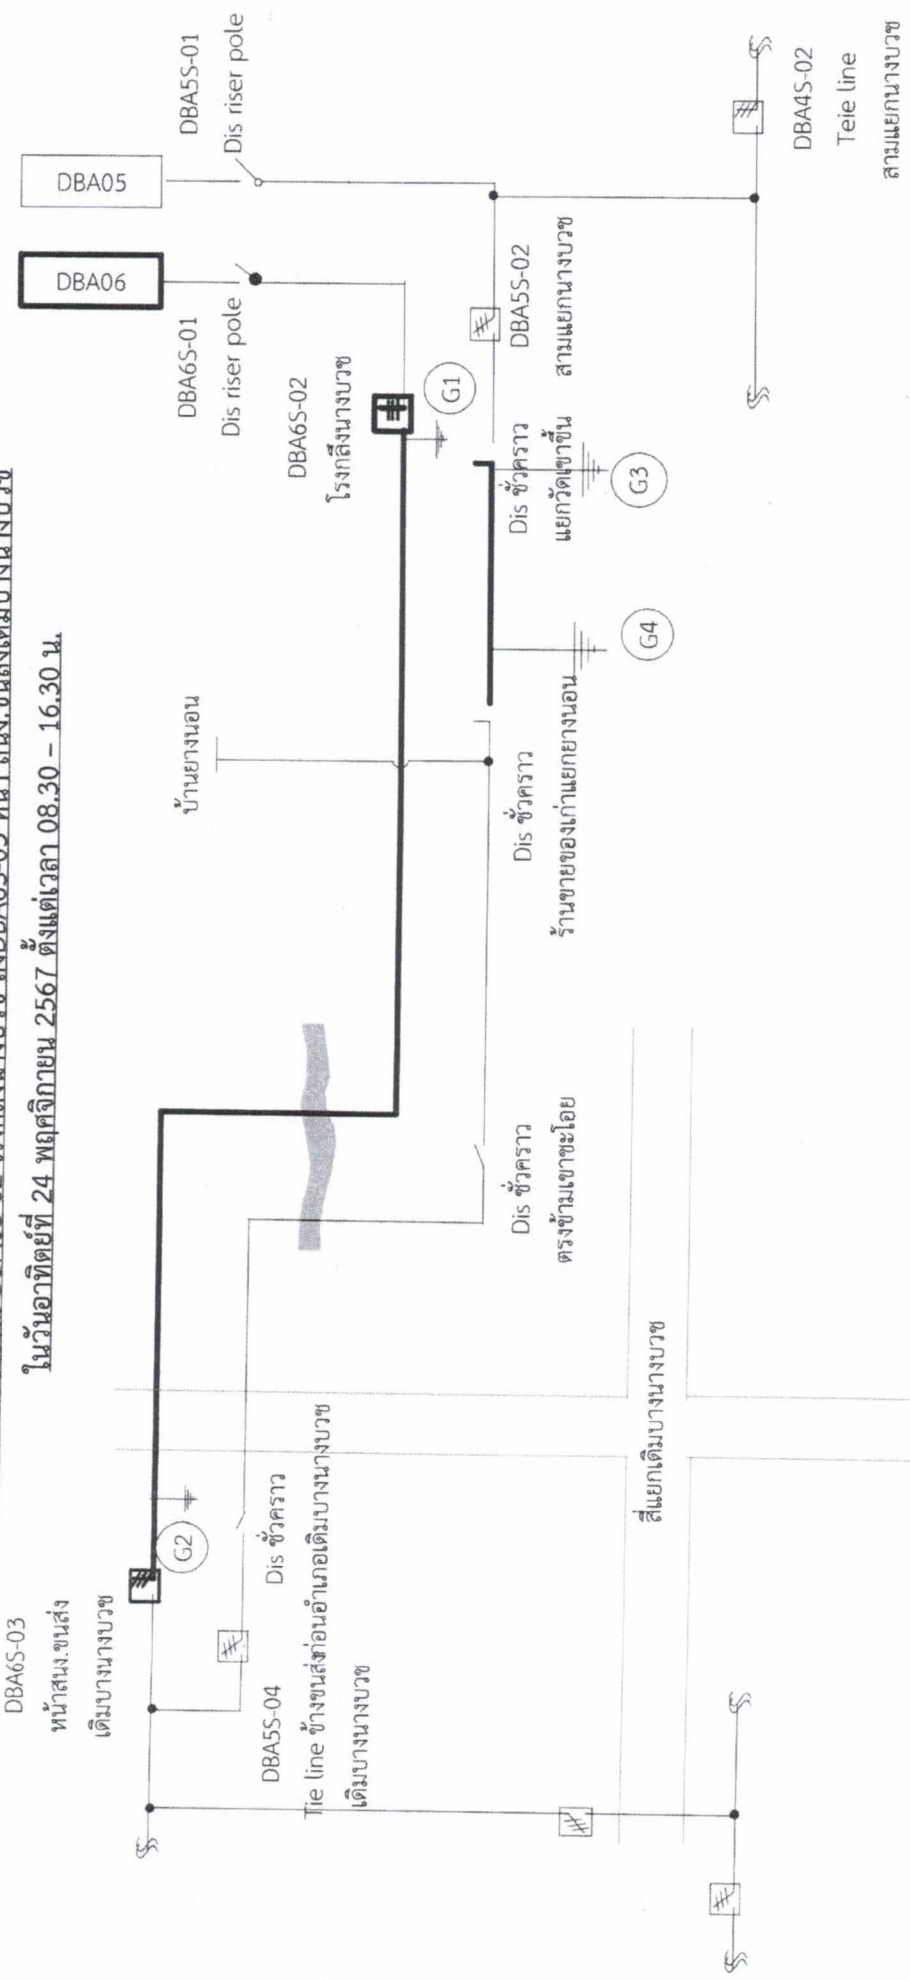
แผ่นที่ 1

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ดับไฟ เพื่องานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี

วงจร DBA05 บริเวณ Dis ชั่วคราวแยกวัดเขวขึ้น ถึง Dis ชั่วคราวร้านขายของเก่าแยกทางนอน

วงจร DBA06 บริเวณ DBA6S-02 โรงกลิ้งนางบวช ถึง DBA6S-03 หน้า สนง.ขนส่งเดิมบางนางบวช

ในวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.



16 พ.ย. 67

วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ดับไฟเพื่อให้ บ.ศรีษธร จำกัด พาดสายส่ง 115 เควี

หมายเหตุ — บริเวณที่ขอดับไฟปฏิบัติงาน

สถานะ การจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน
