



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

15 พ.ย. 67

เลขที่ ก.๓.กจ.(ปน.) ๒๕๖๗ / ๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพิชญนันท์ พริราสุวรรณจล
ชื่อผู้ส่ง นายธีระศักดิ์ เทืองขจร

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อ.ก.ปน.(ก๓)
ตำแหน่ง ผ.จก.(๑๑).กฟส.กจ.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.กาญจนบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เชื่อมเคท...บริเวณ ในไลน์แยกสะพานแม่กลองใน
ระบบจำหน่าย/สถานีไฟฟ้า สฟฟ.ท่าม่วง ๑ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	F๒ สฟฟ. TMA ๑	๑๘ พ.ย. ๖๗	๐๙.๐๐	๑๒.๐๐	เชื่อม DDE หลัง Recloser ไลน์แยก สะพานแม่กลอง และ เปลี่ยนHotline Clamp ไลน์แยก เป็น PG.๓ สลัก	Dis Bypass Recloser ไลน์แยกสะพานแม่กลอง	DDE (จุดตัดเคท) หลัง Recloser ไลน์แยกสะพานแม่กลอง	นายธีระ มานิช โทร ๐๘๕-๐๘๕๐๑๑๑

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บริเวณ ไลน์แยกสะพานแม่กลอง...ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวิรัชสันท์ เจนสกุลมงคล
ตำแหน่ง พ.ชง.๖ โทร. ๐๘๕-๕๓๘๗๑๑๙ / ๐๓๕-๕๑๑๕๕๑ / ๐๓๕-๕๑๒๕๕๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสุเมธ กาญจนสุธา)
พชง.๗ รักษาการแทน ผ.ป.บ.กฟส.กจ.

(นายธีระศักดิ์ เทืองขจร)
ตำแหน่ง ผ.จก.(๑๑) กฟส.กจ.
14 พ.ย. 2567

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟท.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ 1 พิดเคอร์ TMA02 จาก ไลน์แยกสะพานแม่กลอง ถึง DDE 1แยกสะพานแม่กลอง
ในวันที่ 18 พ.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1734/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิดเคอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่
พนักงานศูนย์ฯ นาย พิชัยกร โพธิ์พันธ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายวิรัชสันท์ เจนสกุลมงคล

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผ.จก. กฟส.กจ., กฟส.ทวม.

อก.บ.ช.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

(นายพิชญนันท์ พริราสุวรรณจล)
จต.๕ แทน น.พ.คฟ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ 2 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผ.จก. (สถานี)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)


หน้า 1 จาก 2
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ไลน์แยกสะพานแม่กลอง (TMA02)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	18 พ.ย. 67	เวลา	09.00 น.	ถึง	12.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.กจ.	งานที่ทำ	เปลี่ยน HL Clamp เป็น PG และเชื่อม DDE		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1734/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย		นายพีรภัทร โพธิ์พันธุ์	วันที่	14 พฤศจิกายน 2567		
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่	14 พฤศจิกายน 2567		
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่	14 พฤศจิกายน 2567		
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจิรวัฒน์, นายวิวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโชน (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการ Switching						
2	TM-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
3	TM-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
4	TMA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA		-
5	TMA07R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทมจ.		R ไลน์ห้วยน้ำโจน
6	เมื่อพร้อมดับไฟ						
7	SW.Bypass R ติดตั้งใหม่	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กจ.		R แยกสะพานแม่กลอง
8	แจ้ง กฟส.กจ. ทำการไลน์โหลด ช่วง Recloser ติดตั้งใหม่ ถึงจุดตัด DDE แยกสะพานแม่กลอง ออกทั้ง 3 เฟส						
9	เมื่อ กฟส.กจ. ทำการไลน์โหลด ช่วง Recloser ติดตั้งใหม่ ถึงจุดตัด DDE แยกสะพานแม่กลอง ออกทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ						
10	แจ้งชุด Hotline ทำการเชื่อม DDE บริเวณแยกสะพานแม่กลอง เข้าทั้ง 3 เฟส						
11	เมื่อชุด Hotline ทำการเชื่อม DDE บริเวณแยกสะพานแม่กลอง เข้าทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ						
12	แจ้งชุด Hotline ทำการปลด DDE ไลน์แยกสะพานแม่กลอง ออกทั้ง 3 เฟส						
13	เมื่อชุด Hotline ทำการปลด DDE ไลน์แยกสะพานแม่กลอง ออกทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ						
14	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
15	หลังจากทำการ Test ไฟ พร้อมลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อย						
16	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้						
17	TM-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
18	TM-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
19	TMA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA		-
20	TMA07R-01	Nonreclosing, ALT	Normal, ALT		ทมจ.		R ไลน์ห้วยน้ำโจน
	**** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ****						
21	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมยืนยันข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อย						
22	TM-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
23	TM-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
24	TMA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA		-
25	TMA07R-01	Normal, ALT	Nonreclosing, ALT		ทมจ.		R ไลน์ห้วยน้ำโจน
26	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
27	แจ้งชุด Hotline ทำการเชื่อม DDE ไลน์แยกสะพานแม่กลอง เข้าทั้ง 3 เฟส						
28	เมื่อชุด Hotline ทำการเชื่อม DDE ไลน์แยกสะพานแม่กลอง เข้าทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ						
29	ย้ายโหลด TMA02 บางส่วน คืนจาก TMA07						
30	TMABVB-01	ปลด	สับ		TMA		- ขนานบัส
31	SW.Bypass R ติดตั้งใหม่	ปลด	สับ		กจ.		R แยกสะพานแม่กลอง

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
32	TMA07S-08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กจ.		DIS สุสานวังหีบ
33	TMABVB-01	สับ	ปลด		TMA		- ขนานบัส
34	TM-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
35	TM-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
36	TMA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA		- -
37	TMA07R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทมจ.		R ไลน์ห้วยน้ำโจน
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							

TMA02

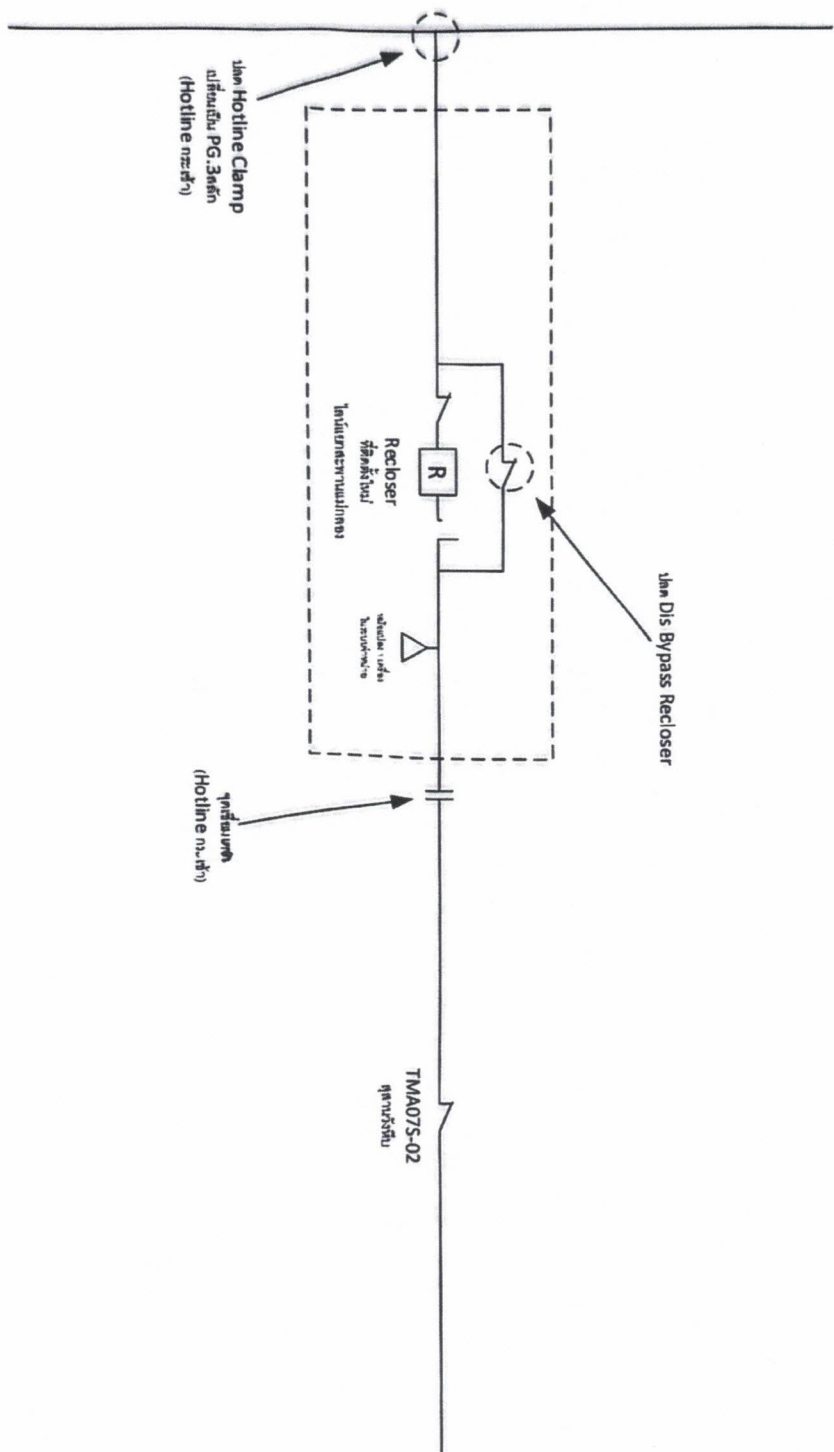

Hotline Clamp
u/fuadu PG. 3akn
(Hotline n.z.f?)

Hot Dis Bypass Recloser

Recloser
R
u/fuadu PG. 3akn
(Hotline n.z.f?)

Hotline
(Hotline n.z.f?)

TMA02S-02
q/n.z.f?u
