



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

20 พ.ย. 67

เลขที่ ก.๓.๗ปจ.(ก.๗)-๑๒๕๖/๒๕๖๗  
ชื่อผู้รับ นายพิพัฒน์ พิชิตสุวรรณผล  
ชื่อผู้ส่ง นายวีรพจน์ เรืองเดชอังกูร

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗  
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ท.ภ.บ.รักษาการแทน ผ.จก.กฟส.ศรีประจันต์

ด้วย กฟส.ศรีประจันต์ จะขอตัดไฟตัดเคอร์ ๕ สถานีศรีประจันต์บางส่วนเพื่อทำงานปฎิเสกพาดสายงานปรับปรุงระจำหน่ายได้แนวสายส่ง ช่วงที่ ๓ ตั้งแต่บริเวณ สามแยกไฟแดงศรีประจันต์ ถึง ป้อมตำรวจทางหลวงศรีประจันต์ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SPCo๕	๒๔ พ.ย. ๒๕๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ทำงานปฎิเสกพาดสายได้แนวสายส่ง	สามแยกไฟแดง ศปจ. SPC5VB-01	ป้อมตำรวจทางหลวง ศปจ. - DDE ท.ภ.บ.ปจ. - SPC15-06 - DIS ต. รักษาการ ปจ.	นายวีรพจน์ เรืองเดช อังกูร โทร.๐๘๘๘๗๐๑๑๘

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หม้อแปลง กฟภ.๒ เครื่อง หม้อแปลงผู้ใช้ไฟ ๗ เครื่อง

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นางสาวสุพิชชา วรรณคาม ตำแหน่ง ว.ค.๕ ผ.ก.บ.กฟส.อ.ศรีประจันต์ โทร. ๐๘๗๙-๘๙๑๖๑๘๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผ.ค.ส.ก.ร.ส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓.  พิกัดพื้นที่ดับไฟ ๓.๑ เริ่มต้น ๑๔.๖๒๑๒๐๖,๑๐๐.๑๔๖๘๒๒

๓.๒ สิ้นสุด ๑๔.๖๓๔๑๐๒,๑๐๐.๑๕๑๔๕๖

(นายวีรพจน์ เรืองเดชอังกูร.)

ตำแหน่ง ท.ภ.บ.รักษาการแทน ผ.จก.กฟส.ศรีประจันต์

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผ.ค.ฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผ.ค.ฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเคอร์ SPC5 จาก SPC5VB-01 ถึง

ในวันที่ ๒๔ พ.ย. ๖๗ ตั้งแต่เวลา ๘.๓๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1741/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ... ฟีดเคอร์... จาก... ถึง

ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่...

พนักงานศูนย์ฯ นาย วัฒนวิทย์ สุ่มศรีโพธิ์แก้ว ประสานงานการขอตัดไฟกับ ท.ภ.บ.รักษาการแทน ผ.จก.กฟส.ศรีประจันต์

(นายวัฒนวิทย์ สุ่มศรีโพธิ์แก้ว)  
ก.ค.๖ ปฏิบัติงาน ผ.ค.ฟ.

-DDE ท.ภ.บ.ปจ.  
- SPC15-06  
- DIS ต. รักษาการ ปจ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. คฟค. สท , กฟผ. ดปอ.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

ขั้นตอนการสวิชชิง 3 ผ่าน

แผนผังแนบ 1 ผ่าน

ผจพ. - (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม


ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง


1. สถานที่ทำงาน	สามแยกไฟแดงศรีประจันต์ (SPC05)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	24 พ.ย. 67	ระหว่าง	08.30 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ศปจ.	งานที่ทำ	ปักเสาพาดสาย ตามใบขอปฏิบัติงาน 1741/67
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวัฒนา สามศรีโพธิ์แก้ว		วันที่ 18 พฤศจิกายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 18 พฤศจิกายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 18 พฤศจิกายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพีรภัทร, น.ส.สุภัชชา, นายชุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิศ, นายมโนช, นายวรรณพงษ์ 3. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC		
3	SPC03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC	-	LOAD = 2.5 MW
4	SPC05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC	-	LOAD = 3.4 MW
5	SP-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
6	SPA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA	-	LOAD = 4.2 MW
7	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		
8	DOA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA	-	
9	- ย้ายโหลด SPC01 กลับจาก DOA03						
10	ตรวจสอบ SPC01S-01 DIS Pothead อยู่สถานะ "สับอยู่"						
11	SPC01VB-01	ปลด	สับคง OFF AutoReclose		SPC	-	-
12	DOA03S-03	สับ	ปลด		ดจ.	SF6	สะพานตาแล
13	- ย้ายโหลด SPC05 บางส่วนไปจ่ายจาก SPC01						
14	SPC01S-05	ปลด	สับ		ศปจ.	DIS	อูมิชัย
15	SPC01S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ศปจ.	SF6	ห้าแยกบ้านกว้าง
16	- ย้ายโหลด SPC05 บางส่วนไปจ่ายจาก SPC03						
17	SPC03S-07	ปลด	สับ		ศปจ.	SCADA SF6	โรงสีท่าใหญ่
18	SPC05S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ศปจ.	SF6	ตรงข้าม บ.ธนทรัพย์สมบัติ
19	- ย้ายโหลด SPC05 ที่เหลือ ไปจ่ายจาก SPA04						
20	SPA04S-11	ปลด	สับ		ศปจ.	SCADA SF6	ป.รุ่งเรือง
21	SPC05VB-01	สับ	ปลด		SPC	CB	
22	SPC05S-01	สับ	ปลด		ศปจ.	DIS	Pothead F.5
23	พร้อมดับไฟ เวลา 08.30 น.						
24	DIS ชค. SPC05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ศปจ.	DIS	สะพานลอยสามแยก ศปจ.
25	แจ้งผู้ควบคุมงานทำการไลน์โหลดตั้งแต่จุดตัด DDE บริเวณตรงข้ามบ้ม ปตท. ท่าใหญ่ ถึง SPC05S-03						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	เมื่อผู้ควบคุมงานทำการไลนโหดตั้งแต่จุดตัด DDE บริเวณตรงข้ามบ้มน ปตท. ทำใหญ่ ถึง SPC05S-03 แล้วเสร็จ						
27	แจ้งผู้ควบคุมงานทำการปลด DDE บริเวณตรงข้ามบ้มน ปตท. ทำใหญ่ โดยวิธีฮอทไลน์แบบมีไฟได้						
28	เมื่อผู้ควบคุมงานทำการปลด DDE บริเวณตรงข้ามบ้มน ปตท. ทำใหญ่ โดยวิธีฮอทไลน์แบบมีไฟ แล้วเสร็จ						
29	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
30	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
31	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
32	แจ้งลงข้อมูลใน We Safe ก่อนปฏิบัติงาน						
33	แจ้งหน่วยงานปฏิบัติงานได้						
34	SPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPC		
35	SPC01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		-
36	SPC03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		-
37	SP-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
38	SPA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
39	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		
40	DOA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		-
%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%							
41	เมื่อหน่วยงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
42	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC		
43	SPC01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		-
44	SPC03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		-
45	SP-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
46	SPA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-
47	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		
48	DOA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		-
49	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1						
50	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2						
51	เมื่อผู้ควบคุมงานยืนยันพร้อมจ่ายไฟ						
52	แจ้งผู้ควบคุมงานทำการเชื่อม DDE บริเวณตรงข้ามบ้มน ปตท. ทำใหญ่ โดยวิธีฮอทไลน์แบบมีไฟได้						
53	เมื่อผู้ควบคุมงานทำการเชื่อม DDE บริเวณตรงข้ามบ้มน ปตท. ทำใหญ่ โดยวิธีฮอทไลน์แบบมีไฟ แล้วเสร็จ						
54	DIS ชด. SPC05	ปลด	สับ		ศปจ.		DIS สะพานลอยสามแยก ศปจ.
55	- ย้ายโหด SPC05 กลับจาก SPA04						
56	SPC05S-01	ปลด	สับ		ศปจ.		DIS Pothead F.5
57	SPC05VB-01	ปลด	สับคง OFF AutoReclose		SPC		CB
58	SPA04S-11	สับ	ปลด		ศปจ.	SCADA	ป.รุ่งเรือง

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
59	- ย้ายโหลด SPC05 กลับจาก SPC03						
60	SPC05S-03	ปลด, ล็อกคาน	สับ		ศปจ.		SF6 ตรงข้าม บ.ธนทรัพย์สมบัติ
61	SPC03S-07	สับ	ปลด		ศปจ.	SCADA	SF6 โรงสีทำใหญ่
62	- ย้ายโหลด SPC05 กลับจาก SPC01						
63	SPC01S-06	ปลด, ล็อกคาน	สับ		ศปจ.		SF6 ทำแยกบ้านกว้าง
64	SPC01S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ศปจ.		DIS อู่มิชัย
65	- ย้ายโหลด SPC01 ไปจ่ายไฟจาก DOA03 (ลดโหลดหม้อแปลง)						
66	DOA03S-03	ปลด	สับ		ดจ.		SF6 สะพานตาแล
67	SPC01VB-01	สับ	ปลด		SPC		- -
68	SPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPC		
69	SPC03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		-
70	SPC05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		-
71	SP-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
72	SPA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
73	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		
74	DOA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		-
%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%							

**แผนงานดับไฟปิกเสาพาดสายงานปรับปรุงระจำหน่วยได้แนวสายส่ง ช่วงที่ 3**  
**ตั้งแต่บริเวณ ป้อมตำรวจทางหลวงศรีประจันต์ ถึง สามแยกไฟแดงศรีประจันต์**

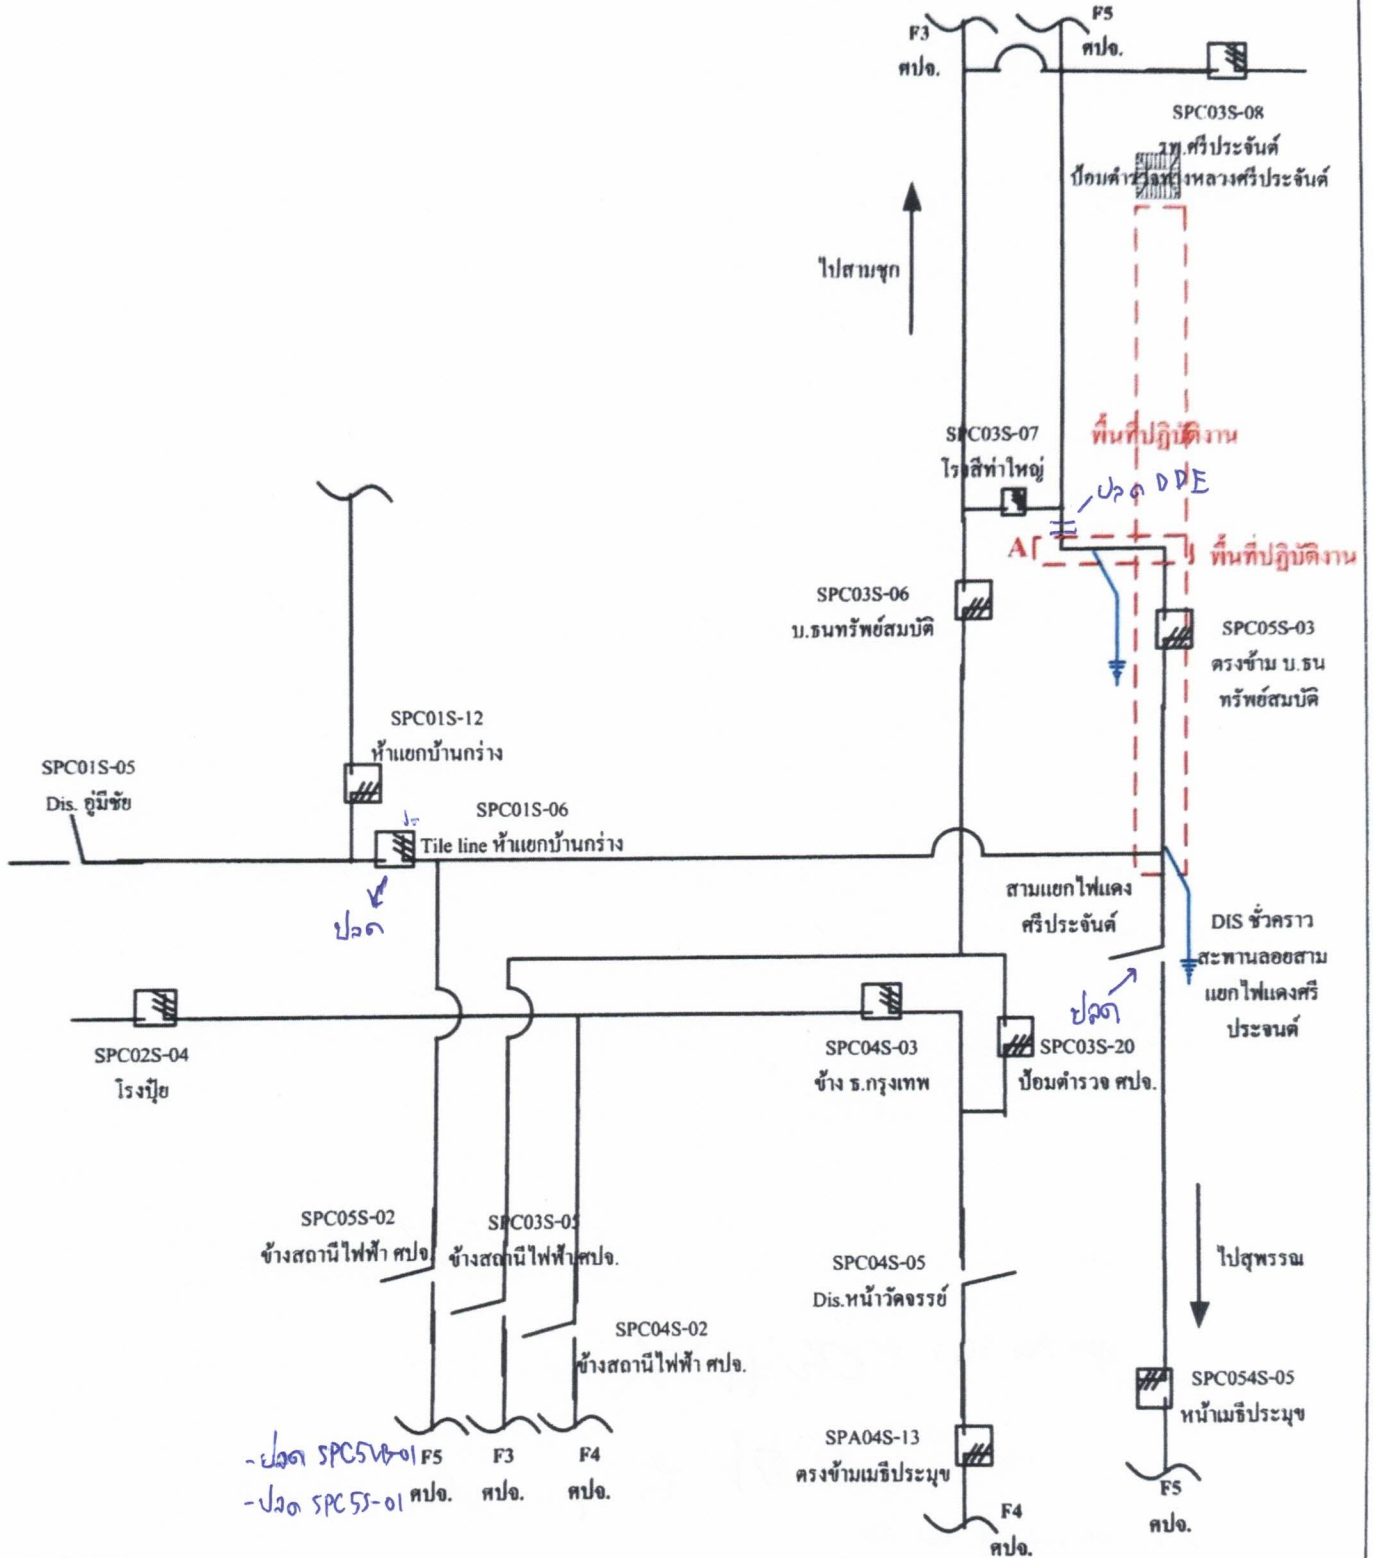

**หมายเหตุ**

ดับไฟปิกเสาพาดสายงานปรับปรุงระจำหน่วยได้แนวสายส่ง ช่วงที่ 3 ตั้งแต่บริเวณ ป้อมตำรวจทางหลวงศรีประจันต์ ถึง สามแยกไฟแดงศรีประจันต์

1. วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 17.00 น.
2. พื้นที่ดับไฟตั้งแต่สามแยกไฟแดงศรีประจันต์ถึงป้อมตำรวจทางหลวงศรีประจันต์
3. Hotline ปลดไลน์ข้ามหน้าบีม ปตท.ท่าใหญ่ เพื่อทำการลดระดับสายตรงจุด A ตัดเคดตรงจุด A
4. พิกัดพื้นที่ดับไฟ เริ่มต้น 14.621206,100.146822 ถึง 14.634102,100.151456
