



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

1 ธ.ค. 66

เลขที่ ก.๓...../๒๕๖๖ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
 ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ ทวีธาสุวรรณผล ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)
 ชื่อผู้ส่ง นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอักษรเดชา ตำแหน่ง ร.จ.ด.(ท.) กฟภ.สพ.

ด้วยการไฟฟ้าสุพรรณบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขหัวเสาแรงสูงรองรับงานก่อสร้างอาคารสร้างใหม่ของ
 สถานีตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรีตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	๒ สท.๑	๐๒/๑๒/๖๖	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	แก้ไขหัวเสาแรงสูงหลังสถานี ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี	Disชั่วคราวหลัง ไฟฟ้า	DDE ช่างอัยการ	โทร.๐๖๑-๔๙๑๗๑๓๔ นายธีรภัทร์ คอกทุก

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธนากร สุวรรณประทีป ตำแหน่ง พ.ท.๖ (ส.๖) โทร. ๐๘๑-๔๙๒๐๒๖๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.ส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอักษรเดชา.....)

ตำแหน่ง ร.จ.ด.(ท.) กฟภ.สพ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเคอร์ SPA02 จาก DDE ช่างอัยการ ถึง DIS ชค. หลังไฟฟ้า

ในวันที่ ๒ ธ.ค. ๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1753/2566

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเคอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ นาย ธีรวัฒน์ แก้วศรีนิล ประสานงานการขอตัดไฟกับ พชช.น.ร. สุวรรณประทีป

23 พ.ย. 66

(นายธีรวัฒน์ แก้วศรีนิล)

ว.ค.๕ ๒๖๓๖ ๒๕.๑๗.

ขั้นตอนการสวิชชิง ๒ แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผคฟ. (สถานี) -

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ป.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ. ๓

อ.ก.บ.ช.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา ๕.๓๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	Dis ชั่วคราวหลังไฟฟ้า - DDE ช้างอัยการ						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	2 ธ.ค. 66	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00	น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ.สพ.	งานที่ทำ	แก้ไขหัวเสา	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1753/66		
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายจิรวัดน์ แก้วสมนึก			วันที่	29 พฤศจิกายน 2566		
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	29 พฤศจิกายน 2566		
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	29 พฤศจิกายน 2566		
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจิรวัดน์, นายพิชชา, นายวีรวิษฐ์, นายอมร 2. นายนครินทร์, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิศ, นายวรรณพงษ์, นายมนโอช						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	SPA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		- Load 2.7 MW
3	SPA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		- Load 2.2 MW
4	ย้ายโหลด SPA02 บางส่วนไปรับไฟจาก SPA04						
5	SPA02S-17	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6 แยกไฟแดงสะพานลอยโพธิ์พระยา
6	Dis ชค. SPA02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS หลังไฟฟ้า สุพรรณบุรี
7	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.00 น.						
8	แจ้ง กฟจ.สพ.ทำการไลนโหลด DIS ชค.หลังไฟฟ้า สุพรรณบุรี - DDE ช้างอัยการ (มีหม้อแปลงอยู่ 2 เครื่อง)						
9	เมื่อ กฟจ.สพ.ทำการไลนโหลด DIS ชค.หลังไฟฟ้า สุพรรณบุรี - DDE ช้างอัยการ (มีหม้อแปลงอยู่ 2 เครื่อง)แล้วเสร็จ						
10	แจ้ง HL ทำการตัด DDE ออก บริเวณข้างอัยการ						
11	เมื่อ HL ทำการตัด DDE ออกแล้วเสร็จ						
12	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟจ.สพ.ทราบ						
13	แจ้ง กฟจ.สพ. Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G1						
14	แจ้ง กฟจ.สพ. Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G2						
15	เมื่อ กฟจ.สพ. Test ไฟและ Short Ground ทุกจุด พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
16	SPA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
17	SPA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
18	แจ้ง กฟจ.สพ.ปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
19	เมื่อ กฟจ.สพ.แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหลดกลับ						
20	SPA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-
21	SPA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-
22	แจ้ง กฟจ.สพ.ปลด Short Ground จุด G1						
23	แจ้ง กฟจ.สพ.ปลด Short Ground จุด G2						
24	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
25	แจ้ง HL ทำการเชื่อม DDE เข้า บริเวณข้างอัยการ						
26	เมื่อ HL ทำการเชื่อม DDE เข้าแล้วเสร็จ						
27	แจ้ง กฟจ.สพ.ทำการเอาโหลด DIS ชค.หลังไฟฟ้า สุพรรณบุรี - DDE ช้างอัยการเข้าได้(มีหม้อแปลงอยู่ 2 เครื่อง)						
28	เมื่อ กฟจ.สพ.ทำการเอาโหลด DIS ชค.หลังไฟฟ้า สุพรรณบุรี - DDE ช้างอัยการเข้าได้(มีหม้อแปลงอยู่ 2 เครื่อง)แล้วเสร็จ						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
29	ย้ายโหลด SPA02 บางส่วนไปรับไฟจาก SPA04							
30	Dis ชด. SPA02	ปลด	ล๊اب		สพ.		DIS	หลังไฟฟ้า สุพรรณบุรี
31	SPA02S-17	ล๊اب	ปลด		สพ.	SCADA	SF6	แยกไฟแดงสะพานลอยโพธิ์พระยา
32	SPA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-	-
33	SPA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-	-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด								



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผ.บ.กฟจ.สพ.

เลขที่ ก.๓ สพ.(ปบ.)-

เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟจ.สพ./รจก.กฟจ.สพ.


ถึง ผจก.กฟจ.สพ.

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ด้วยในวันที่...๒...เดือน...ธันวาคม...พ.ศ. ...๒๕๖๖... ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. กฟจ.สุพรรณบุรี มีแผนงานดับไฟฟ้าบริเวณ ...สถานีตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี...เพื่อ...แก้ไขหัวเสาแรงสูงรองรับงานก่อสร้างอาคารสร้างใหม่ของสถานีตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี...โดยมีรายละเอียดที่ขอปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

พีดเดอร์ ..๒.. สถานีฯ ...สุพรรณบุรี๑... ตั้งแต่บริเวณ ..หลังกฟจ.สพ.-สถานีตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี...

กฟจ.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้นายธีรภัทร์ ดอกพุด ชง.ผ.บ.กฟจ.สพ. เบอร์โทรศัพท์ ...๐๖๑-๔๔๑๗๑๓๔.. เป็นผู้ควบคุมงานและให้..นายธนัช มาลัยวงศ์ ..ตำแหน่ง หน.บ.กฟจ.สพ..เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ..๐๘๖-๖๑๕๕๑๖๕..เป็นผู้ประสานงานการดับไฟเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด

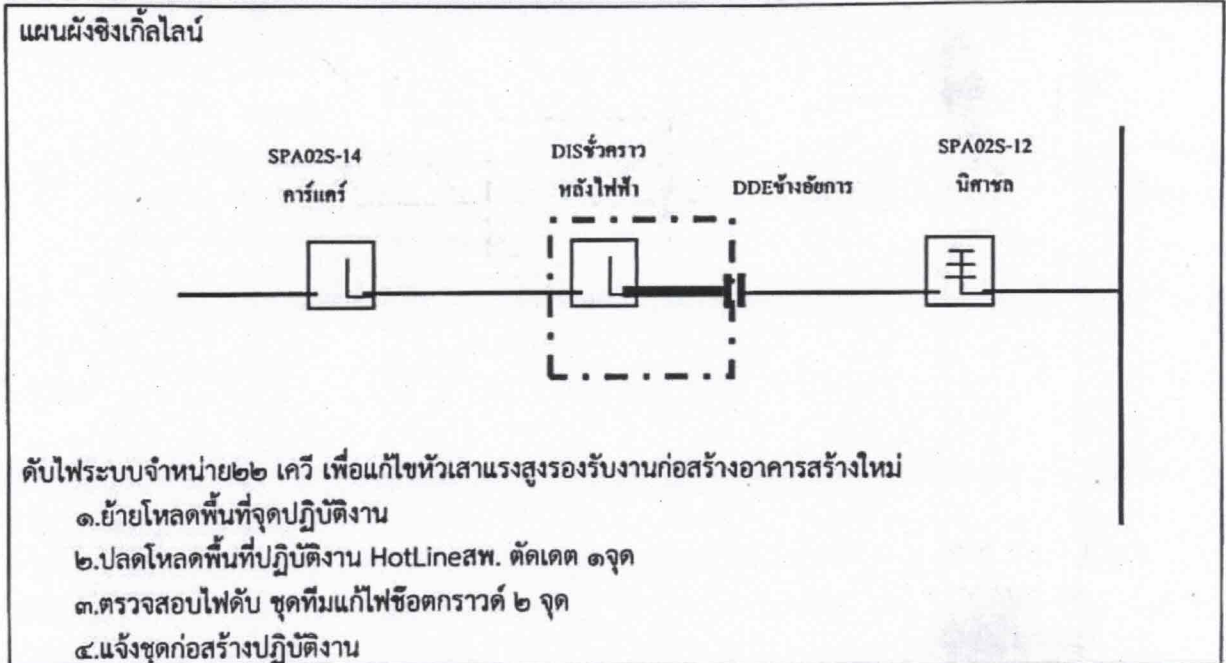

ดับไฟระบบจำหน่าย ๒๒ เควี เพื่อแก้ไขหัวเสาแรงสูงรองรับงานก่อสร้างอาคารสร้างใหม่

- ๑.ย้ายโหลดพื้นที่จุดปฏิบัติงาน
- ๒.ปลดโหลดพื้นที่ปฏิบัติงาน HotLineสพ. ตัดเขต ๑จุด
- ๓.ตรวจสอบไฟดับ ชุดทีมแก้ไขข้อดกราวด์ ๒ จุด
- ๔.แจ้งชุดก่อสร้างปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย

อนุมัติ

(นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอัคระเดชา)
รองผู้จัดการปฏิบัติงานแทนผู้จัดการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรี

ผ.กฟจ.

(นายธนาคาร สุวรรณประทีป)
พง.๖(สข.) ผ.บ.กฟจ.สพ.

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา

โทร. ๐๓๕-๕๓๕๑๖๗-๘ , ๑๔๘๕๕ , ๑๔๘๖๐
