



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.ลญ.(กป.)- ๖๕๐ /๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตวาสุวรรณ์ชล
ชื่อผู้ส่ง นายสันติ โรจนธรรมเจริญ

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ลาดหญ้า

ด้วย...กฟส.ลาดหญ้า...จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน...ปรับปรุงระบบจำหน่าย... ตามแผนผังสังเขปแนบ
จำนวน...๓...แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SVA๐๑	๒๒ พ.ย.๖๖	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ตัดไฟฉุกเฉินถนนเสาแรงสูง เนื่องจากดินสไลด์และตัด ต้นไม้ที่ระบบจำหน่ายแรงสูง /บริเวณบ้านหนองเป็ด	SVA๑S-๐๕ สามแยกท่า กระดาน	สุดระบบ จำหน่าย	นายจักรพันธ์ พรหมศรี จันทร์ ๐๙๖-๐๐๓-๙๙๖๖

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายจักรพันธ์ พรหมศรีจันทร์ ตำแหน่ง ช.ผ.กป. เบอร์โทร ๐๙๖-๐๐๓-๙๙๖๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสันติ โรจนธรรมเจริญ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ลาดหญ้า

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ SVA01 จาก SVA1S-0S ถึง ปลายสาย สอ๒๖๖/จับนำ
ในวันที่ ๒๒ พ.ย. ๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1753/67

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1753/67

พนักงานศูนย์ฯ นาย อภิชาติ วัฒนคุณ ประสานงานการขอตัดไฟกับ พย.จักรพันธ์ พรหมศรีจันทร์

อภิชาติ วัฒนคุณ
ผย.อภิชาติ วัฒนคุณ
(๐๐๑.๕ กก.บ.บ.ว.๐๑.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟส.ลญ., กฟส.ทวน, กฟส.๑๖.

อก.บช.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ 1 แผ่น
แผนผังแนบ 3 แผ่น

ผจพ. - (สถานี)
-

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)


ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

หน้าที 1 จาก 1
ใบสั่งทำสวิตชิง


1. สถานที่ทำงาน	บริเวณบ้านหนองเป็ด (SVA01)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	22 พ.ย. 67	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	16.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ลญ.	งานที่ทำ	ถอนเสาแรงสูงและตัดต้นไม้			ตามใบขอปฏิบัติงาน 1753/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศุภสวัสดิ์ เทียงผดุง					วันที่ 18 พฤศจิกายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย						วันที่ 18 พฤศจิกายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย						วันที่ 18 พฤศจิกายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร 2. นายนครินทร์,น.ส.พิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ 3. นายพีรภัทร,น.ส.สุกัษชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการ Switching						
2	SVA01R-01	Normal	Nonreclosing		ทรน.	R	เขาดับเต่า
3	เมื่อพร้อมดับไฟ						
4	SVA01S-05	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		ทรน.	SF6	สามแยกท่ากระดาน
5	D/F SVA01	สับ	ปลด		ศว.	D/F	ไลน์แยกเข้าอำเภอศรีสวัสดิ์
6	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานทราบ						
7	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G1						
8	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G2						
9	หลังจากผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground ครบทุกจุด พร้อมลงรายละเอียดใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
10	SVA01R-01	Nonreclosing	Normal		ทรน.	R	เขาดับเต่า
11	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ปฏิบัติงานได้						
	***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก *****						
12	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
13	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการปลด Short Ground จุด G1						
14	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการปลด Short Ground จุด G2						
15	หลังจากทำการปลด Short Ground ออก ครบทุกจุด พร้อมยืนยันลงรายละเอียดใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
16	SVA01R-01	Normal	Nonreclosing		ทรน.	R	เขาดับเต่า
17	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
18	D/F SVA01	ปลด	สับ		ศว.	D/F	ไลน์แยกเข้าอำเภอศรีสวัสดิ์
19	SVA01S-05	ปลด	สับ		ทรน.	SF6	สามแยกท่ากระดาน
20	SVA01R-01	Nonreclosing	Normal		ทรน.	R	เขาดับเต่า
	***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****						


สถานะการจ่ายไฟก่อนปฏิบัติงาน

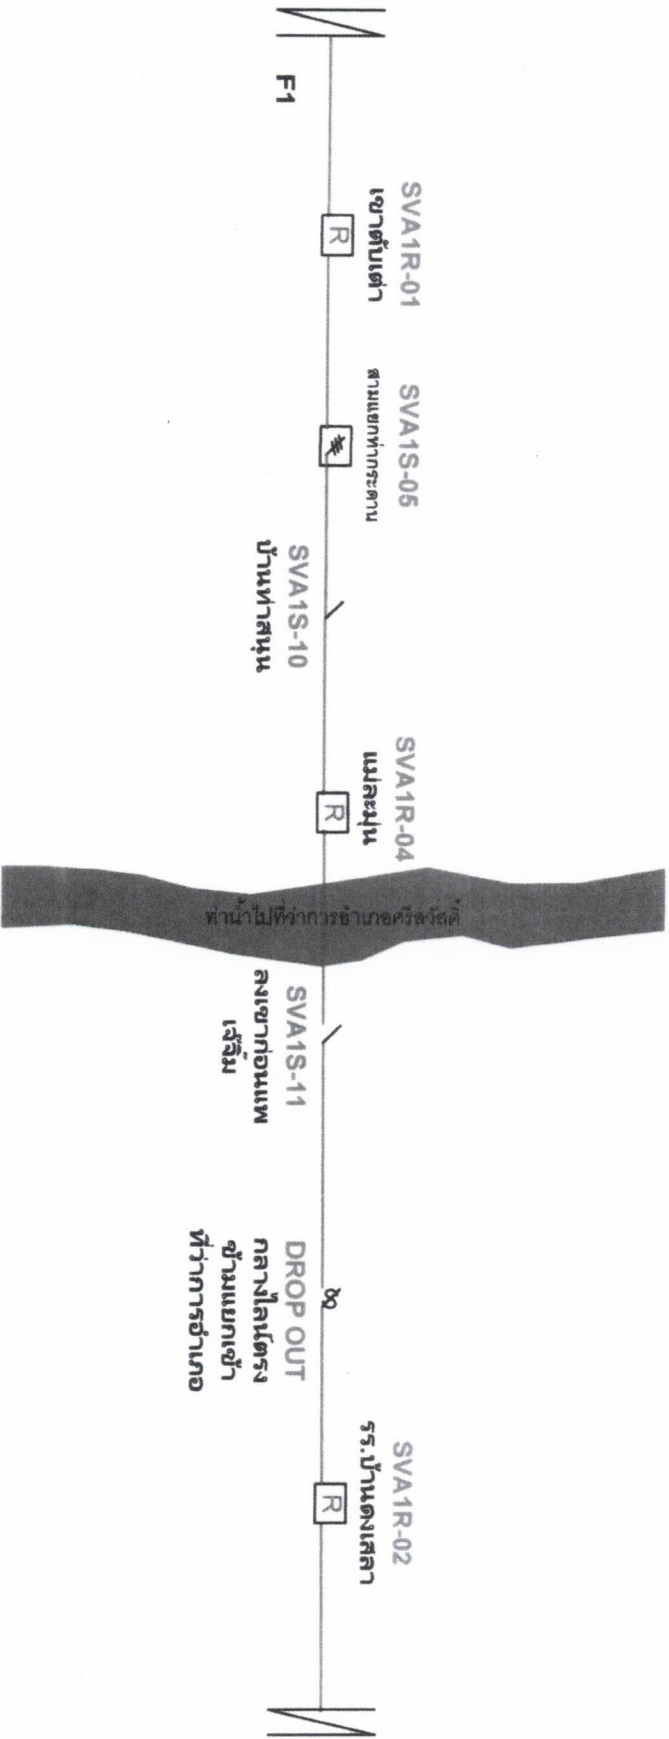

สถานะการจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน



จุดแก้ไข: ตอนเตาเบงสูงเนื่องจากคิลินเตสได้
และตัดคัตไปกับระบบจ่ายไฟเบงสูง/
บริเวณบ้านของเปิด

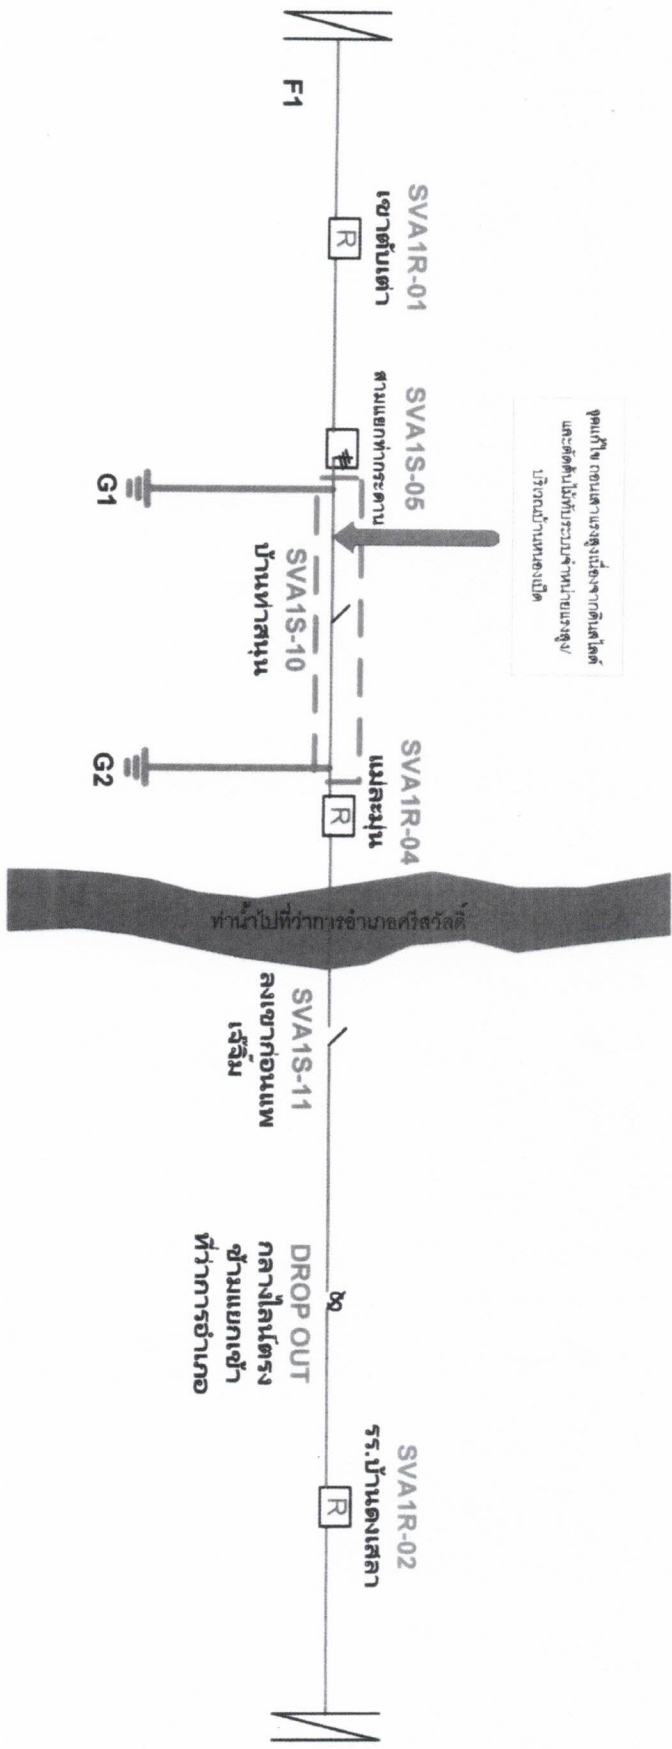

สถานะการจ่ายไฟหลังปฏิบัติการ

