



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.นฐ.(ปน.) 90๕๘ / ๒๕๖๖
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชวล
ชื่อผู้ส่ง นายสมชาย ศรีจารุพฤษ์

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ตำแหน่ง อ.ก.ปน.(ก.๓)

ตำแหน่ง ร.จก(ท) กฟจ.นครปฐม

ด้วยการไฟฟ้า กฟจ.นครปฐม จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย สถานีไฟฟ้า นครปฐม๓ ตามแผนผังสั่งเซปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	NPV10	16 ธันวาคม 2566	8.00 น.	17.00 น.	ปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณหน้า ๘. ธกส.- ๗.7	NPV10S-03 โรงสี ๗.7	NPV10S-04 รพ.นฐ NPT3S-07ปากช. เล็งเค็ง(ข้าง AIA)	นายชินวัตร เกียรติขจร กำจ่าย

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)...ช.ข้าง รพ. , ปากซอยคุณปู่-จินตามอเตอร์

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายชัยยศ โพธิ์ริชต์ ตำแหน่ง ข.ผ.ป.กฟจ.นครปฐม โทร ๐๘๔-๖๖๕๕๔๓๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. / ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมชาย ศรีจารุพฤษ์)

ตำแหน่ง ร.จก(ท) กฟจ.นครปฐม.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ปน.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ | ฟีดเดอร์ NPV10 จาก NPV10S-03 โรงสี 7 ถึง NPV10S-04 รพ.นฐ

ในวันที่ 16 ธ.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1759/66

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย วิธนา สุวรรณโพธิ์แก้ว ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายชัยยศ โพธิ์ริชต์

4 ธ.ค. 66

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ปน.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ. ๕

อก.บช.(ก.๓), อก.รว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายวิธนา สุวรรณโพธิ์แก้ว)

อส.ก. 5 พท.ช. ๒๕.คฟ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง ๒ แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจฟ. (สถานี -)



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

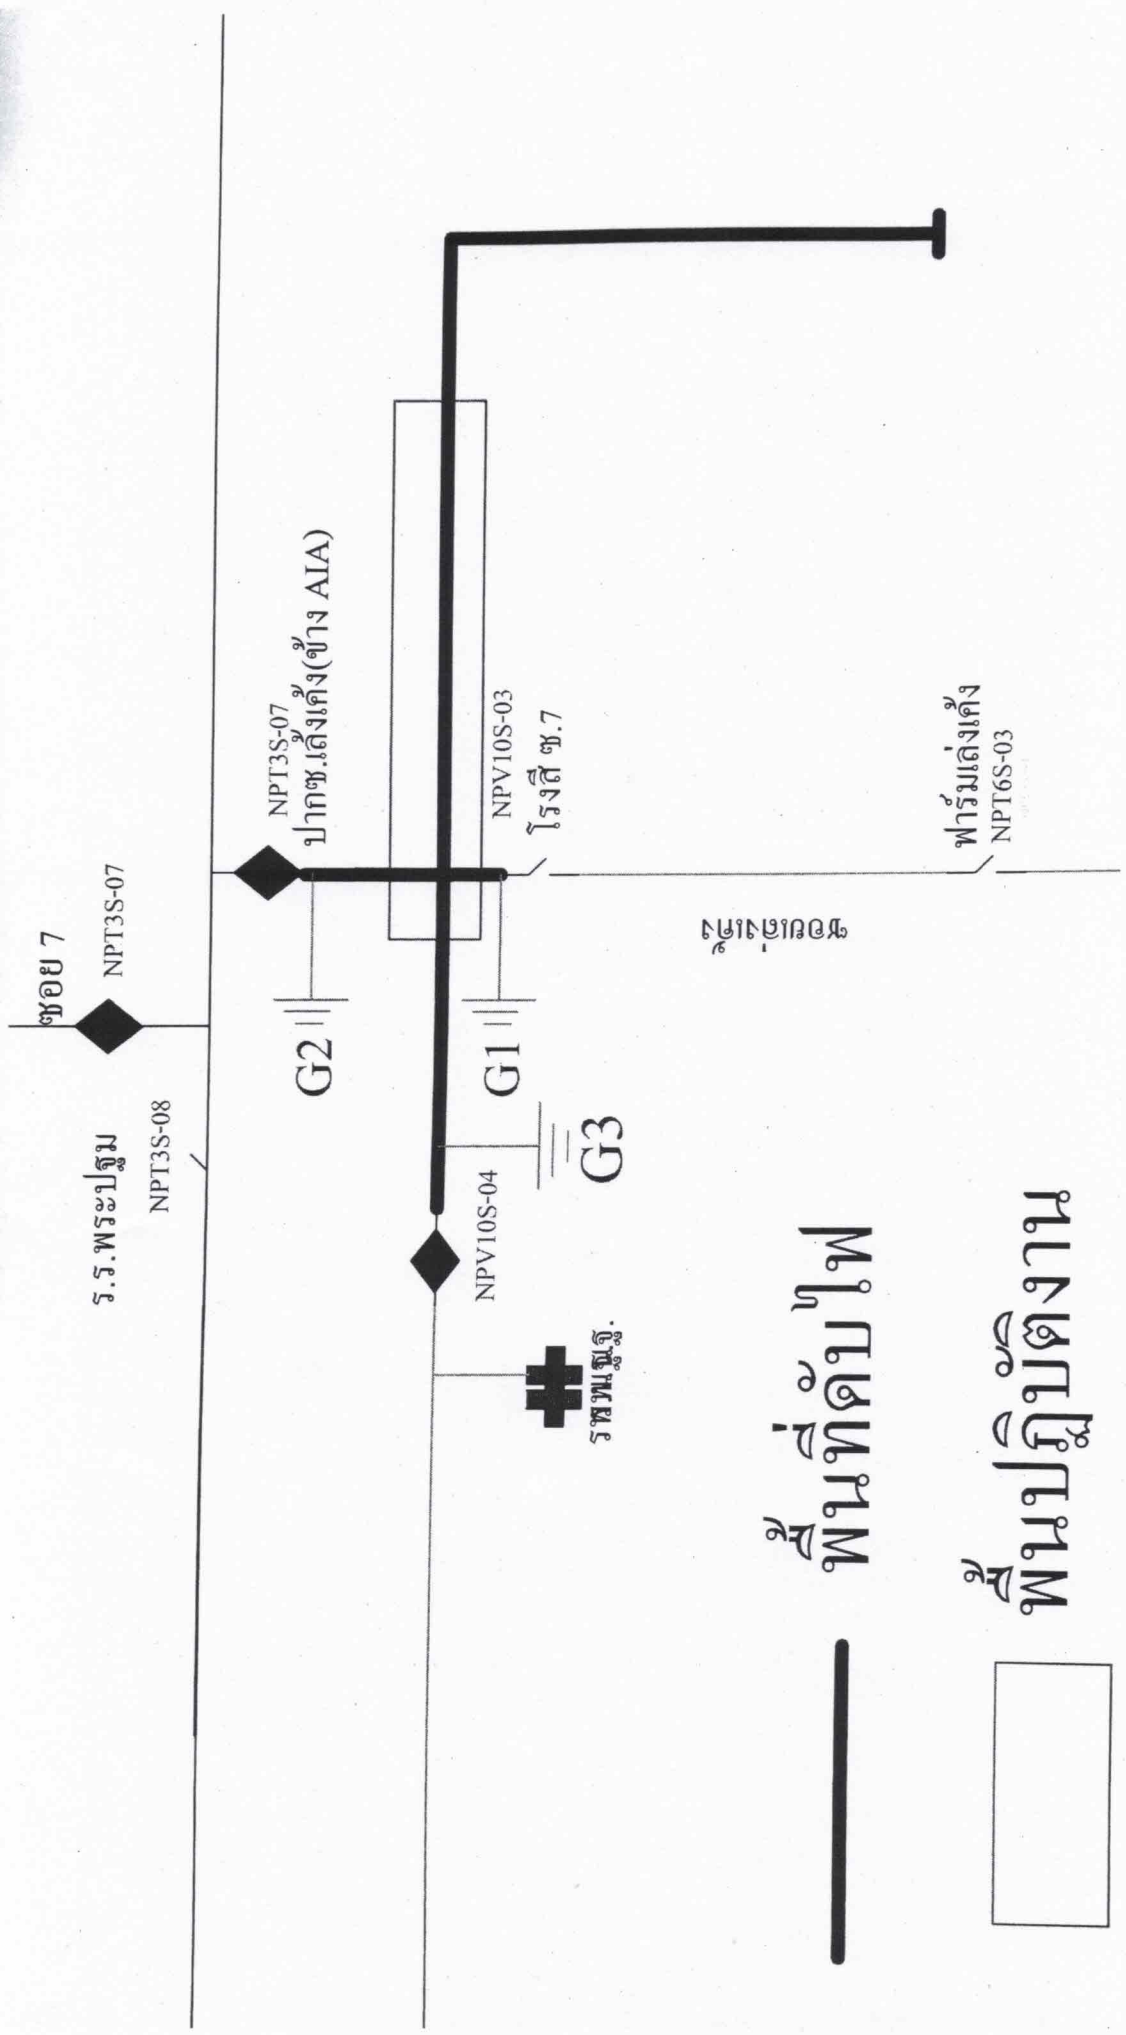
ร.ก.ปน.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปน.(ก3)

หน้า 1 จาก 2
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณหน้า ๕. ๕๖ส. - ๕.7						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	16 ธ.ค. 66	ระหว่าง	08.00	น.	ถึง	17.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ.นธ.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย			ตามใบขอปฏิบัติงาน	1759/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวัฒนา สามศรีโพธิ์แก้ว				วันที่	4 ธันวาคม 2566	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	4 ธันวาคม 2566	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	4 ธันวาคม 2566	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิศ, นายมนอช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	NPV06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		Load = 5.6 MW
3	NPV10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		Load = 4.7 MW
4	ย้ายโหลด NPV10 บางส่วน ไปรับไฟจาก NPV06						
5	NPV06S-03	ปลด	สับ		นธ	SCADA	SF6 ข้าง BIG C
6	NPV10S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นธ	SCADA	SF6 รพ.ศูนย์นครปฐม
7	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.00 น.						
8	NPV10S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นธ		DIS โรงสีชอย 7
9	ตรวจสอบ NPT03S-07 (SF6 ปาก ช.เล็งเค็ง) อยู่สถานะ "ปลด + ล็อคคาน"						
10	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ กฟจ.นธ. รับทราบ						
11	แจ้ง กฟจ.นธ. Test ไฟพร้อม Short Ground จุด G1						
12	แจ้ง กฟจ.นธ. Test ไฟพร้อม Short Ground จุด G2						
13	แจ้ง กฟจ.นธ. Test ไฟพร้อม Short Ground จุด G3						
14	แจ้ง กฟจ.นธ. ลงรายละเอียด We Safe ให้เรียบร้อยก่อนปฏิบัติงาน						
15	แจ้ง กฟจ.นธ. ปฏิบัติงานได้						
16	NPV06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		
17	NPV10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		
<u>สิ้นสุด Switching (ช่วงเช้า)</u>							
18	เมื่อ กฟจ.นธ. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
19	NPV06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		
20	NPV10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		
21	แจ้ง กฟจ.นธ. ปลด Short Ground จุด G1						
22	แจ้ง กฟจ.นธ. ปลด Short Ground จุด G2						
23	แจ้ง กฟจ.นธ. ปลด Short Ground จุด G3						
24	NPV10S-03	ปลด	สับ		นธ		DIS โรงสีชอย 7

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
25	ย้ายโหลด NPV10 บางส่วน กลับจาก NPV06							
26	NPV10S-04	ปลด, ล็อคคาน	สับ		นฐ	SCADA	SF6	รพ. ศูนย์นครปฐม
27	NPV06S-03	สับ	ปลด		นฐ	SCADA	SF6	ข้าง BIG C
28	NPV06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV			
29	NPV10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV			
<u>สิ้นสุด Switching ทั้งหมด</u>								



เส้นทึบ ไฟ

เส้นปฏิบัติงาน

จุดต่อกราวด์

