



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

REGULATED ELECTRICITY SUPPLY

เลขที่ ก.๓ นฐ(ปบ) ๑๓๖๔ /๒๕๖๕

ชื่อผู้รับ นายพีรณันท์ พิชราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายสมชาย ศรีจารุพฤกษ์

วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง รจก(ท) กฟจ.นครปฐม

ด้วยการไฟฟ้า กฟจ.นครปฐม จะขอตัดไฟฉุกเฉินเพื่อปฏิบัติงาน แก้ไขข้อร้องเรียนย้ายเสาออกจากที่ สถานีไฟฟ้า นครปฐม ๒ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	NPU07	5 พฤศจิกายน 2565	09.00 น.	16.00 น.	ย้ายเสาแรงสูงออกจาก ที่ เพื่อแก้ไขข้อ ร้องเรียน บริเวณ ม.7 หนองงูเหลือม	Dis ชค. แท่งน้ำ	DDE	นายพรมแดน สุทธิงาม ทผ.ปบ.

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ... ม.7 หนองงูเหลือม

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายพรมแดน สุทธิงาม ตำแหน่ง ทผ.ปบ.กฟจ.นครปฐม โทร ๐๖๕-๔๑๘๒๔๒๘

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟท. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. / ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมชาย ศรีจารุพฤกษ์)

ตำแหน่ง รจก(ท) กฟจ.นครปฐม

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟท.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พีดเตอร์ NPU07 จาก Dis จากแท่งน้ำ ถึง DDE 16.00 น.

ในวันที่ ๕ พ.ย. ๖๕ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1760/65

 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พีดเตอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พีดเตอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พีดเตอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อดิสรณ์ ธีระพงษ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายพรมแดน สุทธิงาม

(นายอดิสรณ์ ธีระพงษ์)
๒๐๑.4 มม ๔๖๐๗.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กมล.อภ.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th




(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ขั้นตอนการสวิซชิง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจพ. (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน บริเวณ ม.7 หนองงูเหลือม (NPU07)
2. กำหนดวันที่ทำงาน 5 พ.ย. 65 ระหว่าง 09.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟจ.นฐ. งานที่ทำ ย้ายเสาแรงสูงเพื่อแก้ไขข้อร้องเรียน NPU07 ตามใบขอปฏิบัติงาน 1760/2565
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายสถาพร,นายพิชชา,นายสุธี,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายนครินทร์,นายณัฐภาณุจัน,นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมิโนช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	NPU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU		TP1 -
3	NPU-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU		TP2 -
4	NPU02R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		นฐ.	SCADA	R หนองงูเหลือม
5	NPU07R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		นฐ.		R โรงสีทัพหลวง
6	- ย้ายโหลด NPU07 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก NPU02						
7	NPUVBV-01	ปลด	สับ		NPU		CB ขนานบัส
8	NPU02S-09	ปลด	สับ		นฐ.		DIS รร.หนองงูเหลือม
9	DIS ชค. NPU07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ.		DIS แท่งน้ำ
10	NPUVBV-01	สับ	ปลด		NPU		CB ขนานบัส
11	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 09.00 น.						
12	แจ้งสถานะจ่ายไฟให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
13	แจ้ง กฟจ.นฐ. ทำการไลน์โหลดตรวจจร NPU07 บริเวณจุดตัด DDE ก่อนประตุน้ำคลองชลฯ						
14	เมื่อ กฟจ.นฐ. แจ้งทำการไลน์โหลดตรวจจร NPU07 บริเวณจุดตัด DDE ก่อนประตุน้ำคลองชลฯ แล้วเสร็จ						
15	แจ้ง กฟจ.นฐ. ให้ชุดฮอทไลน์ทำการตัด DDE วงจร NPU07 บริเวณก่อนประตุน้ำคลองชลฯ (ตามผังแนบ) โดยวิธีฮอทไลน์แบบมีไฟได้						
16	เมื่อ กฟจ.นฐ. แจ้งชุดฮอทไลน์ทำการตัด DDE วงจร NPU07 บริเวณก่อนประตุน้ำคลองชลฯ แล้วเสร็จ						
17	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
18	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
19	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
20	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe						
21	NPU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU		TP1 -
22	NPU-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU		TP2 -
23	NPU02R-02	Nonreclosing	Normal		นฐ.	SCADA	R หนองงูเหลือม
24	NPU07R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		นฐ.		R โรงสีทัพหลวง
25	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย						
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
27	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1						
28	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2						
29	NPU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU		TP1 -
30	NPU-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU		TP2 -
31	NPU02R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		นฐ.	SCADA	R หนองงูเห่าล้อม
32	NPU07R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		นฐ.		R โรงสีทัพหลวง
33	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
34	แจ้ง กฟจ.นฐ. ให้ชุดฮอทไลน์ทำการเชื่อม DDE วงจร NPU07 บริเวณก่อนประตูน้ำคลองชลฯ (ตามผังแนบ) โดยวิธีฮอทไลน์แบบมีไฟได้						
35	เมื่อ กฟจ.นฐ. แจ้งชุดฮอทไลน์ทำการเชื่อม DDE วงจร NPU07 บริเวณก่อนประตูน้ำคลองชลฯ แล้วเสร็จ						
36	แจ้ง กฟจ.นฐ. ทำการนำโหดวงจร NPU07 บริเวณจุดตัด DDE ก่อนประตูน้ำคลองชลฯ เข้า						
37	เมื่อ กฟจ.นฐ. แจ้งทำการนำโหดวงจร NPU07 บริเวณจุดตัด DDE ก่อนประตูน้ำคลองชลฯ เข้าแล้วเสร็จ						
38	- ย้ายโหด NPU07 บางส่วนกลับจาก NPU02						
39	NPUBVB-01	ปลด	สับ		NPU		CB ขนานบัส
40	DIS ชค. NPU07	ปลด	สับ		นฐ.		DIS แท่งน้ำ
41	NPU02S-09	สับ	ปลด(ใช้โหดบัสเตอร์)		นฐ.		DIS รร.หนองงูเห่าล้อม
42	NPUBVB-01	สับ	ปลด		NPU		CB ขนานบัส
43	NPU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU		TP1 -
44	NPU-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU		TP2 -
45	NPU02R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		นฐ.	SCADA	R หนองงูเห่าล้อม
46	NPU07R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		นฐ.		R โรงสีทัพหลวง
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							

ร.ร.หนองหญ้าปล้อง
NPU2S-09

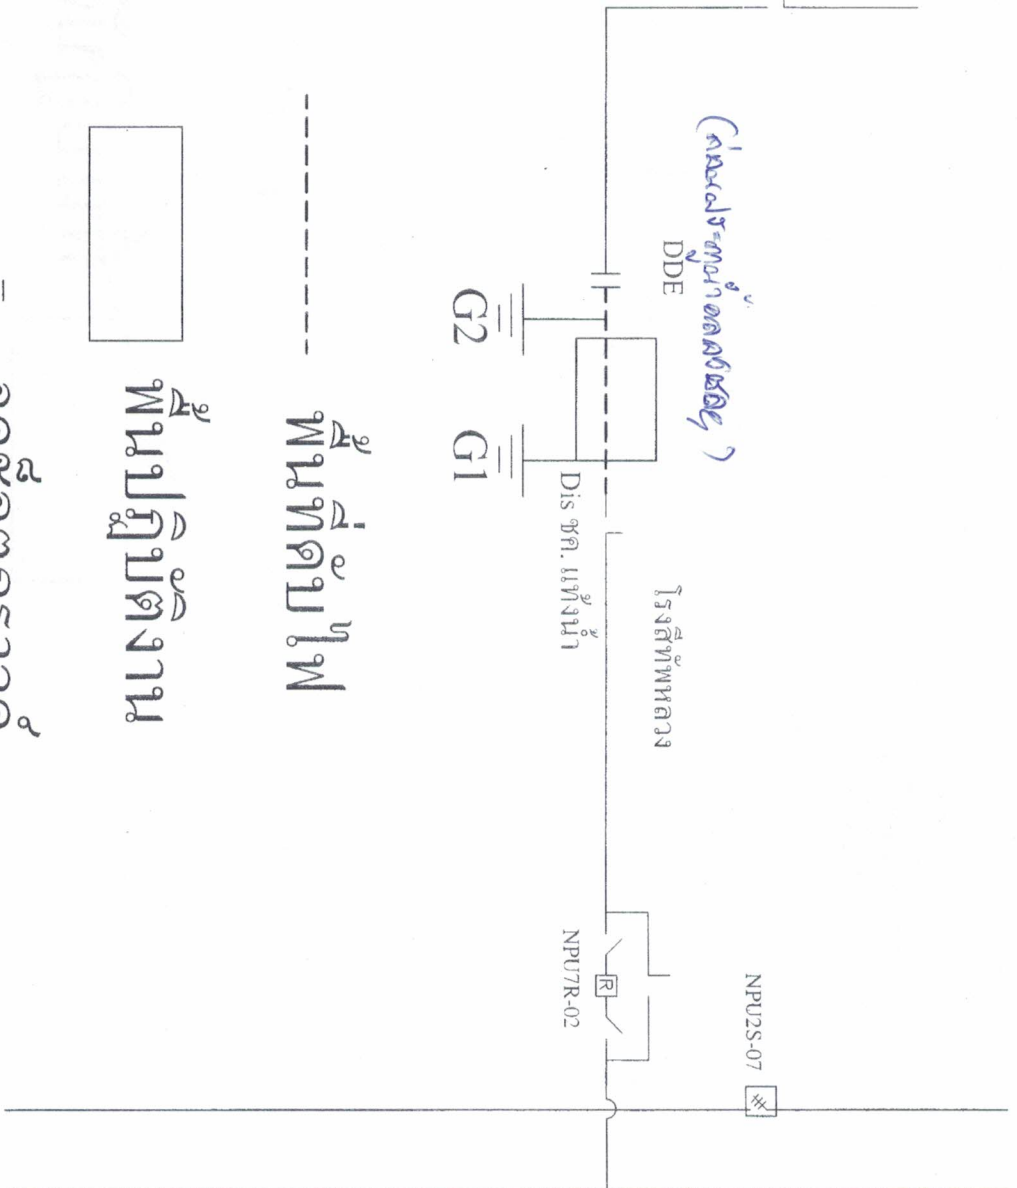

พื้นที่รับไฟ

พื้นที่ปฏิบัติงาน

จุดจอดรถราวด

