

วิญญูขอตัดไฟ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.สพร.(ปบ.)
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สິงโตทอง
ชื่อผู้ส่ง นายพิชา ตันยิตเส็ง

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ร.จก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กพอ.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ ย้ายแนวเสา เปลี่ยนสายแรงสูง๑๘๕SAC ก.สาย๗ ตามแผนผังสังเขป

แนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงาน/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SAC๑๐	๑๙ พ.ย.๖๕	๐๘.๓๐	๑๖.๓๐	-ย้ายแนวเสา เปลี่ยนสายแรงสูง๑๘๕SAC ก.สาย๗	SAC๑๐๕-๐๓	-Disชั่วคราวหน้า บ.เอสซีจี -จุดตัดDDEหน้า ม.The High	นายจักรกริช พุ่มวงศ์ ๐๘๓-๕๒๔๗๗๕
2	SAB04							

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ตั้ง ต.ม.The Privacy สาย๗ - ก่อนถึง บ.เอสซีจี

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายธวัชชัย วงศ์บุญมาก ตำแหน่ง ท.น.ป. โทร. ๐๘๙-๙๘๑๔๗๒

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ (นายพิชา ตันยิตเส็ง)
ร.จก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กพอ.สามพราน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเดอร์ SAC10 จาก Div. N. SEG ถึง SAC105-05
ในวันที่ 19 พ.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 1793/65
- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 2 พิดเดอร์ SAB4 จาก PDE.U The high ถึง SAC105-05
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่
- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเดอร์ จาก ถึง
- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเดอร์ จาก ถึง

พนักงานศูนย์ฯ นาย อนันต์ อรรถประสิทธิ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย ศิวชัย ปรังษณ

(นายอนันต์ อรรถประสิทธิ์)
๐๖๓. 6 ๓๓๓ ๓๓. ๓.



สำหรับผู้อนุมัติ
ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟผ. สุว.
อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

ชั้นตอนการสวิตชิง 3 แผ่น
แผนผังแนบ L แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจฟ. (สถานี)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ใบสั่งทำสวิตชิง


1. สถานที่ทำงาน ไลน์ SAC10,SAB04 บริเวณ DIS.ชค.บ. SCG - DDE.หน้าหมู่บ้าน The High ,SAC10S-03 DIS.ช.คลาสเดย์
2. กำหนดวันที่ทำงาน 19 พ.ย. 65 ระหว่าง 08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟอ.สพร. งานที่ทำ ย้ายแนวเสาและเปลี่ยนขนาดสาย ตามใบขอปฏิบัติงาน 1793/65
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมนโอ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายสถาพร,นายพิชชา,นายสุธี,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายนครินทร์,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
2	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC		
3	SAC10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		
4	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯกทม.		
5	SA2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯกทม.		
6	SAB04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		
7	SAB09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		
8	- ย้ายโหลด SAC10 ไปจ่ายจาก SAB09						
9	SAC10S-05	ปลด	สับ		รถสพร-		SF6 ตรงข้ามทักซิคอนกรีต
10	SAB0BVB-03	ปลด	สับ		SAB		CB 22 kV.ชานาเมนบัส
11	SAB09S-10	ปลด	สับ		รถสพร-		DIS ศาลพ่อแก่
12	SAC10S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถสพร-		DIS ขอยคลาสเดย์
13	OYLOBVB-01	สับ	ปลด		OYL		CB 22 kV.ชานาเมนบัส
14	SAC10S-05	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		รถสพร-		SF6 ตรงข้ามทักซิคอนกรีต
15	- ดับไฟ SAC10,SAB04 เวลา 08.30 น.						
16	DIS.ชค.SAC10	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถสพร-		DIS บ. SCG
17	แจ้งกฟอ.สามพรานทำการปลดโหลดออกทั้งหมดก่อนทำการตัด DDE.						
18	แจ้ง Hot Line สามพรานทำการตัด DDE.ไลน์ SAB04 บริเวณหมู่บ้าน The High ออกทั้งสามเฟส (ดูตามผังแนบ)						
19	หลังจาก Hot Line สามพรานทำการตัด DDE.ไลน์ SAB04 บริเวณหมู่บ้าน The High ออกทั้งสามเฟสเสร็จเรียบร้อย						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
20	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กฟอ.สามพรานรับทราบ						
21	แจ้งกฟอ.สามพราน Test ไฟว่าดับเรียบร้อยก่อนทำการ Short Ground						
22	แจ้งกฟอ.สามพรานทำการ Short ground จุด G1						
23	แจ้งกฟอ.สามพรานทำการ Short ground จุด G2						
24	แจ้งกฟอ.สามพรานลงรายละเอียด We Safe ให้เรียบร้อย						
25	แจ้งกฟอ.สามพรานปฏิบัติงานได้ทุกชุด						
26	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC		
27	SAC10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		
28	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯกทม.		
29	SA2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯกทม.		
30	SAB04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		
31	SAB09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		
***** ลีนสุด Switching เข้า *****							
32	หลังจากกฟอ.สามพรานปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด						
33	แจ้งกฟอ.สามพรานทำการปลด Short ground จุด G1 ออก						
34	แจ้งกฟอ.สามพรานทำการปลด Short ground จุด G2 ออก						
35	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
36	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC		
37	SAC10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		
38	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯกทม.		
39	SA2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯกทม.		
40	SAB04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		
41	SAB09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		
42	- จ่ายไฟ SAC10,SAB04						
43	แจ้ง Hot Line สามพรานทำการจัม DDE.ไลน์ SAB04 บริเวณหน้าหมู่บ้าน The High เข้าทั้งสามเฟส						
44	หลังจาก Hot Line สามพรานทำการจัม DDE.ไลน์ SAB04 บริเวณหน้าหมู่บ้าน The High เข้าทั้งสามเฟสเสร็จเรียบร้อย						
45	แจ้งกฟอ.สามพรานจ่ายโหลดเข้าได้ทั้งหมด						
46	DIS.ชค.SAC10	ปลด	สับ		รถสปร-	DIS	บ.SCG
47	- ย้ายโหลด SAC10 กลับคืนจาก SAB09						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
48	SAC10S-05	ปลด	สับ		รถสพร-		SF6	ตรงข้ามทักษิณคอนกรีต
49	SAB0BVB-03	ปลด	สับ		SAB		CB	22 kV.ขนานเมนบัส
50	SAC10S-03	ปลด	สับ		รถสพร-		DIS	ชอยคลาสเดย์
51	SAB09S-10	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถสพร-		DIS	ศาลพ่อแก่
52	OYL0BVB-01	สับ	ปลด		OYL		CB	22 kV.ขนานเมนบัส
53	SAC10S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		รถสพร-		SF6	ตรงข้ามทักษิณคอนกรีต
54	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC			
55	SAC10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC			
56	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯกทม.			
57	SA2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯกทม.			
58	SAB04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB			
59	SAB09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB			
***** สิ้นสุด Switching *****								

งานดับไฟวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2565 ย้ายแนวเสา เปลี่ยนสายแรงสูง 185 SAC ถ.สาย 7

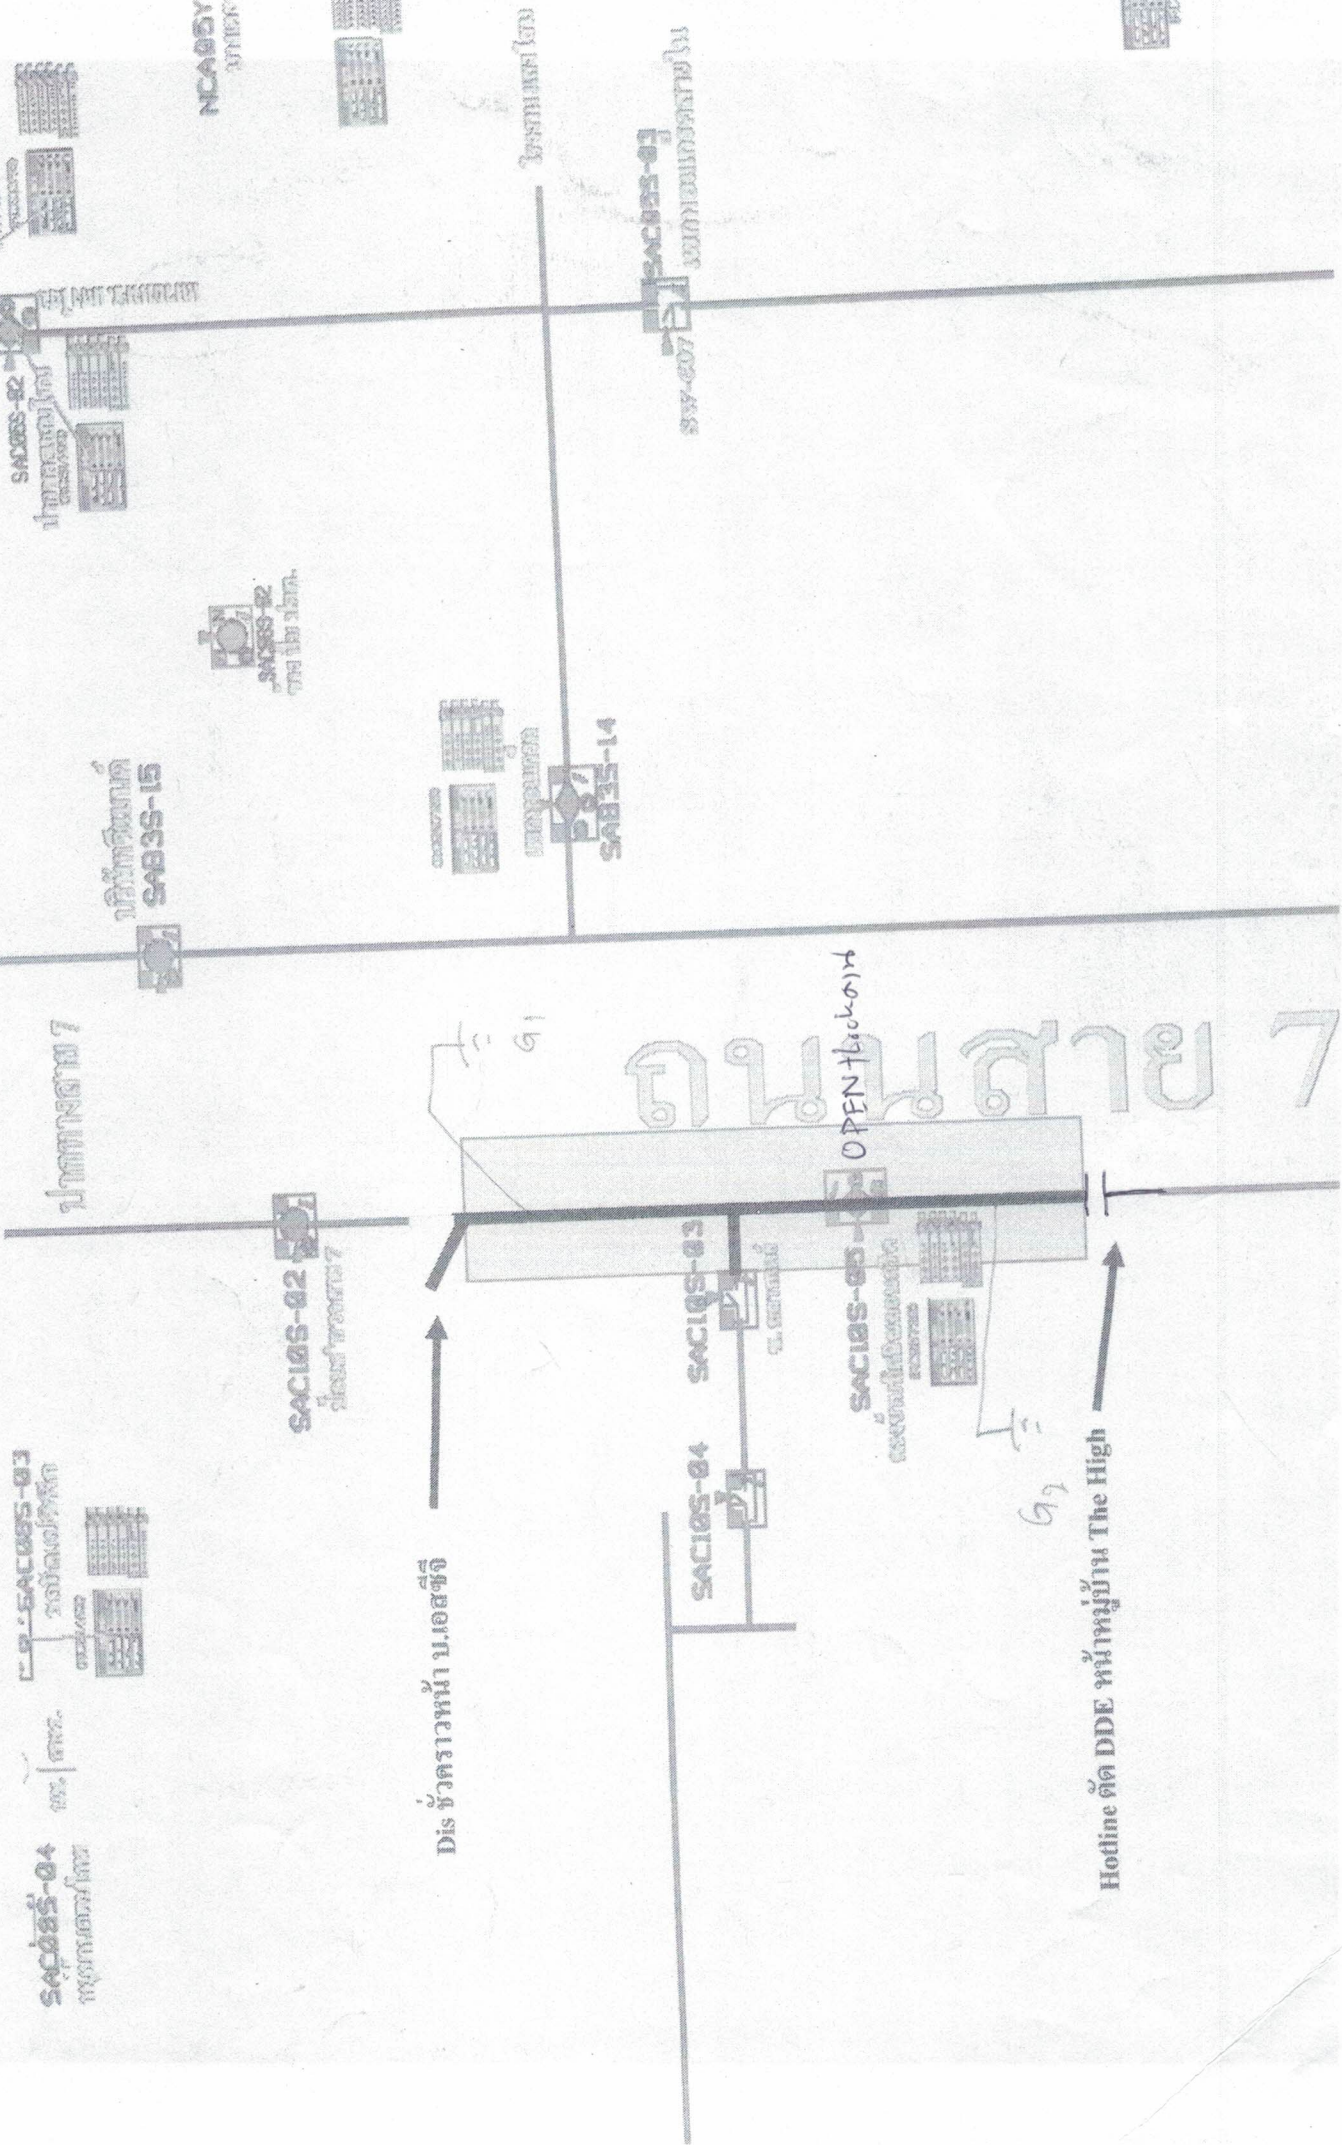

Dis ขั้วตรวจหน้า บ.เอสซีจี

Hotline ตัด DDE หน้าหมู่บ้าน The High

ถนนสาย 7
