



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓...../๒๕๖๗..... วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗  
 ชื่อผู้รับ นายทัศนันท์ พธิราสุวรรณผล..... ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)  
 ชื่อผู้ส่ง นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอัครเดชา..... ตำแหน่ง ร.จ.ด.(ท.) กฟส.สพ.

# Switching Deadline

03/12/67

ด้วยการไฟฟ้าสุพรรณบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อก่อสร้างซ่อมประตู้เฉลิมพระเกียรติหน้าทางเข้า ร.ร.กาญจนา ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน...๑...แผ่น ดังนี้

| ที่ | พิดเดอร์ | วัน/เดือน/ปี | ตั้งแต่เวลา | ถึงเวลา | ลักษณะงานที่ปฏิบัติบริเวณ                   | จาก                    | ถึง                   | ผู้ควบคุมงาน                          |
|-----|----------|--------------|-------------|---------|---|------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| ๑.  | ๖ สพ.    | ๔/๑๒/๖๗      | ๐๙.๐๐       | -       | ดับไฟเพื่อก่อสร้างซ่อมประตู้เฉลิมพระเกียรติ | Disชั่วคราว ร.ร.กาญจนา | DDEทางเข้า ร.ร.กาญจนา | โทร.๐๔๑-๗๓๘๗๖๑๗<br>นายอนุพันธ์ สาตเดร |
| ๒.  | ๖ สพ.    | ๒๒/๑๒/๖๗     | -           | ๑๗.๐๐   | หน้าทางเข้าโรงเรียนกาญจนา                   | Disชั่วคราวหนองตาลาบ   | DDE หนองตาลาบ         |                                       |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธนกร สุวรรณประทีป ตำแหน่ง พ.ช.๖ (สข.) โทร ๐๔๑-๔๓๒๐๒๖๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(.....นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอัครเดชา.....)

ตำแหน่ง.....ร.จ.ด.(ท.) กฟส.สพ.....

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓  
เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1-2 พิดเดอร์ SPA6 จาก DIS 55.กาญจนา ถึง DIS หนองตาลาบ DDE 55.กาญจนา DDE หนองตาลาบ

ในวันที่ 4-22 ๑๒ ๖7 ตั้งแต่เวลา 9.๐๐ น. ถึง 17.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1793/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พิดเดอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... อ.ก.บ.บ.บ. ประสานงานการขอตัดไฟกับ..... โทร.....

*(Signature)*  
 นายอนุพันธ์ สาตเดร  
 ร.จ.ด.(ท.) กฟส.สพ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(คฟ.)  
เรียน ผจก.....

อก.บ.ช.(ก.๓),..... อก.ว.ว.(ก.๓)  
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย


พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง.....แผ่น  
แผนผังแนบ.....แผ่น  
ผจก.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

*(Signature)*  
 (นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
 ร.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

หน้าที 1 จาก 2  
ใบสั่งทำสวิตซิ่ง

|                         |  |          |                             |        |                   |           |
|-------------------------|--|----------|-----------------------------|--------|-------------------|-----------|
| 1. สถานที่ทำงาน         | หน้าโรงเรียนกาญจนา (วงจร SPA06)  |          |                             |        |                   |           |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน     | 4-22 ธ.ค. 67   | เวลา     | 09.00 น.                    | ถึง    | 17.00 น.          |           |
| 3. ผู้ขอทำงาน           | กฟส.สพ.  | งานที่ทำ | ดับไฟเพื่อก่อสร้างซ่อมประตู |        | ตามใบขอปฏิบัติงาน | 1793/2567 |
| 4. เตรียมการสวิตซิ่งโดย | นายนครินทร์ อังสนาวดี  |          |                             | วันที่ | 28 พฤศจิกายน 2567 |           |
| 5. ตรวจสอบสวิตซิ่งโดย   |   |          |                             | วันที่ | 28 พฤศจิกายน 2567 |           |
| 6. อนุมัติสวิตซิ่งโดย   |  |          |                             | วันที่ | 28 พฤศจิกายน 2567 |           |
| 7. สั่งทำสวิตซิ่งโดย    | 1. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)<br>2. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)<br>3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายโมนช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |          |                             |        |                   |           |

| ที่                                | รหัสอุปกรณ์  | สภาพอุปกรณ์<br>ปกติก่อน<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ            | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ                |
|------------------------------------|--|--------------------------------------|----------------------|------|--------------|------------|-------------------------|
| 1                                  | ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตซิ่ง   |                                      |                      |      |              |            |                         |
| 2                                  | SP-KT1A  | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual        |      | EGAT         |            | - Load 28.8 MW          |
| 3                                  | SPA02VB-01   | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose   |      | SPA          |            | - Load 5.4 MW           |
| 4                                  | SP-KT2A  | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual        |      | EGAT         |            | - Load 17.5 MW          |
| 5                                  | SPA06VB-01   | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose   |      | SPA          |            | - Load 7.2 MW           |
| 6                                  | SPA06R-01  | Normal                               | Nonreclosing         |      | สพ.          |            | R ตรงข้าม รร.สทวิทย์    |
| 7                                  | SPA07VB-01   | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose   |      | SPA          |            | - Load 4.0 MW           |
| 8                                  | ย้ายโหลดวงจร SPA06 บางส่วนไปจ่ายไฟจากวงจร SPA07  |                                      |                      |      |              |            |                         |
| 9                                  | SF6 ชด. Tie SPA06-SPA07  | ปลด, ล็อคคาน                         | สับ                  |      | สพ.          |            | SF6 เลยขนส่งสุพรรณ      |
| 10                                 | DIS ชั่วคราว SPA06   | สับ                                  | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) |      | สพ.          |            | DIS ทนองตาลกบ           |
| 11                                 | ย้ายโหลดวงจร SPA06 บางส่วนไปจ่ายไฟจากวงจร SPA02  |                                      |                      |      |              |            |                         |
| 12                                 | SPABVB-01  | ปลด                                  | สับ                  |      | SPA          |            | - ขนานบัส               |
| 13                                 | SPA02S-16  | ปลด                                  | สับ                  |      | สพ.          |            | DIS เลียงเมืองสถานพินิจ |
| 14                                 | DIS ชั่วคราว SPA06   | สับ                                  | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) |      | สพ.          |            | DIS รร.กาญจนา           |
| 15                                 | SPABVB-01  | สับ                                  | ปลด                  |      | SPA          |            | - ขนานบัส               |
| 16                                 | เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน เวลา 09.00 น.   |                                      |                      |      |              |            |                         |
| 17                                 | แจ้ง ผู้ควบคุมงาน ปลด DDE จุด A ทางเข้า รร.กาญจนา ได้  |                                      |                      |      |              |            |                         |
| 18                                 | เมื่อ ผู้ควบคุมงาน แจ้ง ปลด DDE จุด A ทางเข้า รร.กาญจนา แล้วเสร็จ  |                                      |                      |      |              |            |                         |
| 19                                 | แจ้ง ผู้ควบคุมงาน ปลด DDE จุด B ทนองตาลกบ ได้  |                                      |                      |      |              |            |                         |
| 20                                 | เมื่อ ผู้ควบคุมงาน แจ้ง ปลด DDE จุด B ทนองตาลกบ แล้วเสร็จ  |                                      |                      |      |              |            |                         |
| 21                                 | แจ้งพื้นที่ไฟดับให้พนักงานรับทราบ  |                                      |                      |      |              |            |                         |
| 22                                 | เมื่อไฟฟ้าหน้างาน ทำการทดสอบ และช็อคกราวด์ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมให้ลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย |                                      |                      |      |              |            |                         |
| 23                                 | SP-KT1A  | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto          |      | EGAT         |            | -                       |
| 24                                 | SPA02VB-01   | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose    |      | SPA          |            | -                       |
| 25                                 | SP-KT2A  | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto          |      | EGAT         |            | -                       |
| 26                                 | SPA06VB-01   | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose    |      | SPA          |            | -                       |
| 27                                 | SPA06R-01  | Nonreclosing                         | Normal               |      | สพ.          |            | R                       |
| 28                                 | SPA07VB-01   | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose    |      | SPA          |            | -                       |
| 29                                 | แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้  |                                      |                      |      |              |            |                         |
| สิ้นสุด Switching วันที่ 4 ธ.ค. 67 |  |                                      |                      |      |              |            |                         |

| ที่                       | รหัสอุปกรณ์   | สภาพอุปกรณ์<br>ปกติก่อน<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ            | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ                |
|---------------------------|---|--------------------------------------|----------------------|------|--------------|------------|-------------------------|
| 30                        | เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ และยืนยันใน Wesafe วันที่ 22 ธ.ค. 67 |                                      |                      |      |              |            |                         |
| 31                        | ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิชชิง                                   |                                      |                      |      |              |            |                         |
| 32                        | SP-KT1A   | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual        |      | EGAT         |            | -                       |
| 33                        | SPA02VB-01  | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose   |      | SPA          |            | -                       |
| 34                        | SP-KT2A   | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual        |      | EGAT         |            | -                       |
| 35                        | SPA06VB-01  | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose   |      | SPA          |            | -                       |
| 36                        | SPA06R-01   | Normal                               | Nonreclosing         |      | สพ.          |            | R                       |
| 37                        | SPA07VB-01  | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose   |      | SPA          |            | -                       |
| 38                        | เมื่อพร้อมจ่ายไฟ  |                                      |                      |      |              |            |                         |
| 39                        | แจ้ง ผู้ควบคุมงาน จ้ม DDE จุด A ทางเข้า รร.กาญจนา ได้                             |                                      |                      |      |              |            |                         |
| 40                        | เมื่อ ผู้ควบคุมงาน แจ้ง จ้ม DDE จุด A ทางเข้า รร.กาญจนา แล้วเสร็จ                 |                                      |                      |      |              |            |                         |
| 41                        | แจ้ง ผู้ควบคุมงาน จ้ม DDE จุด B หนองตาลกาบ ได้                                    |                                      |                      |      |              |            |                         |
| 42                        | เมื่อ ผู้ควบคุมงาน แจ้ง จ้ม DDE จุด B หนองตาลกาบ แล้วเสร็จ                        |                                      |                      |      |              |            |                         |
| 43                        | ย้ายโหลดวงจร SPA06 บางส่วนกลับจากวงจร SPA07                                       |                                      |                      |      |              |            |                         |
| 44                        | DIS ชั่วคราว SPA06  | ปลด                                  | สับ                  |      | สพ.          |            | DIS หนองตาลกาบ          |
| 45                        | SF6 ชด. Tie SPA06-SPA07   | สับ                                  | ปลด, ล็อคคาน         |      | สพ.          |            | SF6 เลขขนส่งสุพรรณ      |
| 46                        | ย้ายโหลดวงจร SPA06 บางส่วนกลับจากวงจร SPA02                                       |                                      |                      |      |              |            |                         |
| 47                        | SPABVB-01   | ปลด                                  | สับ                  |      | SPA          |            | - ขนานบัส               |
| 48                        | DIS ชั่วคราว SPA06  | ปลด                                  | สับ                  |      | สพ.          |            | DIS รร.กาญจนา           |
| 49                        | SPA02S-16   | สับ                                  | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) |      | สพ.          |            | DIS เสียงเมืองสถานพินิจ |
| 50                        | SPABVB-01   | สับ                                  | ปลด                  |      | SPA          |            | - ขนานบัส               |
| 51                        | SP-KT1A   | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto          |      | EGAT         |            | -                       |
| 52                        | SPA02VB-01  | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose    |      | SPA          |            | -                       |
| 53                        | SP-KT2A   | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto          |      | EGAT         |            | -                       |
| 54                        | SPA06VB-01  | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose    |      | SPA          |            | -                       |
| 55                        | SPA06R-01   | Nonreclosing                         | Normal               |      | สพ.          |            | R                       |
| 56                        | SPA07VB-01  | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose    |      | SPA          |            | -                       |
| สิ้นสุด Switching ทั้งหมด |   |                                      |                      |      |              |            |                         |



### การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบ.กฟส.สพ.

ถึง ผจก.กฟส.สพ.

เลขที่ ก.๓ สพ.(ปบ.)-

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗


เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟส.สพ./รจก.(ท) กฟส.สพ.

ด้วยในวันที่.. ๔-๒๒ ธ.ค. ๖๗ ... ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. กฟจ.สุพรรณบุรี มีแผนงานดับไฟฟ้าบริเวณ ...  
หน้าทางเข้าโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ก่อสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ  
โดยมีรายละเอียดปิดเตอร์ที่ขอปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

ปิดเตอร์..๖..สถานี...สุพรรณบุรี ๑...ตั้งแต่บริเวณ.. หน้าทางเข้าโรงเรียนกาญจนาฯ ทั้ง๒ฝั่งถนน

กฟจ.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้...นายณฤพณ์ สาตเนร..พชง.๕ ผบ.กฟส.สพ. โทร..๐๙๑-๗๓๘๗๖๑๗..เป็นผู้  
ควบคุมงานและให้และให้นายพิบูล ปานขำ ตำแหน่ง ชม.ปบ.สพ.รักษาการ ทผ.ปบ.กฟส.สพ.โทร.. ๐๙๘-๒๗๕๓๖๔๐..  
เป็นผู้ประสานงานการดับไฟเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด

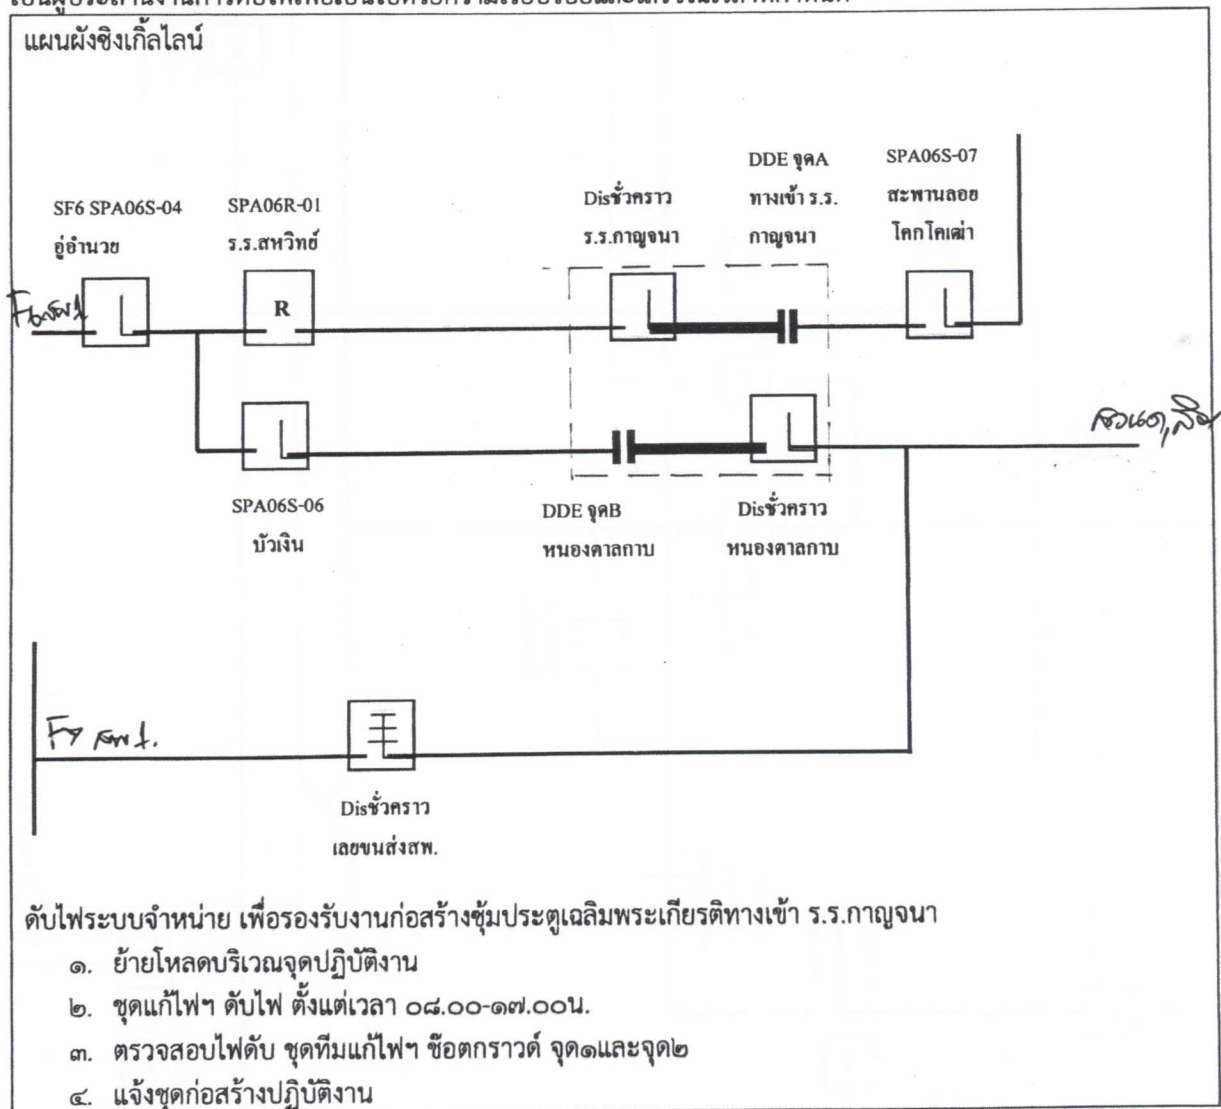

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย
