



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

29/11/67

เลขที่ ก.3.สข.(กป.) /2567
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชรสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายพุ่มขงค์ กาทหลง

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2567
ตำแหน่ง อ.ก.บ.น.(ก.3)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.สามชุก

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.อ.สามชุก จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย ฟีดเดอร์ สถานีไฟฟ้า
เดิมมาจ.ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	XCA 6	30 พ.ย. 2567	08.30 น.	17.00 น.	ดับไฟปักเสา	DIS ชั่วคราว หน้า ตู้ 1046ก	DIS ชั่วคราว สายส่ง E-GAT	นายณัฐพงษ์ เข้มเพ็ชร 085-5583046

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หม้อแปลง 3 เครื่อง 400 เควีเอ ผู้ใช้ไฟประมาณ 300 ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเทอดไทย จันทร์พินธุ์ ตำแหน่ง ผจก. โทร 086-7661012

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
- พิกัดพื้นที่ดับไฟ
 - 3.1 เริ่มต้น 14.721393, 100.125478
 - 3.2 สิ้นสุด 14.722727, 100.132771

(นายพุ่มขงค์ กาทหลง)
ผจก.กฟส.สามชุก

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3
เรียน อ.ก.บ.น.(ก.3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ XCA 6 จาก Dis. 1046ก ถึง Dis สายส่ง E-GAT
ในวันที่ 30 พ.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 1797/67
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่.....

ออกเอกสาร.....
พนักงานศูนย์ฯ นาย ร่วมพิธีทอ ประสานงานการขอตัดไฟกับ

(นาง จีวีจันท์ แก้วฉวีนิกร)
อ.ก.บ.5 แทน ผคฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กป.บ.(คฟ.)
เรียน ผจก.
..... อ.ก.บ.ช.(ก.3), อ.ก.ว.ว.(ก.3)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง..... แผ่น
แผนผังแนบ..... แผ่น
ผจก. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายพุ่มขงค์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.น.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บ้านอู่เอนก - สายส่ง EGAT		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	30 พ.ย. 67	ระหว่าง	08.30 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สช.	งานที่ทำ	ปักเสาแรงสูงในระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 1797/67
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายณัฐกาญจน์ ร่มโพธิ์ทอง		วันที่ 27 พฤศจิกายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 27 พฤศจิกายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 27 พฤศจิกายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจิรวุฒิน, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร 2. นายพีรภัทร, น.ส.สุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต 3. นายนครินทร์, น.ส.พิชยา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	XCA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		XCA		-
3	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.30 น.						
4	Dis ชค. XCA06	สับ	ปลด(ใช้โหดบัสเตอร์)		สามชุก		DIS หน้าอู่เอนก
5	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กฟส.พทน. ทราบ						
6	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด 1						
7	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด 2						
8	แจ้งกฟส.สามชุก.ลงข้อมูลใน WE SAFE ก่อนปฏิบัติงาน						
9	แจ้งกฟส.สามชุกปฏิบัติงานได้						
10	XCA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		XCA		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
11	หลังจากกฟส.สามชุกแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟกลับสภาพปกติ						
12	แจ้งชุดทำงานให้ทำการปลด Short ground จุด 1						
13	แจ้งชุดทำงานให้ทำการปลด Short ground จุด 2						
14	XCA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		XCA		-
15	Dis ชค. XCA06	ปลด	สับ		สามชุก		DIS หน้าอู่เอนก
16	XCA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		XCA		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

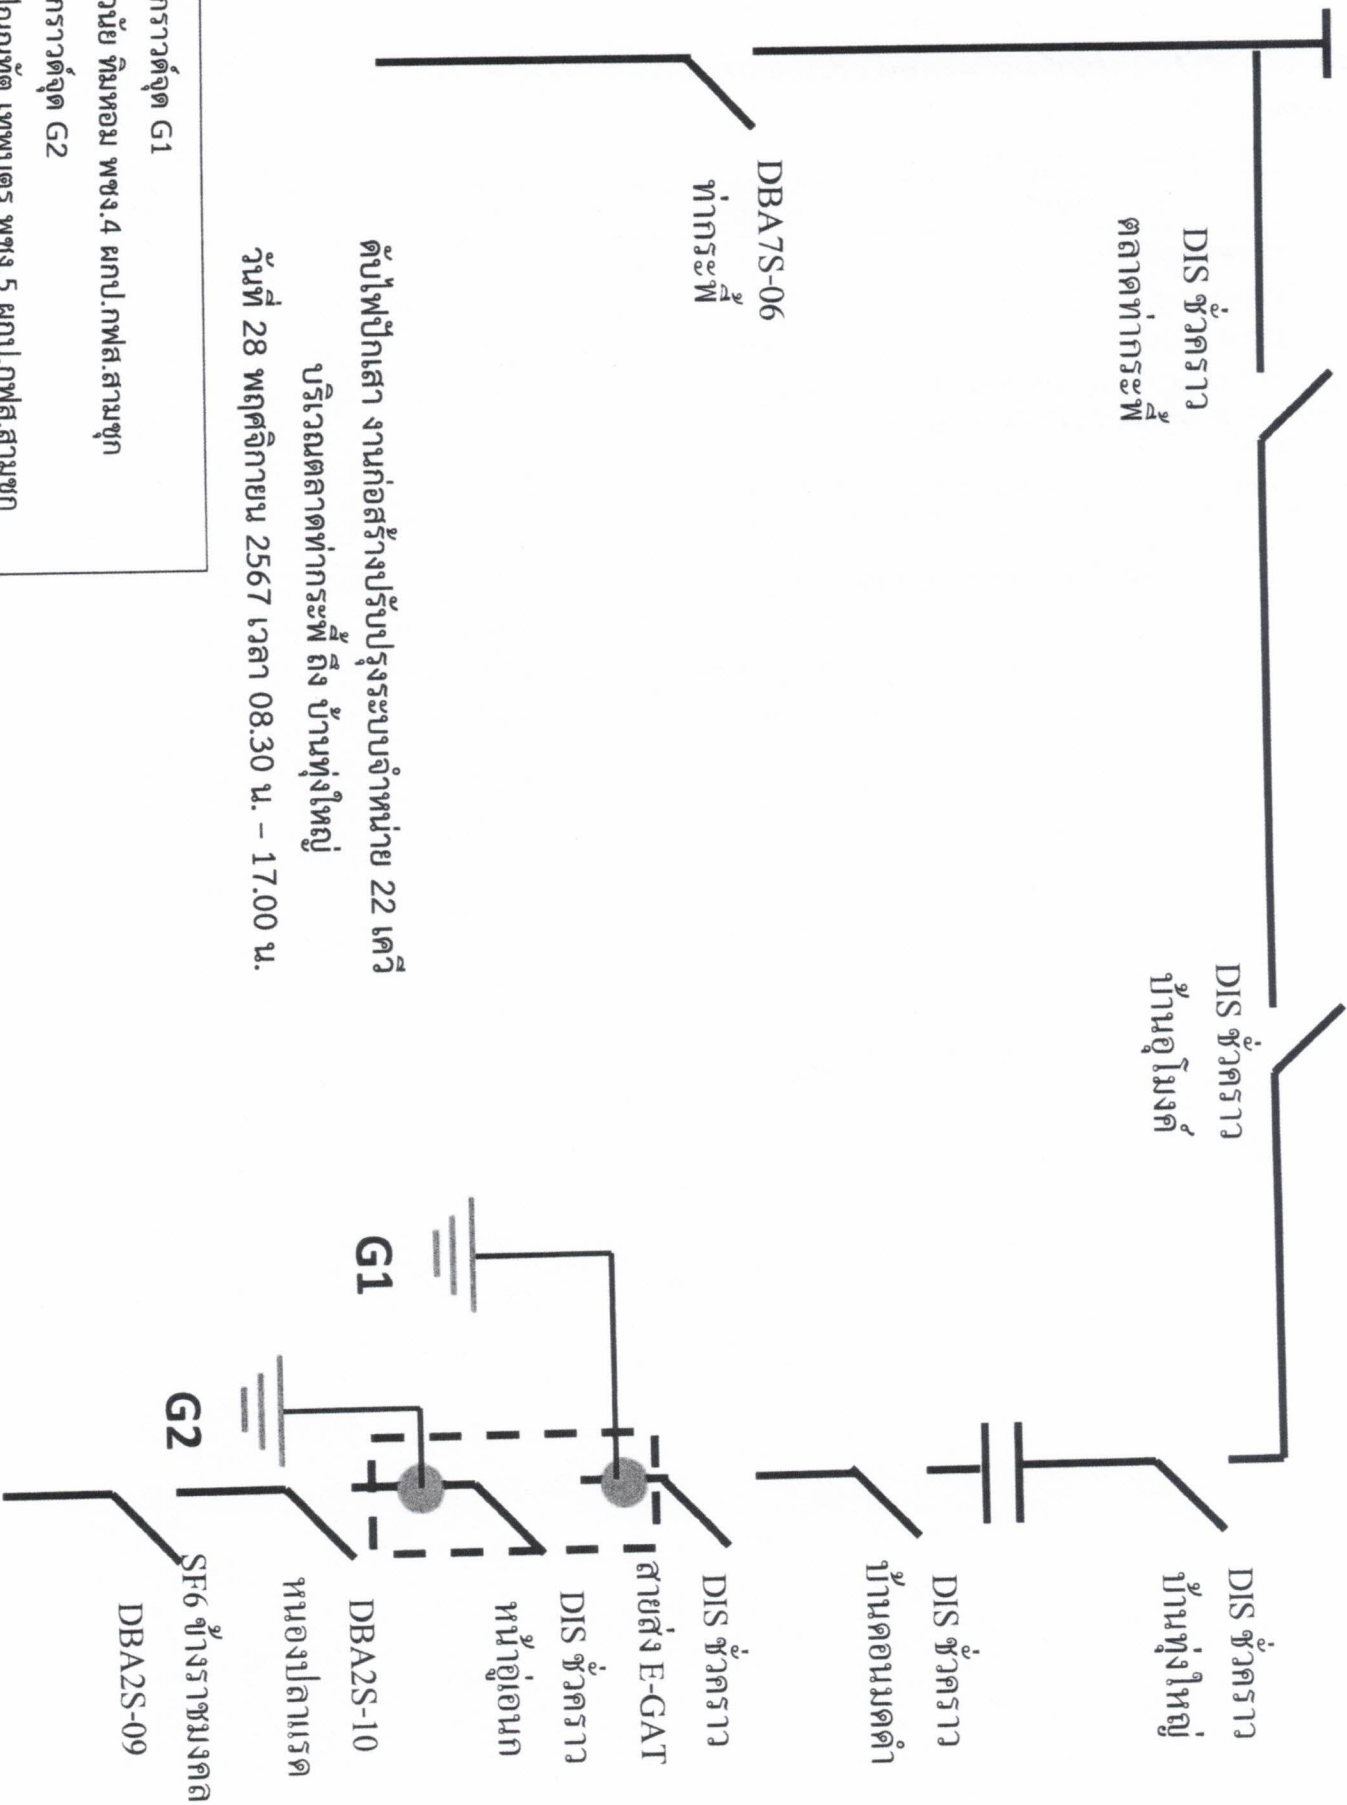

ตีไปฝึกเสางานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี

บริเวณตลิ่งท่ากระเพ ถึง บ้านทุ่งใหญ่

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2567 เวลา 08.30 น. - 17.00 น.

ผู้ติดต่อจุดจุด G1
 นายภูวนัย ทิมหอม พชง.4 ผกป.กฟส.สามชุก
 ผู้ติดต่อจุดจุด G2
 นาย ปิณทัต เทพบุตร พชง.5 ผกป.กฟส.สามชุก
