



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ /๒๕๖๖

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณมงคล

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอัครเดชา

ตำแหน่ง รจก.(ท.) กฟจ.สพ.

Switching Deadline

13 ธ.ค. 66

ด้วยการไฟฟ้าสุพรรณบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อรื้อถอนRECLOSER และดำเนินการติดตั้ง SF๖ แทน ตามแผนผังสังเขป
แบบ จำนวน...๑... แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	๔ สพ.๒	๑๖/๑๒/๖๖	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	รื้อถอนRECLOSER คลองวัดป่า SPA๘R-๐๑ ติดตั้งSF๖ แทน	DDEจุดA คลองวัดป่า	DDEจุดB ติด ถนนมาลัยแมน	โทร.๐๘๑-๔๘๑๕๕๑๓ นายธนกฤต พวงดอกไม้
๒.	๔ สพ.๒	๑๗/๑๒/๖๖	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	รื้อถอนRECLOSER บางปลาหมอ SPA๘R-๐๑ ติดตั้งSF๖ แทน	DDEจุดA ข.ไพศาล	DDE จุดB วัดบางปลาหมอ	โทร.๐๘๑-๔๘๑๕๕๑๓ นายธนกฤต พวงดอกไม้

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอิสรา เอื้อประเสริฐชัย ตำแหน่ง พชง.๕ (สช.) โทร. ๐๙๕-๔๘๔ ๙๗๙๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอัครเดชา.....)

ตำแหน่ง รจก.(ท.) กฟจ.สพ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ๒ พิดเดอร์ SPA 4 จาก DDE 9A A ถึง DDE 9A B

ในวันที่ 17 ธ.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 19.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1798/66

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย พิษณุ กิ่งประเสริฐ ประสานงานการขอตัดไฟกับ โทร.๐๘๑ 10๐๗๖๖๖๖๖๖

(นาย พิษณุ กิ่งประเสริฐ)

ผคฟ.๕ กฟภ.๓

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง ๒ แผ่น

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟจ.สพ.

แผนผังแนบ 1 แผ่น

อก.บข.(ก.๓),

อก.วว.(ก.๓)

ผจก. (สถานี)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย


พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณบางปลาหมอ		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	17 ธ.ค. 66	เวลา 08.00 น.	ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ.สพ.	งานที่ทำ	รีดออน Recloser และ ติดตั้ง SF6 แทน ตามใบขอปฏิบัติงาน 1798/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย		นายพิชชา กลิ่นประทุม	วันที่ 9 ธันวาคม 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 9 ธันวาคม 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 9 ธันวาคม 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย		1. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโชน 3. นายจิรวัดน์, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร	(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	SPB04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPB		-
3	SPB09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPB		-
4	ย้ายโหลด SPB 4 บางส่วนไปจ่ายจก SPB 9						
5	SPA09S-07	ปลด	สับ		สพ.		SF6 สนามกีฬากลาง
6	DIS Bypass SPA9R-01	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS Bypass Recloser บางปลาหมอ
7	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
8	แจ้งหน่วยงานทำการปลดโหลดหม้อแปลงในระบบก่อนทำการตัด DDE						
9	แจ้งชุด Hotline กระจาย ทำการปลด DDE จุด A บริเวณ ช.ไพศาล ออกทั้ง 3 เฟส ได้ (ตามแผนผังแนบ)						
10	แจ้งชุด Hotline กระจาย ทำการปลด DDE จุด B บริเวณวัดบางปลาหมอ ออกทั้ง 3 เฟส ได้ (ตามแผนผังแนบ)						
11	หลังจากชุด Hotline กระจาย ทำการปลด DDE จุด A และจุด B ออกทั้ง 3 เฟส ทั้ง 2 จุด เสร็จเรียบร้อย						
12	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
13	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G1						
14	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G2						
15	เมื่อไฟฟ้าหน้างาน ทำการเทสไฟ และซ็อตกราวด์ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย						
16	SPB04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPB		-
17	SPB09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPB		-
18	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
19	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
20	** ให้ตรวจสอบ SF6 ที่ติดตั้งใหม่ แทน Recloser (รหัส SF6 SPB4S-03) ให้อยู่สถานะ "OFF" และ ล็อคคาน **						
21	แจ้งหน่วยงาน ปลดซ็อตกราวด์ จุด G1						
22	แจ้งหน่วยงาน ปลดซ็อตกราวด์ จุด G2						
23	SPB04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPB		-



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบ.กฟจ.สพ.

ถึง ผจก.กฟจ.สพ.

เลขที่ ก.๓ สพ.(ปบ.)-

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖


เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟจ.สพ./รจก.กฟจ.สพ.

ด้วยในวันที่.. ๑๗ ธ.ค.๖๖ ... ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. กฟจ.สุพรรณบุรี มีแผนงานดับไฟฟ้าบริเวณ บางปลาหมอ เพื่อรื้อถอน Recloser (SPA๙R-๐๑) ซอยบางปลาหมอ และติดตั้ง SF๖ ๑ ชุด พร้อมอุปกรณ์ประกอบ เพื่อรองรับโหลดของสถานีสุพรรณ ๒ โดยมีรายละเอียด ฟีดเดอร์ที่ขอปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

ฟีดเดอร์ ๔ สถานี สุพรรณบุรี ๒ ตั้งแต่บริเวณ.. DDEจุดA ช.ไพศาล - DDE จุดB วัดบางปลาหมอ

กฟจ.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้ นายธนกฤต พวงดอกไม้ ตำแหน่ง ขม.กส.กฟจ.สพ โทร ๐๘๑-๔๘๑ ๕๙๑๓ เป็นผู้ควบคุมงาน และให้ นายวรพล สุทธิไกร ตำแหน่ง ทม.กส.กฟจ.สพ. โทร ๐๙๘- ๒๗๕๓๖๔๐เป็นผู้ประสานงานการดับไฟ เพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด

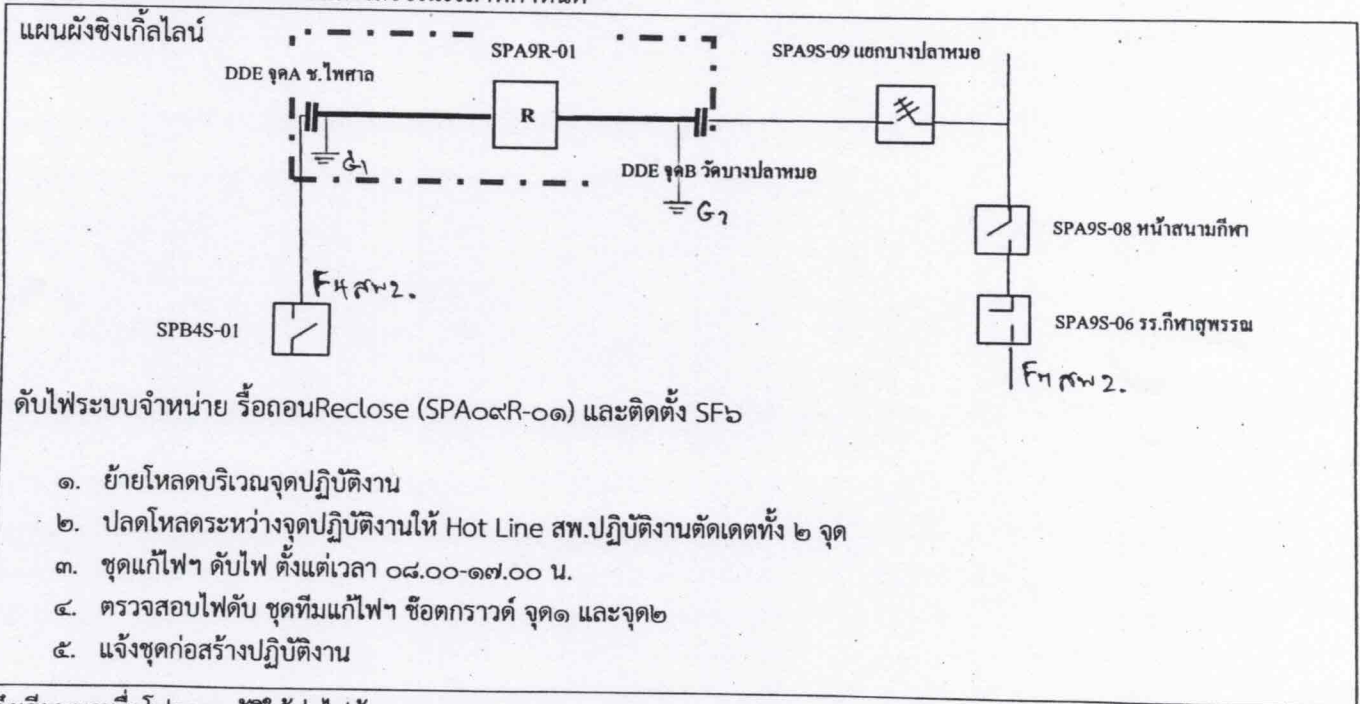

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย

อนุมัติ

(นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอัครเดชา)
รองผู้จัดการปฏิบัติงานแทนผู้จัดการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรี

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา

โทร. ๐๓๕-๕๓๕๑๖๗-๘, ๑๔๘๕๕, ๑๔๘๖๐

สั่ง

(นายอิสรา เอื้อประเสริฐชัย)
พงษ.๕(สข.)ผบ.กฟจ.สพ.



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกส.สพ.

เลขที่ ก.ทกฟจ.สพ.(กส)๒๐๒๕/๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนผัง จำนวน ๑ แผ่น

เรียน ผจก.สพ.

ถึง ผจก.สพ.

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

ตามอนุมัติที่ ก.๓ กปบ.(วว.) ๗๔๗/๒๕๖๖ ลว ๑๘ พ.ค. ๒๕๖๖ ให้แผนกก่อสร้าง
ดำเนินการติดตั้ง SF๖ แทน Recloser ปากซอยวัดบางปลาหมอ เพื่อรองรับโหลดของสถานีสุพรรณบุรี ๒
หมายเลขงาน WBS P-TDD๐๒.๓-I-SPISF.๐๐๐๒

ปัจจุบันแผนกก่อสร้างได้ดำเนินการเตรียมแผนการปฏิบัติงานดังนี้

- วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ ดับกระแสไฟฟ้าตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. มีรายละเอียด ดังนี้

๑. รื้อถอน Recloser จำนวน ๑ ชุด พร้อมอุปกรณ์ประกอบและอุปกรณ์ป้องกัน

๒. ติดตั้ง SF๖ จำนวน ๑ ชุด พร้อมอุปกรณ์ประกอบและอุปกรณ์ป้องกัน

๓. ให้ชุดฮอทไลน์กระเช้า สพ. ดำเนินการตัดจ่ายไลน์แรงสูง

ในการดำเนินการครั้งนี้มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า แรงสูง/แรงต่ำ ตามวันและเวลาดังนี้

หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนกำหนดจะจ่ายไฟฟ้าให้ก่อน

ดังนั้นจึงขอความอนุเคราะห์ ผบ.กฟจ.สพ.ดำเนินการดังนี้

ประกาศแจ้งผู้ใช้ไฟในบริเวณดังกล่าวทราบในวันเวลาดังกล่าว

ดำเนินการ ดับกระแสไฟฟ้าและซื้อคร่าวด์ ให้ปฏิบัติงาน ได้อย่างปลอดภัย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการให้ต่อไป

(นายชนกฤต พวงดอกไม้)

ชม.กส.กฟจ.สพ.

-ผบ.ปบ.สพ.

ผกส.ขอประสานงานส่วนที่เกี่ยวข้องเรื่องดับไฟ
เพื่ออนุมัติต่อไป

(นายวรพล สุทธิไกร)

ผบ.กส.กฟจ.สพ.

เรียน ผจก.กฟจ.สพ.

เห็นควรอนุมัติ ผกส.กฟจ.สพ. เสนอ

(นายธนัช มาลัยวงศ์)

ผบ.ปบ.กฟจ.สพ.

(นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอัครเดชา)

รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทนผจก.กฟจ.

แผนกก่อสร้าง ๑๔๘๕๐,๑๔๘๕๑
