



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ด่วน

Switching Deadline

11 ธ.ค. 66

เลขที่ ก.๓ นช.(ปบ) ๗๖๐๑ /๒๕๖๖

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)

ชื่อผู้ส่ง นายวณภูมิ บำรุงศรี

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.นครชัยศรี

ด้วยการไฟฟ้า กฟอ.นครชัยศรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายสถานีไฟฟ้านครชัยศรี ๑ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๓ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	NCA02	12 - 13 ธ.ค. 66	10.00	10.00	ทดสอบสาย Under Ground / มอเตอร์ เวย์ไทยน้ำทิพย์	NCA2S-15 - DIS A	NCA2S-16 - DIS B	นายชานินทร์ ศรีสวัสดิ์ วศก.7 ผจส. กรย.(ก3) 099-1326977
2.	NCA07	12 - 13 ธ.ค. 66	10.00	10.00		NCA7S-16 - DIS C	NCA7S-17 - DIS D	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นางสาวพัฒนสุดา พงษ์เภา ตำแหน่ง วศก.๔ กฟอ.นครชัยศรี โทร ๐๘๕-๓๖๑๔๒๐๓
พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบ ก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง


(นายวณภูมิ บำรุงศรี)
ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน
ผจก.กฟอ.นครชัยศรี
๗ ธันวาคม ๒๕๖๖

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ NCA๒ จาก DIS A ถึง DIS B
ในวันที่ 12-15 ธ.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 10.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1803/66
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ NCA7 จาก DIS C ถึง DIS D
ในวันที่ 12-15 ธ.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 10.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
พนักงานศูนย์ฯ นาย มโนช ทวย้อย ประธานงานการขอดับไฟกับ น.ส. พิภพเรศิตา พรชัยไผ่


(นายปราสริต เทียงอุณ)
ว.ก. 5 แทน ผคฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก. ก๓๐.๕๖.

อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น



แผนผังแนบ 3 แผ่น

ผจฟ. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ
นครปฐม ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างาน
จะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	มอเตอร์เวย์ไทยน้ำทิพย์					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	12 ธ.ค. 66	ระหว่าง	10.00 น.	ถึง	13 ธ.ค. 66	10.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กพอ.นช.	งานที่ทำ	ทดสอบสาย Under Ground		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1803/2566	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมนอช ทองย้อย			วันที่	9 ธันวาคม 2566	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	9 ธันวาคม 2566	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	9 ธันวาคม 2566	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนอช 2. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต 3. นายนครินทร์, น.ส.พชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	ตรวจสอบ Under Ground NCA02S-15(จุด A), NCA02S-1(จุด B)6, NCA07S-16(จุด C) และ NCA07S-17(จุด D) ปลดออกทั้งสามสามเฟส						
3	เมื่อพร้อมทดสอบสาย Under Ground						
4	NCA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA	-	-
5	NCA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA	-	-
6	NCA02S-15	ปลด	สับ		นช.	DIS	UG มอเตอร์เวย์ไทยน้ำทิพย์(จุด A)
7	NCA07S-16	ปลด	สับ		นช.	DIS	UG มอเตอร์เวย์ไทยน้ำทิพย์(จุด C)
8	NCA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA	-	-
9	NCA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA	-	-
10	ทดสอบสาย Under Ground มอเตอร์เวย์ไทยน้ำทิพย์ 24 ชม.						
สิ้นสุด Switching วันที่ 12 ธ.ค.66							
11	หลังจาก ทดสอบสาย Under Ground มอเตอร์เวย์ไทยน้ำทิพย์ ครบ 24 ชม. แล้วเสร็จ						
12	NCA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA	-	-
13	NCA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA	-	-
14	NCA02S-15	สับ	ปลด		นช.	DIS	UG มอเตอร์เวย์ไทยน้ำทิพย์(จุด A)
15	NCA07S-16	สับ	ปลด		นช.	DIS	UG มอเตอร์เวย์ไทยน้ำทิพย์(จุด C)
16	NCA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA	-	-
17	NCA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA	-	-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

Check List

ขั้นตอนการปฏิบัติ กรณีขออนุมัติปฏิบัติงานโดยวิธีดับไฟฟ้าแบบระดมชุดงาน

ชื่องาน.....ทดสอบสาย Under Ground NCA๐๒,NCA๐๗.....

สถานที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน.....มอเตอร์เวย์ไทยน้ำทิพย์.....

วันที่ดับไฟเพื่อทำงาน.....๑๒-๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖.....เริ่มเวลา.....๑๐.๐๐ น.....จ่ายไฟคืนเวลา.....๑๐.๐๐ น.....

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก.....การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ นครชัยศรี.....

ชื่อผู้อำนวยการงานระดม (เจ้าของพื้นที่งานระดม ดัดสินใจแก้ไขปัญหาได้ และประสานงานดับ-จ่ายไฟฟ้า)
 ชื่อ.....นายวณภูมิ บำรุงศรี.....ตำแหน่ง.....รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.นครชัยศรี.....
 เบอร์โทรศัพท์มือถือ.....๐๘๓-๘๕๘๗๘๕๘.....ชื่อเรียกขานทางวิทยุ.....U-๒.....

ชื่อช่างผู้คุมงานหลัก.....นายชานินทร์ ศรีสวัสดิ์.....
 ตำแหน่ง.....วศก.๗ ผจก.กรย.(ก๓) เบอร์โทรศัพท์มือถือ.....๐๙๙-๑๓๒๖๕๗๗.....ชื่อเรียกขานทางวิทยุ.....
 หน่วยงานที่เข้าร่วมทำงานในวันดังกล่าว.....กฟภ.ผู้รับจ้าง.....

๑.ผู้รับผิดชอบทำหน้าที่ดับไฟฟ้า/จ่ายไฟฟ้า.....น.ส.พัตมนสดา พงษ์เฒ่า วศก.๔ ผบ.กฟอ.นครชัยศรี (U-๖).....

๒.ผู้รับขบต่อสายลงดินชั่วคราวจุดที่.....ผู้รับผิดชอบ.....

จุดที่ ๒.....ผู้รับผิดชอบ.....	จุดที่ ๓.....ผู้รับผิดชอบ.....
จุดที่ ๔.....ผู้รับผิดชอบ.....	จุดที่ ๕.....ผู้รับผิดชอบ.....
จุดที่ ๖.....ผู้รับผิดชอบ.....	จุดที่ ๗.....ผู้รับผิดชอบ.....

๓.ขออนุมัติแผนงานดับไฟฟ้า ตามบันทึกที่.....พร้อมแผนผัง Switching.....

๔.แจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ตามบันทึกที่.....
 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในวันดับไฟฟ้าทำงาน ชื่อ.....

๕.ผลการแจ้งผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่หรือไม่
 ไม่มีข้อทักท้วง ข้อทักท้วง.....ราย ข้อทักท้วงคือ.....
 วิธีดำเนินการแก้ไข/ป้องกัน ข้อทักท้วง.....

๖.ผู้อำนวยการงานระดม จัดประชุมชี้แจงมอบหมายงาน ชี้แจงวงจรที่มีไฟฟ้า และวงจรที่ดับไฟเพื่อปฏิบัติงานก่อนวันระดมหรือไม่
 ไม่จัดประชุม เหตุผล.....
 จัดประชุมแล้ว เมื่อวันที่.....๖ ธันวาคม ๒๕๖๖.....สถานที่ประชุม.....ห้องประชุม ชั้น ๑.....
 วิทยากร.....รจก.(ท) , ผบ. , ผจก. , จป. กฟอ.นช. และ ผจก.กรย.(ก๓).....

๗.ผู้อำนวยการงานระดม ได้นำชุดงานไปดูหน้างานจริง พร้อมชี้แจงจุดอันตรายก่อนถึงวันดับไฟเพื่อปฏิบัติงานหรือไม่
 ไม่ชี้แจงที่หน้างาน เหตุผล.....
 ได้ชี้แจงที่หน้างาน เมื่อวันที่.....๖ ธันวาคม ๒๕๖๖.....


(นายชลิต สีขาวขำ)
 ผบ.บ.กฟอ.นครชัยศรี

C๓ Safety CAP ๐๑


หมายเหตุ ผู้อำนวยการงานระดม จะต้องเป็นผู้ประสานงานดับไฟดังนี้

- ๑.เมื่อได้รับแจ้งจากผู้รับผิดชอบทำหน้าที่ดับไฟแล้ว ต้องสั่งการให้ผู้รับผิดชอบต่อสายดินชั่วคราวตรวจสอบ แรงดัน เมื่อเห็นว่าไม่มีไฟแล้ว จึงให้ต่อสายลงดินชั่วคราว เสร็จแล้วจึงสั่งการให้ชุดก่อสร้างขึ้นปฏิบัติงานได้
- ๒.เมื่องานเสร็จแล้ว มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง ระเบียบร้อยของงาน เมื่อเห็นว่างานถูกต้องเรียบร้อย คนงานลงหมดแล้ว จึงแจ้งให้รื้อถอนสายต่อลงดินชั่วคราว เมื่อรื้อถอนสายต่อลงดินชั่วคราวและคนงานลงจากเสาแล้ว จึงให้จ่ายไฟฟ้า

สถานะการจ่ายไฟก่อนปฏิบัติงาน

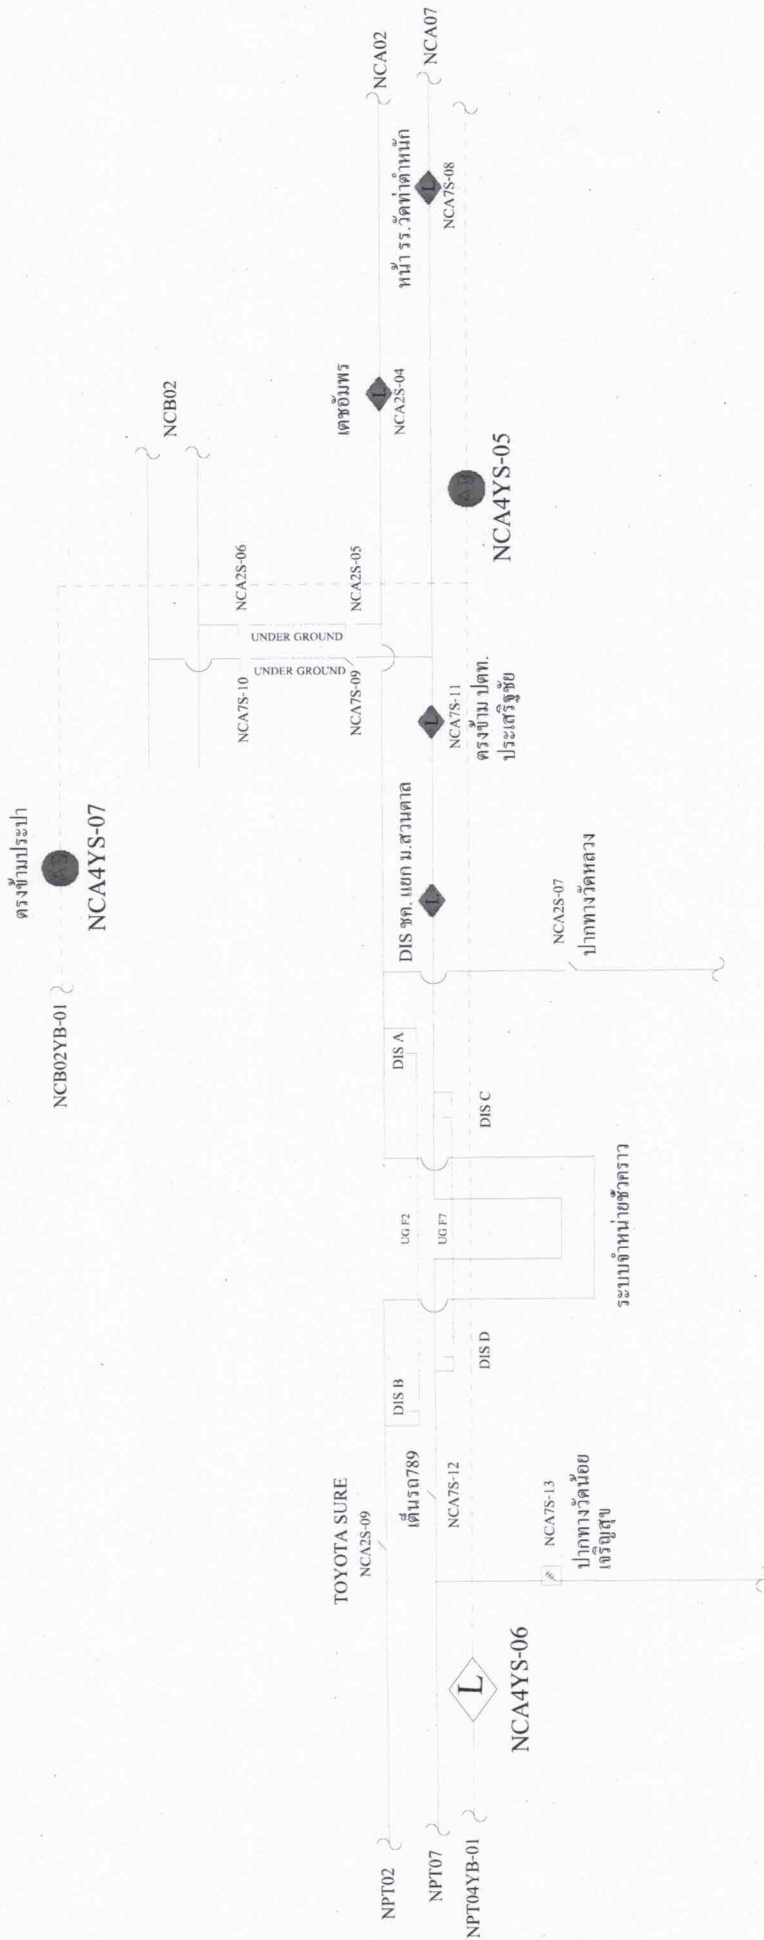

สถานะการจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน

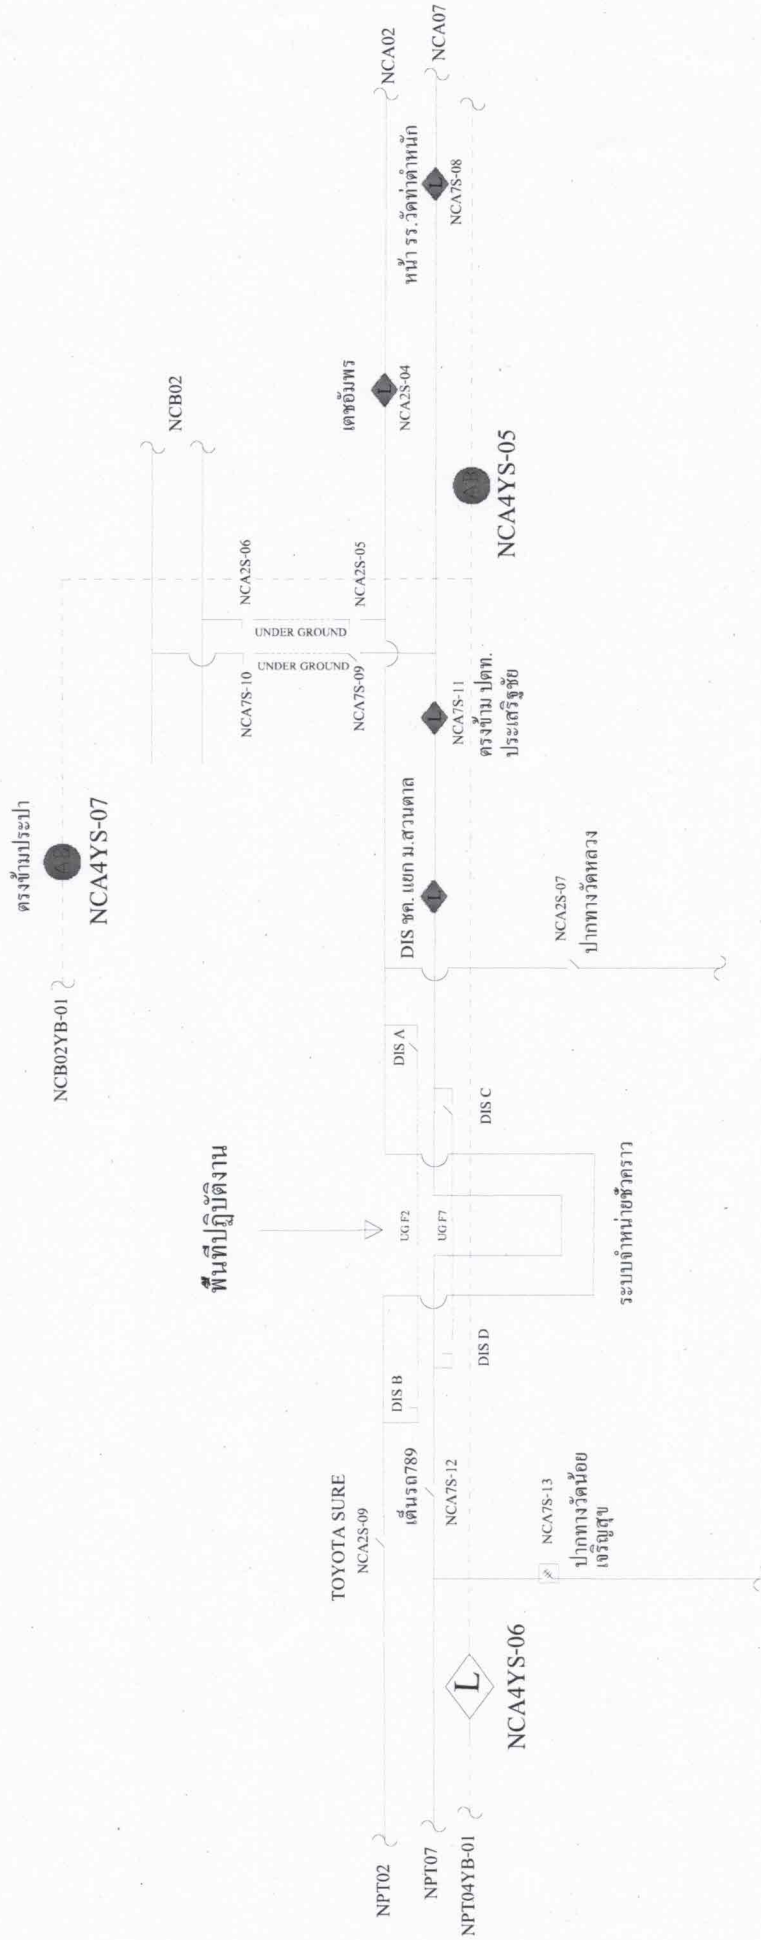

สถานะการจ่ายไฟหลังปฏิบัติงาน

