



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3.ดบ.(ปบ) 1171/2567
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายสมนัติ ยศศักดิ์ศรี

วันที่ 27 พ.ย. 2567
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก3)
ตำแหน่ง ร.จก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.ดบ.

ด้วย กฟส.เดิมนางนวนวช ขอตัดไฟวงจร DBA ๐๒ เพื่อให้ชุดงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณสามแยกนางบวชริมถนน ๓๔๐ -บ้านบางแอก(ฝั่งขาเข้าจังหวัดสุพรรณบุรี) ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

| ที่ | ฟีดเดอร์ | วัน/เดือน/ปี | ตั้งแต่เวลา | ถึงเวลา | ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ | จาก | ถึง | ผู้ควบคุมงาน |
|-----|----------|--------------|-------------|----------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------|---|
| 1. | DBA 02 | 14 ธ.ค.67 | 08.30 น. | 17.00 น. | ติดตั้งอุปกรณ์หัวเสา /พาดสายแรงสูง | ดิสชั่วคราว อู่ช่างเลื่อน | DBA2S-04 บางแอก | นายสุทธิ นิยมธรรม โทร.086- 0589737 |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หมู่ที่ 1 ต.นางนวนวช

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวรวิทย์ ศรีศักดิ์ ตำแหน่ง ช.ผ.ปบ โทร. 080-847-6904

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓. พิกัดพื้นที่ดับไฟ /ย้ายโหลด 3.1 เริ่มต้น Lat : ...14.798136... Long: ...100.108332.....

3.2 สิ้นสุด Lat : ...14.79117... Long: ...100.104451.....

ลงชื่อ.....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก๓)

(นายสมนัติ ยศศักดิ์ศรี)

ตำแหน่ง ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.ดบ.

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ DBA 2 จาก ดิสชั่วคราว อู่ช่างเลื่อน ถึง DBA 029-04
ในวันที่ 14 ธ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1806/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย วิวัฒน์ เสมอ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายวรวิทย์ ศรีศักดิ์

(นายพิรภัท พิชราสุวรรณ)
จุด 5 11กน ๕๗.๑๖.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส.๓๓

อก.บข.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์..... 1 แผ่น

แผนผังแนบ..... 1 แผ่น

ผจก..... (สถานี.....)



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)


ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | |
|------------------------|--|---|-----------------------------|
| 1. สถานที่ทำงาน | Dis ชด อยู่ข้างเลื่อน ถึง SF6 DBA02S-04 บางแอก | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 14 ธ.ค. 67 | เวลา 08.30 น. | ถึง 17.00 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟส.ดบ. | งานที่ทำ ติดตั้งอุปกรณ์หัวเสา และพาดสายแรงสูง | ตามใบขอปฏิบัติงาน 1806/2567 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายวีร์วัชร เสมามิ่ง | | วันที่ 8 ธันวาคม 2567 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | วันที่ 8 ธันวาคม 2567 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย |  | | วันที่ 8 ธันวาคม 2567 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโชน (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพีรภัทร, นางสาวสุกษา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นางสาวพิชยา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | |

| ที่ | รหัสอุปกรณ์ | สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ | ดำเนินการ | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ |
|--|---|--------------------------------------|---------------------|------|--------------|------------|----------------|
| 1 | ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง | | | | | | |
| 2 | ตรวจสอบSF6 DBA02S-04 บางแอก อยู่สถานะ Open+lock | | | | | | |
| 3 | เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.30 | | | | | | |
| 4 | DBA02VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | DBA | | |
| 5 | DISชั่วคราวDBA02 | สับ | ปลด(ใช้โหดบัสเตอร์) | | ดบ. | | อยู่ข้างเลื่อน |
| 6 | แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับ | | | | | | |
| 7 | แจ้งผู้ควบคุมงานเทสไฟดับแล้วทำการช็อตกราวด์ จุด G1 | | | | | | |
| 8 | แจ้งผู้ควบคุมงานเทสไฟดับแล้วทำการช็อตกราวด์ จุด G2 | | | | | | |
| 9 | แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด WE SAFE ให้เรียบร้อยก่อนปฏิบัติงาน | | | | | | |
| 10 | แจ้งชุดปฏิบัติงานได้ | | | | | | |
| 11 | DBA02VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | DBA | | |
| %%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%% | | | | | | | |
| 12 | เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ | | | | | | |
| 13 | แจ้งผู้ควบคุมงานทำการปลดช็อตกราวด์ จุด G1 ออก | | | | | | |
| 14 | แจ้งผู้ควบคุมงานทำการปลดช็อตกราวด์ จุด G2 ออก | | | | | | |
| 15 | เมื่อพร้อมจ่ายไฟกลับสภาพปกติ | | | | | | |
| 16 | DBA02VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | DBA | | |
| 17 | DISชั่วคราวDBA02 | ปลด | สับ | | ดบ. | | อยู่ข้างเลื่อน |
| 18 | DBA02VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | DBA | | |
| %%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%% | | | | | | | |

แผ่นที่ 1

แผนผัง Single line แสดงพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อให้ชุดงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายใต้ดินสายส่ง 115 เควี วงจร DBA02
วงจร DBA02 บริเวณ Dis ชั่วคราว ตู้ข้างเลื่อน ถึง DBA25-04 บางแยก

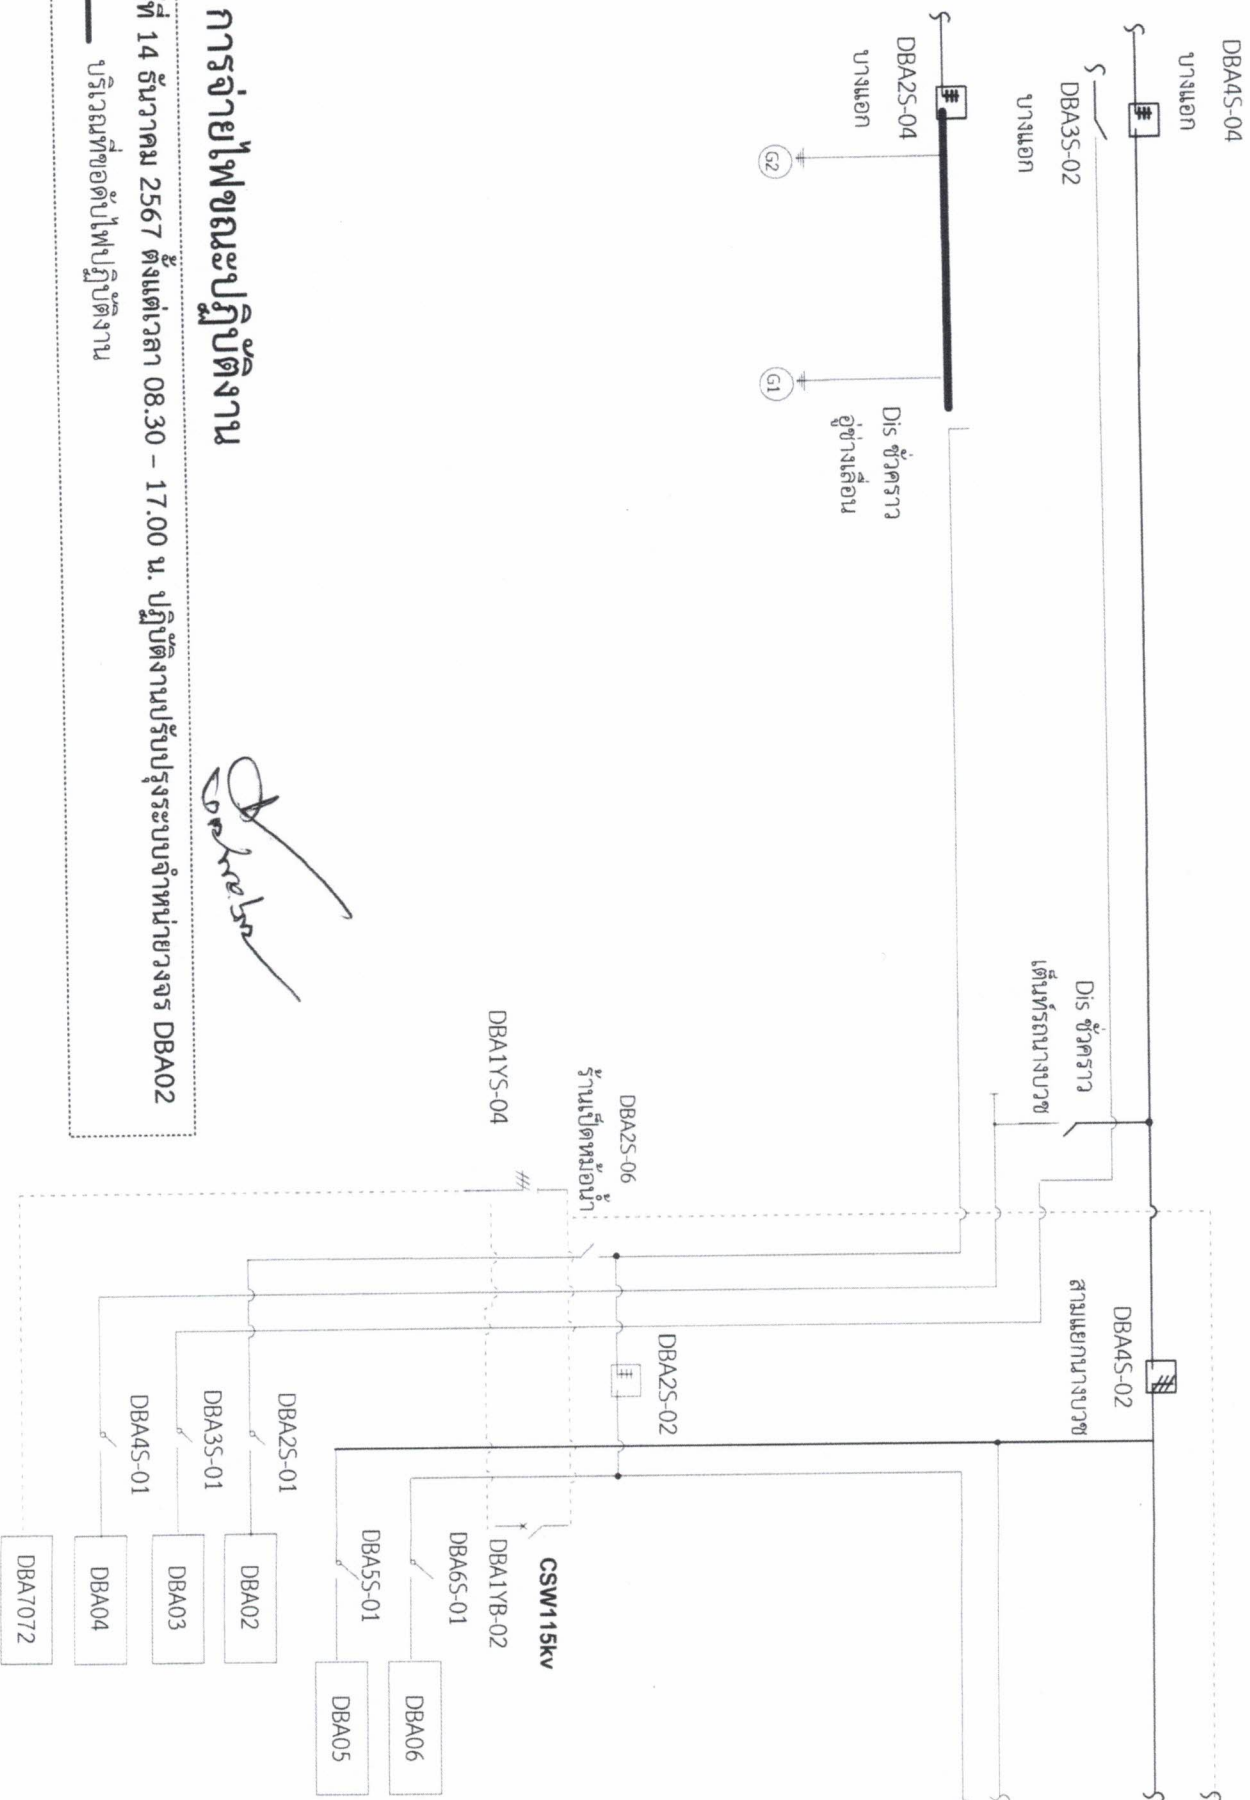

สถานะ การจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน

1. วันอาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 17.00 น. ปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายวงจร DBA02
หมายเหตุ — บริเวณที่ขอตัดไฟปฏิบัติงาน
