



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

20 ธ.ค. 66

เลขที่ ก.๓...../๒๕๖๖..... วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖
 ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณมงคล..... ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
 ชื่อผู้ส่ง นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอักษรเดชา..... ตำแหน่ง รจก.(ท.) กฟจ.สพ.

ด้วยการไฟฟ้าสุพรรณบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อรื้อถอน ปีกเสาและพาดสายแรงสูง สถานีคอนเจดีย์ บริเวณตรงข้าม
 บัมปตท.ท่าเสด็จ-หน้าบ้าน สจ.ฉนวน ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	๕ ดจ.	๒๗/๑๒/๖๖	๐๘.๐๐	๑๒.๐๐	เปลี่ยนสายแรงสูง SAC๑๘๕ ค.ม.ม.	ประจักษ์ราตรง ข้ามบัมปตท.	หน้าบ้าน สจ.ฉนวน	โทร.๐๘๑-๘๕๖๖๕๗๙ นายวรพล สุทธิไกร
๒.	๘ ดจ.	๒๗/๑๒/๖๖	๐๘.๐๐	๑๒.๐๐		DOA๐๘S-๑๐	DOA๐๘S-๐๒, DOA๐๘S-๑๕	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสนวนกร สุวรรณประทีป ตำแหน่ง พทง.๖ (สข.) โทร. ๐๘๑-๘๓๒๐๒๖๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
 ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(.....นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอักษรเดชา.....)

ตำแหน่ง.....รจก.(ท.)กฟจ.สพ.....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเคอร์ DOA5 จาก DDE มอ.ฉนวน สจ.ฉนวน น.ว.บ้าน สจ.ฉนวน
 ในวันที่ 23/12/66 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1824/66

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พิดเคอร์ DOA8 จาก DOA8S-10 ถึง DOA8S-02, 8S-15
 ในวันที่ 23/12/66 ตั้งแต่เวลา น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1824/66

พนักงานศูนย์ฯ นาย วรรณพงษ์ ผคฟ. ประสานงานการขอตัดไฟกับ หน.แผนกฯ ผ.กรรณฯ ปรก.ม.

(นาย.....)
 ๒๐. ๕ ๒๕๖๖

ขั้นตอนการสวิชชิง 5 แผ่น

แผนผังแนบ 2 แผ่น

ผจฟ. (สถานี.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟจ. สพ.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ /๒๕๖๖

วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖

ชื่อผู้รับ นายพิพัฒน์ พิชิตสุวรรณผล

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอัครเดชา

ตำแหน่ง รจก.(ท.) กฟจ.สพ.

ด้วยการไฟฟ้าสุพรรณบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อรื้อถอนปีกเสาและพาดสายแรงสูง แยกหนองหม้อแกง-หน้าโรงสู้อียา ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	๕ ดจ.	๒๗/๑๒/๖๖	๑๒.๐๐	๑๗.๐๐	รื้อถอนปีกเสาและพาดสายแรงสูง SAC๑๘๕ ต.ม.ม.	DDEหนองหม้อแกง	DDE หน้าโรงสู้อียา	โทร.๐๘๑-๘๕๖๖๕๗๘ นายวรพล สุทธิไกร
๒.	๘ ดจ.	๒๗/๑๒/๖๖	๑๒.๐๐	๑๗.๐๐		DOA๐๘5-๐๒	DDE หน้าโรงสู้อียา	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธนกร สุวรรณประทีป ตำแหน่ง พชง.๖ (สข.) โทร ๐๘๑-๔๓๒๐๒๖๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอัครเดชา)

ตำแหน่ง รจก.(ท.) กฟจ.สพ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 พิดเตอร์ 0045 จาก ODEหนองหม้อแกง ODE หน้าโรงสู้อียา
ในวันที่ 23/12/66 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่ 1824/66

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 2 พิดเตอร์ 0048 จาก 00485-02 ถึง ODE หน้าโรงสู้อียา (0048)
ในวันที่ 23/12/66 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่ 1824/66

พนักงานศูนย์ฯ นาย วรรณพงษ์ นกานต์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ

(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟจ. สพ.

อก.บช.(ก.๓),

อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 5 แผ่น

แผนผังแนบ 2 แผ่น

ผจก. (สถานี.....)



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน DDE ตรงข้ามปตท.ท่าเสาถึง SF6หน้าบ้าน สจ.ฉนวน และ DDE หนองหม้อแกง ถึง DDE โรงสีอุย้า
2. กำหนดวันที่ทำงาน 23 ธ.ค. 66 เวลา 08.00 น. ถึง เวลา 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟง.สพ. งานที่ทำ เปลี่ยนสายแรงสูง SAC185 ตามใบขอปฏิบัติงาน 1824/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายวรรณพงษ์ นกเทศ วันที่ 16 ธันวาคม 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 16 ธันวาคม 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 16 ธันวาคม 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายพีรภัทร,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมนโนช,นายวรรณพงษ์ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายจิรวัดท์,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	**งานที่ทำมี 2 งาน**						
2	**งานที่ 1 เวลา 08.00 ถึง 12.00น. ดับไฟตั้งแต่ DDE ตรงข้ามปตท. ถึง SF6 ชค.หน้าบ้าน สจ.ฉนวน**						
3	**งานที่ 2 เวลา 12.00 ถึง 17.00น. ดับไฟตั้งแต่ DDE หนองหม้อแกง ถึง DDE หน้าโรงสีอุย้า**						
4	**งานที่ 1**						
5	ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
6	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		
7	DOA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		
8	DOA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		
9	DOA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		
10	DOA05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.	R	หนองหม้อแกง
11	SPA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPA		
12	SPA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		
13	SPB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPB		
14	SPB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPB		
15	- ย้ายโหลด DOA08 บางส่วนไปจ่ายจาก DOA05						
16	DOA0BVB-01	ปลด	สับ		DOA	CB	ขนานเมนบัส
17	DOA05S-07	ปลด	สับ		สพ.	DIS	แยกบ่อมดาร์จโพท์ทำทราย
18	DOA08S-15	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.	DIS	แยกสะพานเลี้ยงเมือง
19	DOA0BVB-01	สับ	ปลด		DOA	CB	ขนานเมนบัส
20	- ย้ายโหลด DOA05 บางส่วนไปจ่ายจาก SPA05						
21	DOA05S-08	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6 โรงสีอุย้า
22	SF6 ชค.DOAO5	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		สพ.	SF6	ชค.หน้าบ้าน สจ.ฉนวน
23	- ย้ายโหลด DOA08 บางส่วนไปจ่ายจาก SPB07						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
24	DOA08S-06	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6	สถานีวิจัยข้าว
25	DOA08S-10	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพ.		SF6	วัดอินเกษม(ล่าง)
26	- ดับไฟ เวลา 08.00 น.							
27	DOA08S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS	บ่อมสำรวจแยกศรีสะเกษ
28	แจ้งกฟจ.สพ.ปลดโหลดก่อนทำการตัด DDE ตรงข้ามบีมปตท.							
29	หลังจากกฟจ.สพ.ปลดโหลดก่อนทำการตัด DDE ตรงข้ามบีมปตท. แล้วเสร็จ							
30	แจ้งกฟจ.สพ.ให้ HOTLINE ทำการตัด DDE ตรงข้ามบีมปตท.ออกจากกันทั้งสามเฟส							
31	หลังจากกฟจ.สพ.ให้ HOTLINE ทำการตัด DDE ตรงข้ามบีมปตท.ออกจากกันทั้งสามเฟสแล้วเสร็จ							
32	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กฟจ.สพ. รับทราบ							
33	แจ้งกฟจ.สพ.ทำการเทสไฟดับให้เรียบร้อยก่อนทำการ Short Ground							
34	แจ้งกฟจ.สพ.ทำการ Short ground จุด G1							
35	แจ้งกฟจ.สพ.ทำการ Short ground จุด G2							
36	แจ้งกฟจ.สพ.ทำการลง WE SAFE ให้รับทราบ							
37	แจ้งกฟจ.สพ.ปฏิบัติงานได้							
38	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA			
39	DOA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA			
40	DOA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA			
41	DOA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA			
42	DOA05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สพ.		R	หนองหม้อแกง
43	SPA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPA			
44	SPA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA			
45	SPB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPB			
46	SPB07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPB			
47	สิ้นสุด Switching **งานที่ 1 **							
48	หลังจากกฟจ.สพ.ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ **งานที่ 1**							
49	แจ้งกฟจ.สพ.ทำการปลด Short ground จุด G1							
50	แจ้งกฟจ.สพ.ทำการปลด Short ground จุด G2							
51	ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำการสวิชชิง							
52	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA			
53	DOA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA			
54	DOA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA			
55	DOA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA			

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
56	DOA05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.		R	หนองหม้อแกง
57	SPA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPA			
58	SPA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA			
59	- จ่ายไฟ							
60	แจ้งกฟจ.สพ.ให้ HOTLINE ทำการเชื่อม DDE ตรงข้ามบึงปตท.เข้าทั้งสามเฟส							
61	หลังจากกฟจ.สพ.ให้ HOTLINE ทำการเชื่อม DDE ตรงข้ามบึงปตท.เข้าทั้งสามเฟสแล้วเสร็จ							
62	DOA08S-10	ปลด	สับ		สพ.		SF6	วัดอินเกษม(ล่าง)
63	- ย้ายโหลด DOA05 บางส่วนกลับจากจาก SPA05							
64	SF6 ชค.DOAO5	ปลด	สับ		สพ.		SF6	ชค.หน้าบ้าน สจ.ฉวน
65	DOA05S-08	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		สพ.	SCADA	SF6	โรงสีอู่ยา
66	- ย้ายโหลด DOA08 บางส่วนไปจ่ายจาก DOA05							
67	DOABVB-01	ปลด	สับ		DOA		CB	ขนานเมนบัส
68	DOA08S-15	ปลด	สับ		สพ.		DIS	แยกสะพานเลี้ยงเมือง
69	DOA05S-07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS	แยกบ้อมตำรวจโพธิ์ท่าทราย
70	DOABVB-01	สับ	ปลด		DOA		CB	ขนานเมนบัส
71	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA			
72	DOA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA			
73	DOA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA			
74	DOA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA			
75	DOA05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.		R	หนองหม้อแกง
76	SPA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPA			
77	SPA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA			
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด **งานที่ 1**							
78	**งานที่ 2** เวลา 12.00 - 17.00น.							
79	ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำการสวิชชิง							
80	DOA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA			
81	SPB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPB			
82	SPA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA			
83	- ดับไฟ เวลา 12.00 น.							
84	**ตัด DDE 3 จุด**							
85	แจ้งกฟจ.สพ.ตรวจสอบ DOA05S-08 SF6 โรงสีอู่ยา อยู่ในตำแหน่ง "OPEN+LOCK"							
86	แจ้งกฟจ.สพ.ปลดโหลดก่อนทำการตัด DDE ทั้งหมด							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
87	หลังจากกฟจ.สพ.ปลดโหลดก่อนทำการตัด DDE แล้วเสร็จ						
88	แจ้งกฟจ.สพ.ให้ HOTLINE ทำการตัด DDE หนองหม้อแกง ออกจากกันทั้งสามเฟส (DOA05)						
89	หลังจากกฟจ.สพ.ให้ HOTLINE ทำการตัด DDE หนองหม้อแกง ออกจากกันทั้งสามเฟสแล้วเสร็จ (DOA05)						
90	แจ้งกฟจ.สพ.ให้ HOTLINE ทำการตัด DDE หน้าโรงสีอู่ยา ออกจากกันทั้งสามเฟส (SPA05)						
91	หลังจากกฟจ.สพ.ให้ HOTLINE ทำการตัด DDE หน้าโรงสีอู่ยา ออกจากกันทั้งสามเฟสแล้วเสร็จ (SPA05)						
92	แจ้งกฟจ.สพ.ให้ HOTLINE ทำการตัด DDE หน้าโรงสีอู่ยา ออกจากกันทั้งสามเฟส (DOA08)						
93	หลังจากกฟจ.สพ.ให้ HOTLINE ทำการตัด DDE หน้าโรงสีอู่ยา ออกจากกันทั้งสามเฟสแล้วเสร็จ (DOA08)						
94	แจ้งกฟจ.สพ.ทำการทดสอบไฟดับให้เรียบร้อยก่อนทำการ Short Ground						
95	แจ้งกฟจ.สพ.ทำการ Short ground จุด G1						
96	แจ้งกฟจ.สพ.ทำการ Short ground จุด G2						
97	แจ้งกฟจ.สพ.ทำการลง WE SAFE ให้รับทราบ						
98	แจ้งกฟจ.สพ.ปฏิบัติงานได้						
99	DOA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		
100	SPB07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPB		
101	SPA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		
สิ้นสุด Switching **งานที่ 2 **							
102	หลังจากกฟจ.สพ.ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ **งานที่ 2**						
103	แจ้งกฟจ.สพ.ทำการปลด Short ground จุด G1						
104	แจ้งกฟจ.สพ.ทำการปลด Short ground จุด G2						
105	ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำการสวิชชิง						
106	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		
107	DOA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		
108	DOA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		
109	DOA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		
110	SPA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPA		
111	SPA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPA		
112	SPA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		
113	SPB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPB		
114	SPB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPB		
115	- จ่ายไฟ						
116	แจ้งกฟจ.สพ.ให้ HOTLINE ทำการเชื่อม DDE หนองหม้อแกง เข้าทั้งสามเฟส (DOA05)						
117	หลังจากกฟจ.สพ.ให้ HOTLINE ทำการเชื่อม DDE หนองหม้อแกง เข้าทั้งสามเฟสแล้วเสร็จ (DOA05)						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
118	แจ้งกฟพจ.สพ.ให้ HOTLINE ทำการเชื่อมต่อ DDE หน้าโรงสีอุยยา เข้าทั้งสามเฟส (SPA05)						
119	หลังจากกฟพจ.สพ.ให้ HOTLINE ทำการเชื่อมต่อ DDE หน้าโรงสีอุยยา เข้าทั้งสามเฟสแล้วเสร็จ (SPA05)						
120	แจ้งกฟพจ.สพ.ให้ HOTLINE ทำการเชื่อมต่อ DDE หน้าโรงสีอุยยา เข้าทั้งสามเฟส (DOA08)						
121	หลังจากกฟพจ.สพ.ให้ HOTLINE ทำการเชื่อมต่อ DDE หน้าโรงสีอุยยา เข้าทั้งสามเฟสแล้วเสร็จ (DOA08)						
122	- ย้ายโหลด DOA08 บางส่วนกลับจาก SPB07						
123	DOA05S-08	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6 โรงสีอุยยา
124	SPA09VB-01	ปลด	สับ		SPA		CB SPA09
125	SPB07VB-01	สับ	ปลด		SPA		CB SPB07
126	SPA0BVB-01	ปลด	สับ		SPA		CB ขนานเมนบัส
127	DOA0BVB-01	ปลด	สับ		DOA		CB ขนานเมนบัส
128	DOA08S-02	ปลด	สับ		สพ.		DIS ป้อมตำรวจแยกศรีสะเกษ
129	DOA08S-06	สับ	ปลด		สพ.		SF6 สถานีวิทยุข้าว
130	DOA05S-08	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6 โรงสีอุยยา
131	SPB07VB-01	ปลด	สับ		SPA		CB SPB07
132	SPA09VB-01	สับ	ปลด		SPA		CB SPA09
133	SPA0BVB-01	สับ	ปลด		SPA		CB ขนานเมนบัส
134	DOA0BVB-01	สับ	ปลด		DOA		CB ขนานเมนบัส
135	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		
136	DOA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		
137	DOA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		
138	DOA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		
139	SPA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPA		
140	SPA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPA		
141	SPA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		
142	SPB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPB		
143	SPB07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPB		
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบ.กฟจ.สพ.

เลขที่ ก.๓ สพ.(ปบ.)-

เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย


เรียน ผจก.กฟจ.สพ./รจก.กฟจ.สพ.

ถึง ผจก.กฟจ.สพ.

วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖

ด้วยในวันที่...๒๓...เดือน...ธันวาคม...พ.ศ. ...๒๕๖๖... ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. กฟจ.สุพรรณบุรี มีแผนงานดับไฟฟ้าบริเวณ ...ตรงข้ามบับมตท.ท่าเสด็จ-Disชั่วคราวโรงสีเฟอร์รี่ ...เพื่อ...รื้อถอน,ปักเสาแรงสูงและพาดสายแรงสูงสถานีตอนเจดีย์...โดยมีรายละเอียดที่ขอปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

พีดเคอร์ ..๕,๘.. สถานีฯ ...ตอนเจดีย์... ตั้งแต่บริเวณ ..Disชั่วคราวตรงข้ามบับมตท.ท่าเสด็จ- หน้าบ้าน สจ.ฉนวน กฟจ.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้นายปรีชา ทองระย้า พงช.๖ ผจก.กฟจ.สพ. เบอร์โทรศัพท์ ..๐๘๐-๑๔๓๙๑๑๔.. เป็นผู้ควบคุมงานและให้..นายวรพล สุทธิโกธ ..ตำแหน่ง หน.กส.กฟจ.สพ..เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ..๐๘๘-๒๗๕๓๖๔๐..เป็นผู้ประสานงานการดับไฟเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด

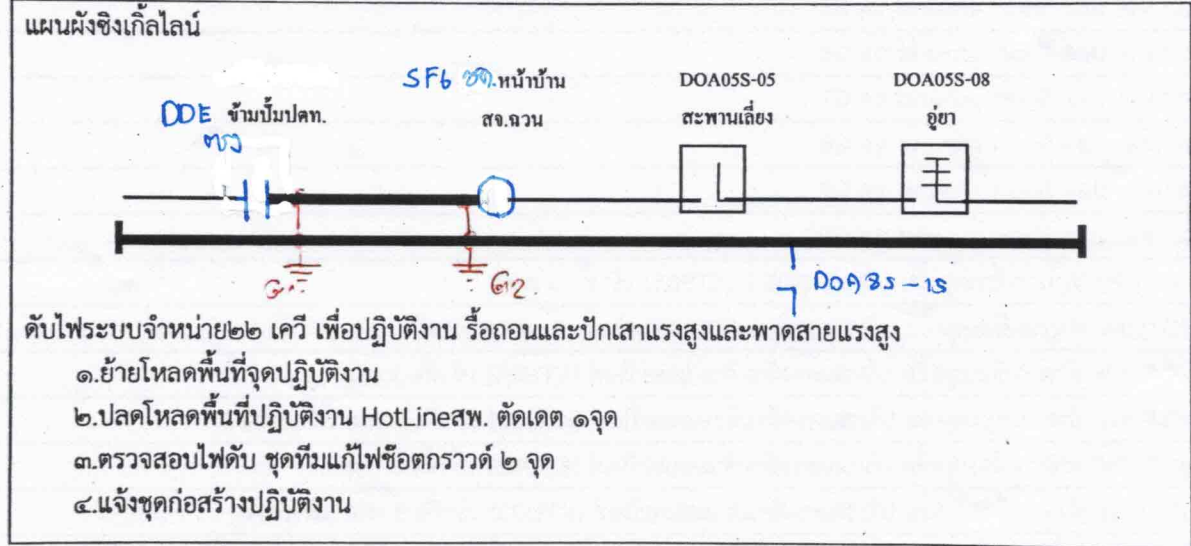

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย

อนุมัติ

Ths
(นายธนากร สุวรรณประทีป)
พงช.๖(สข.) ผบ.กฟจ.สพ.

(นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอัคระเดชา)
รองผู้จัดการปฏิบัติงานแทนผู้จัดการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรี

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา *ชช*
โทร. ๐๓๕-๕๓๕๑๖๗-๘ , ๑๔๘๕๕ , ๑๔๘๖๐



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบ.กฟจ.สพ.

ถึง ผจก.กฟจ.สพ.

เลขที่ ก.๓ สพ.(ปบ.)-

วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖


เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟจ.สพ./รจก.กฟจ.สพ.

ด้วยในวันที่...๒๓...เดือน...ธันวาคม...พ.ศ. ...๒๕๖๖... ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐-๑๗.๐๐ น. กฟจ.สุพรรณบุรี มีแผนงานดับไฟฟ้าบริเวณ ...หนองหม้อแกง-หน้าโรงสีอุยา...เพื่อ...รื้อถอน,ปักเสาแรงสูงและพาดสายแรงสูง สถานีคอนเจดีย์...โดยมีรายละเอียดที่ขอปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

พิดเดอร์ ..๕,๘.. สถานีฯ ...คอนเจดีย์... ตั้งแต่บริเวณ ..หนองหม้อแกง-หน้าโรงสีอุยา

กฟจ.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้นายปรีชา ทองระย้า พชง.๖ ผจก.กฟจ.สพ. เบอร์โทรศัพท์ ..๐๙๐-๑๔๓๙๑๑๔.. เป็นผู้ควบคุมงานและให้..นายวรพล สุทธิไกร ..ตำแหน่ง หน.กส.กฟจ.สพ..เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ...๐๙๘-๒๗๕๓๖๔๐..เป็นผู้ประสานงานการดับไฟเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด

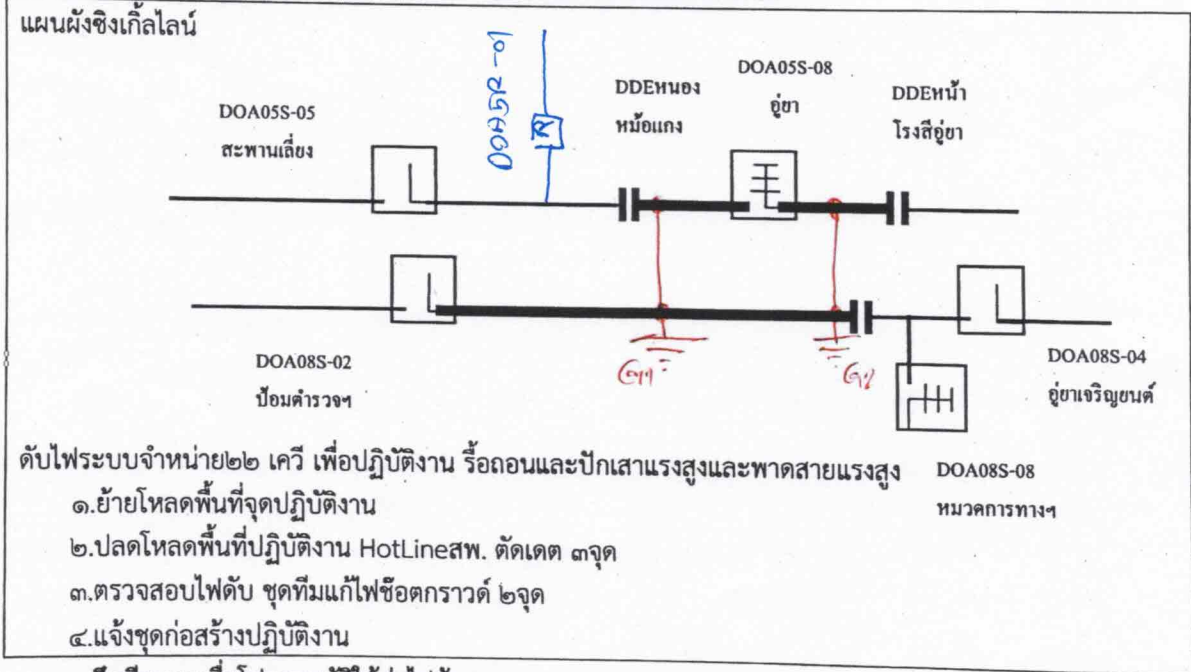

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย

อนุมัติ

(นายธนากร สุวรรณประทีป)
พชง.๖(สข.) ผบ.กฟจ.สพ.

(นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอัครเดชา)
รองผู้จัดการปฏิบัติงานแทนผู้จัดการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรี

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา
โทร. ๐๓๕-๕๓๕๑๖๗-๘ , ๑๔๘๕๕ , ๑๔๘๖๐
