



วิทยุขอตัดไฟ

06/12/67

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.กฟส.กทบ.(ปน) - ๒๔๙/๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพิทักษ์ พิชิตธรรมชวล
ชื่อผู้ส่ง นายมานิช วาสุกี

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อก.ปน.(ก๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.กทบ.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.กทบ. จะดำเนินการ ให้ชุดปฏิบัติงาน ผบ.กฟส.กทบ. ปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบไฟฟ้า บริเวณ ถนน
เลียบบคลองแสนสุข (ท้ายซอยพิวเจอร์มาร์ท) สถานีไฟฟ้า สมุทรสาคร ๑๑ (ชั่วคราว) ตามแผนผังแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	SMV ๐๔	๗ ธ.ค. ๒๕๖๗	๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ให้ชุดปฏิบัติงาน ผบ.กฟส.กทบ. ปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบไฟฟ้า บริเวณ ถนนเลียบบคลองแสนสุข (ท้ายซอยพิวเจอร์มาร์ท)	ปลดจุดเชื่อมสายแรงสูง โดยชุดออนไลน์ ที่ จุดเชื่อมไลน์แยกท้าย ซอยพิวเจอร์มาร์ท	DIS.ชั่วคราว ถนนเลียบบ คลองแสนสุข	นายฤกษ์ ชนะภัย พง.๖ ผบ. กฟส.กทบ. โทร. ๐๙๘ - ๘๓๑๕๒๗๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ตั้งแต่ ท้ายซอยพิวเจอร์มาร์ท จนถึง ซอยตันสน มีผู้ได้รับผลกระทบจากการดับไฟ จำนวน ๓๗ ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายพนพร ชาวไชยศรี ตำแหน่ง หล.ปน. กฟส.กทบ. โทร ๐๘๗ - ๖๗๑๕๖๒๖

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
- ๓. พิกัดพื้นที่ดับไฟ ๓.๑ เริ่มต้น Lat,Long : ๑๓.๖๐๘๖๒๒, ๑๐๑.๒๗๘๙๑๐
๓.๒ สิ้นสุด Lat,Long : ๑๓.๖๐๗๘๕๘, ๑๐๑.๒๗๘๖๖๙

(นายมานิช วาสุกี)
ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.กทบ.
๓ ธันวาคม ๒๕๖๗

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓
เรียน อก.ปน.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 พิดเดอร์ SMV04 จาก DDE ไลน์แยกทางของ ^{พิดเดอร์} ถึง Dis ๖๑.๑๓๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖
ในวันที่ ๗ ธ.ค. ๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1833/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ พิดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่
พนักงานศูนย์ นาย พิชิตธรรมชวล ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายพนพร ชาวไชยศรี

สำหรับผู้อนุมัติ
ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ)
เรียน อก.สฟ.(ก๓), อก.วว.(ก๓), ผจก. กฟส.กทบ.

(นายพิทักษ์ พิชิตธรรมชวล)
วตค-5 1๓๖๖ นพ.๑๗
ขั้นตอนการสวิตซ์ 2 แผ่น
แผนผังแนบ 2 แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. (สถานี)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปน.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปน.(ก๓)

หน้าที 1 จาก 2
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ถนนเลียบคลองแสนสุข (SMV04)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	7 ธ.ค. 67	เวลา	08.30 น.	ถึง	17.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.กทบ.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1833/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพีรภัทร โพธิ์พันธุ์			วันที่	6 ธันวาคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	6 ธันวาคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	6 ธันวาคม 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสุวิมล, นายอนุสรณ์, นายธนิช, นายวรรณพงษ์, นายมนโษ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพีรภัทร, นางสาวสุกษา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีร์วัชร, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการ Switching						
2	SMV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMV		-
3	SMVBR-04	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMV		R
4	SMVBR-05	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMV		R
5	ย้ายโหลด SMV04 บางส่วนไปจ่ายจาก SMV05						
6	SMV04S-04	ปลด	สับ		กทบ.		DIS ถนนเลียบคลองแสนสุข
7	DIS ชค. SMV04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กทบ.		DIS ถนนเลียบคลองแสนสุข
8	เมื่อพร้อมดับไฟ						
9	แจ้ง กฟส.กทบ. ทำการไลนโหลดช่วง DDE โล้นแยกท้ายซอยพิวเจอร์มาร์ท - DIS ชั่วคราวถนนเลียบคลองแสนสุข (วงจร SMV04) ออกทั้ง 3 เฟส						
10	เมื่อ กฟส.กทบ. ทำการไลนโหลดช่วง DDE โล้นแยกท้ายซอยพิวเจอร์มาร์ท - DIS ชั่วคราวถนนเลียบคลองแสนสุข (วงจร SMV04) ออกทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ						
11	แจ้ง กฟส.กทบ. ทำการตัด DDE โล้นแยกท้ายซอยพิวเจอร์มาร์ท (วงจร SMV04) ออกทั้ง 3 เฟส						
12	เมื่อ กฟส.กทบ. ทำการตัด DDE โล้นแยกท้ายซอยพิวเจอร์มาร์ท (วงจร SMV04) ออกทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ						
13	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
14	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G1						
15	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G2						
16	หลังจากทำการ Test ไฟ Short Ground ครบทุกจุด พร้อมลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อย						
17	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้						
18	SMV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMV		-
19	SMVBR-04	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMV		R
20	SMVBR-05	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMV		R
***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก *****							
21	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ						
22	SMV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMV		-
23	SMVBR-04	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMV		R
24	SMVBR-05	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMV		R
25	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ ปลด Short Ground จุด G1						
26	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ ปลด Short Ground จุด G2						
27	หลังจากทำการ ปลด Short Ground ออก ครบทุกจุด พร้อมยืนยันข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อย						
28	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
29	แจ้ง กฟส.กทบ. ทำการเชื่อม DDE โล้นแยกท้ายซอยพิวเจอร์มาร์ท (วงจร SMV04) เข้าทั้ง 3 เฟส						
30	เมื่อ กฟส.กทบ. ทำการเชื่อม DDE โล้นแยกท้ายซอยพิวเจอร์มาร์ท (วงจร SMV04) เข้าทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ						
31	ย้ายโหลด SMV04 บางส่วนไปจ่ายจาก SMV05						


ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
32	DIS ชด. SMV04	ปลด	สับ		กทบ.		DIS ถนนเลียบบคลองแสนสุข
33	SMV04S-04	สับ	ปลด(ใช้ไหลดบัสเตอร์)		กทบ.		DIS ถนนเลียบบคลองแสนสุข
34	SMV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMV		- -
35	SMVBR-04	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMV		R -
36	SMVBR-05	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMV		R -
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							

แผนผังสถานะปัจจุบัน ก่อนดับไฟ บริเวณ ถนนเลียบบคลองแสนสุข (ด้านหลัง บริษัท เวิลด์บิตตั้ง เท็กซีเทล จำกัด)

ตั้งแต่ ทำยซอยฟิวเจอร์มาร์ท จนถึง ซอยต้นสน

เพื่อให้ชุดงาน ผบ.กฟส.กทบ. ปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบไฟฟ้า บริเวณ ถนนเลียบบคลองแสนสุข (ทำยซอยฟิวเจอร์มาร์ท)

วันที่ปฏิบัติงาน คือ วันเสาร์ที่ 7 ธ.ค. 2567 เวลา 8.30 – 17.00 น.

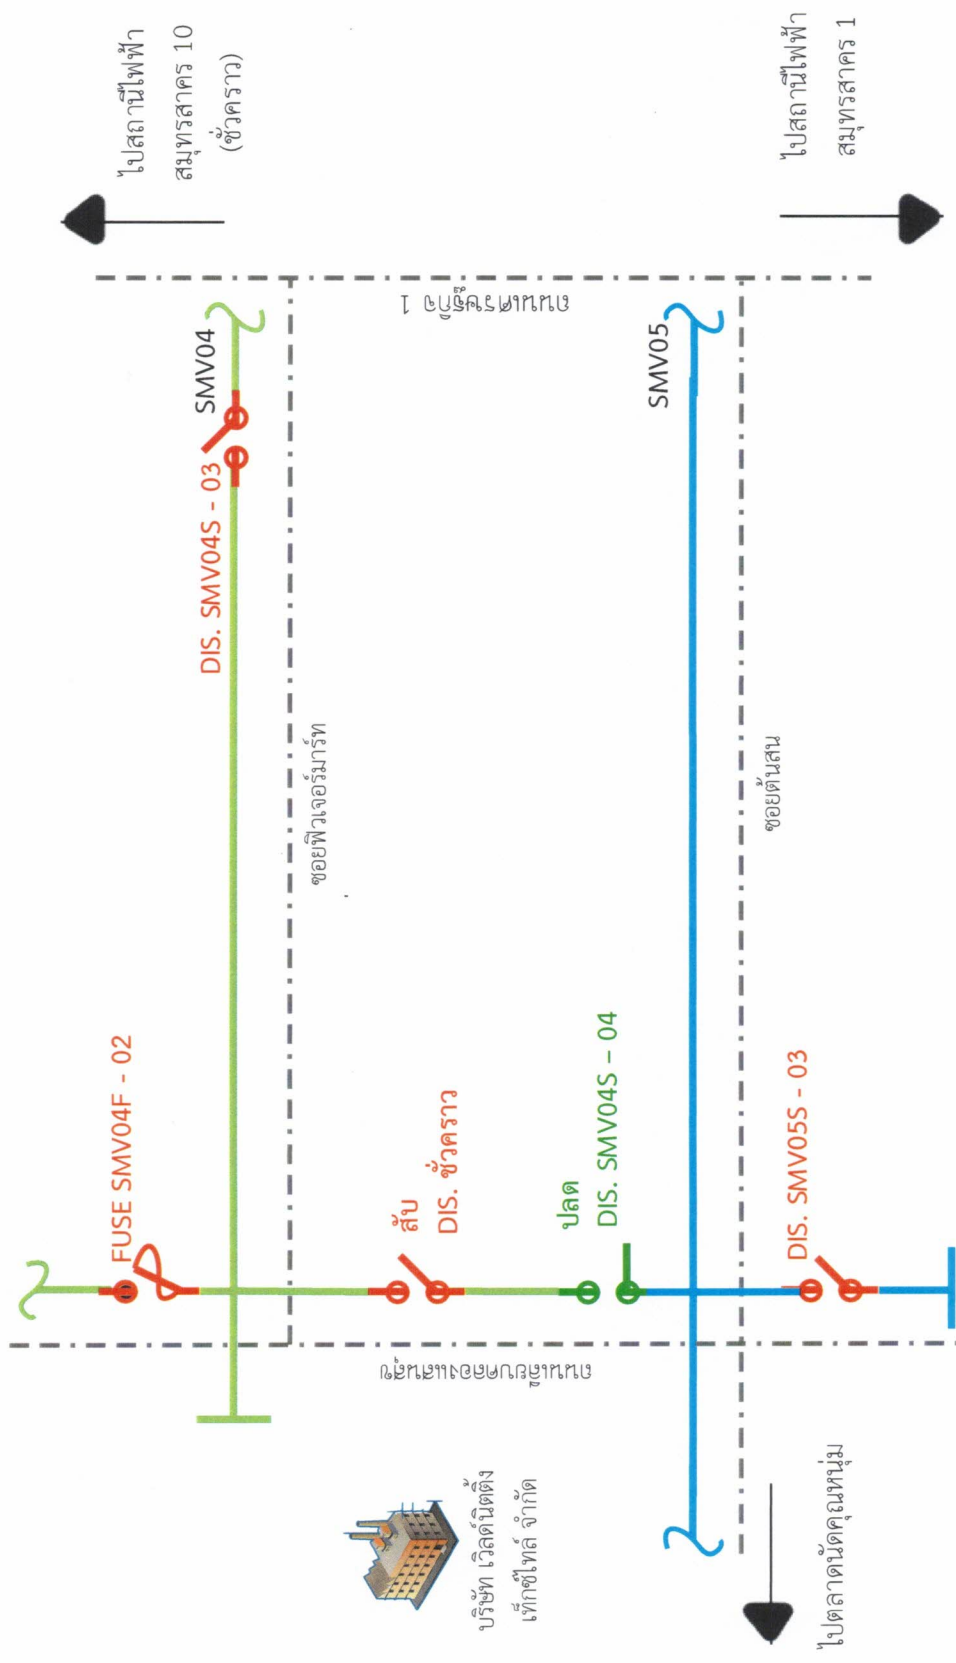

หมายเหตุ มีผู้ได้รับผลกระทบจากการดับไฟ ประมาณ 37 ราย

