



Switching Deadline

10/12/67

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
REGIONAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3.ดบ.(ปบ) 1189/2567
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี

วันที่ 3 ธ.ค. 2567
ตำแหน่ง ออ.ปบ.(ก3)
ตำแหน่ง รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.ดบ.

ด้วย กฟอ.เดิมบางนางบวช ขอตัดไฟเพื่อให้ บ.บริษัทแอนไซด์ เพาเวอร์ จำกัด ปฏิบัติงานปักเสาก่อสร้างสายส่ง ๑๑๕ เควี ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 3 แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	DBA 05	13 ธ.ค. 67	08.30 น.	17.00 น.	ปักเสาแรงสูง ๒๒ ม. เพื่องานก่อสร้างสายส่ง ๑๑๕ เควี ผังตรง	ดิสชั่วคราว ตรงข้ามเขาชะไวย	ดิสชั่วคราว ก่อนอำเภอเดิมบาง	นายอำนวยการ กิตติโพธิ์นันท์ วศก.9 กรย.
		15 ธ.ค. 67	08.30 น.	17.00 น.	ข้าม รพ.เดิมบางนางบวช	ดิสชั่วคราว ร้านขายของเก่า แยกยางนอน	ดิสชั่วคราว ตรงข้ามเขาชะไวย	(ก3) 086-2691259
		18 ธ.ค. 67	08.30 น.	17.00 น.		DBA5S-02 แยกนางบวช	ดิสชั่วคราว แยกวัดเขาชัน	
	DBA 06	13, 15 ธ.ค. 67	08.30 น.	17.00 น.		DBA 6S-02 โรงกลึงนางบวช	DBA 6S-03 หน้า สนง.ขนส่งเดิม บางนางบวช	
		18 ธ.ค. 67	08.30 น.	17.00 น.		DBA 6S-01 หน้า สฟพ.ดบ.	DBA 6S-03 หน้า สนง.ขนส่งเดิม บางนางบวช	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หมู่ที่ 5 ต.นางบวช

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวรวิทย์ ศรีศักดิ์ ตำแหน่ง ชผ.ปบ โทร 080-847-6904

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสขำรด ผคส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสขำรด ๑.๒ ไม่มีโอกาสขำรด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓. พิกัดพื้นที่ดับไฟ 3.1 เริ่มต้น Lat : ...14.857112... Long: ...100.094584.....

3.2 สิ้นสุด Lat : ... 14.80433... Long: ... 100.124706.....

ลงชื่อ.....

(นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน ออ.ปบ.(ก๓)


ตำแหน่ง รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.ดบ.

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ DBA05 จาก 11550.นครราชสีมา(อ.สูง) ๖๓. ก่อนอำเภอเดิมบาง
ในวันที่ 13 ธ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1834/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ DBA06 จาก DBA6S-02 ถึง DBA6S-03
ในวันที่ 13 ธ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 09:30 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย มีโชค ทองอ้อ ประสานงานการขอตัดไฟกับ ราชวรวิทย์ ศรีศักดิ์


.....
(นาย จิรโรจน์ บบดิษฐ์)
รศ. 5 โทร. ๒๒. ๓๓. ๓๓.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.๒๒.(คพ.)

เรียน ผจก. กฟผ.๑๒.....

อก.บช.(ก๓), อก.ว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th


ขั้นตอนการสวิชชิง 2แผ่น
แผนผังแนบ 1แผ่น

ผจพ. - (สถานี -)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.๒๒.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.๒๒.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ตรงข้าม รพ.เดิมบางนางบวช		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	13 ธ.ค. 67	ระหว่าง	08.30 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ดบ.	งานที่ทำ	ปักเสาแรงสูง 22 เมตร ตามใบขอปฏิบัติงาน 1834/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมน โทงย้อย		วันที่ 9 ธันวาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 9 ธันวาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 9 ธันวาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจรวิวัฒน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวิษฐ์, นายอมร 2. นายนครินทร์, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมน โทงย้อย		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	DBA-KT2A/KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
3	DBA-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
4	DBA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		
5	DBA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		
6	DBA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		
7	DBA05R-01	Normal	Non-Reclosing, ALT		ดบ.	R	โคกช้าง
8	DBA06R-01	Normal	Non-Reclosing, ALT		ดบ.	R	โรงสีเกาะแก้ว
9	ย้ายโหลด DBA05 บางส่วนไปรับไฟจาก DBA01						
10	DBA01S-03	ปลด	สับ		ดบ.	SCADA SF6	โรงเรียนธรรมโชติ
11	DBA05S-09	สับ	ปลด		ดบ.	SCADA SF6	หน้า รพ.เดิมบางนางบวช
12	ย้ายโหลด DBA05 บางส่วนไปรับไฟจาก DBA06						
13	DBA05S-05	ปลด	สับ		ดบ.	DIS	ตลาดนัดโคกช้าง
14	DBA05R-01	สับ	ปลด		ดบ.	R	โรงสีเกาะแก้ว
15	แจ้ง กฟส.ดบ. ปลดสวิตซ์ไบเมตดำนโหลดของ DBA05R-01 ออกทั้งสามเฟส						
16	ย้ายโหลด DBA06 บางส่วนไปรับไฟจาก DBA05						
17	DBA05S-08	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ดบ.	SF6	โรงสีบุญเจริญ
18	DBA06S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ดบ.	SF6	หน้าขนส่งเดิมบาง
19	เปลี่ยนทางจ่ายไฟ DBA05						
20	DBA05S-04	ปลด	สับ		ดบ.	SF6	ข้างขนส่ง
21	Dis ชด.ในไลน์ DBA05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดบ.	DIS	ก่อนอำเภอเดิมบางนางบวช
22	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.30 น.						
23	Dis ชด.ในไลน์ DBA05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดบ.	DIS	ตรงข้ามเขาชะไอย
24	DBA06S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ดบ.	SCADA SF6	โรงกลิ้งนางบวช
25	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ กฟส.ดบ. รับทราบ						
26	แจ้งชุดปฏิบัติงาน กฟส.ดบ. ทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G1						
27	แจ้งชุดปฏิบัติงาน กฟส.ดบ. ทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G2						
28	แจ้งชุดปฏิบัติงาน กฟส.ดบ. ทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G3						
29	แจ้งชุดปฏิบัติงาน กฟส.ดบ. ทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G4						
30	เมื่อ กฟส.ดบ. ทำการ Test ไฟ และ Short Ground พร้อมลงข้อมูลใน WeSafe เรียบร้อยแล้ว แจ้งให้ชุดปฏิบัติงานได้						
31	DBA-KT2A/KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
32	DBA-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
33	DBA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
34	DBA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA			
35	DBA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA			
36	DBA06R-01	Non-Reclosing, ALT	Normal		ดบ.		R	โรงสีเกาะแก้ว
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า								
37	เมื่อ กฟส.ดบ. แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
38	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง							
39	แจ้งชุดปฏิบัติงาน กฟส.ดบ. ทำการปลด Short Ground จุด G1							
40	แจ้งชุดปฏิบัติงาน กฟส.ดบ. ทำการปลด Short Ground จุด G2							
41	แจ้งชุดปฏิบัติงาน กฟส.ดบ. ทำการปลด Short Ground จุด G3							
42	แจ้งชุดปฏิบัติงาน กฟส.ดบ. ทำการปลด Short Ground จุด G4							
43	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง							
44	DBA-KT2A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT			
45	DBA-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT			
46	DBA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA			
47	DBA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA			
48	DBA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA			
49	DBA06R-01	Normal	Non-Reclosing, ALT		ดบ.		R	โรงสีเกาะแก้ว
50	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ							
51	Dis ชค.ในไลน์ DBA05	ปลด	สับ		ดบ.		DIS	ตรงข้ามเขาชะไย
52	DBA06S-02	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ดบ.	SCADA	SF6	โรงกลึงนางบวช
53	ย้ายโหลด DBA05 กลับสภาพปกติ							
54	Dis ชค.ในไลน์ DBA05	ปลด	สับ		ดบ.		DIS	ก่อนอำเภอดงเดิมบางนางบวช
55	DBA05S-04	ปลด	สับ		ดบ.	SCADA	SF6	ข้างขนส่ง
56	ย้ายโหลด DBA06 บางส่วนกลับจาก DBA05							
57	DBA06S-03	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ดบ.		SF6	หน้าขนส่งเดิมบาง
58	DBA05S-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ดบ.		SF6	โรงสีบุญเจริญ
59	ย้ายโหลด DBA05 บางส่วนกลับจาก DBA06							
60	แจ้ง กฟส.ดบ. สับสวิตซ์ใบมีดด้านโหลดของ DBA05R-01 เข้าทั้งสามเฟส							
61	DBA05R-01	ปลด	สับ คง Non Reclosing,ALT		ดบ.		R	โรงสีเกาะแก้ว
62	DBA05S-05	ปลด	สับ		ดบ.		DIS	ตลาดนัดโคกช้าง
63	ย้ายโหลด DBA05 บางส่วนกลับจาก DBA01							
64	DBA05S-09	ปลด	สับ		ดบ.	SCADA	SF6	หน้า รพ.เดิมบางนางบวช
65	DBA01S-03	สับ	ปลด		ดบ.	SCADA	SF6	โรงเรียนธรรมโชติ
66	DBA-KT2A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			
67	DBA-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			
68	DBA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA			
69	DBA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA			
70	DBA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA			
71	DBA05R-01	Non-Reclosing, ALT	Normal		ดบ.		R	โคกช้าง
72	DBA06R-01	Non-Reclosing, ALT	Normal		ดบ.		R	โรงสีเกาะแก้ว
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด								



บริษัท ศรีชลธร จำกัด

15/20 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทร : 02-102-857-3 แฟกซ์ 02-102-857-3 อีเมล info@srichonlathorn.com

www.srichonlathorn.com

กฟอ.เดิมบางนางบวช
เลขที่รับ.....6077
วันที่.....25.ค.2567

SCT-CM-24-1232

วันที่ 2 ธันวาคม 2567

โครงการ งานก่อสร้างระบบส่งไฟฟ้า 115 เควี ให้แก่ บริษัท บริษัทแอนดีไซน์ เพาเวอร์ จำกัด
จังหวัดสุพรรณบุรี (งานเพิ่มช่วง AB)

เรื่อง ขอแจ้งกำหนดการดับไฟ 115 เควี และ 22 เควี เพื่อทำการปักเสาและพาดสายไฟ

เรียน ผู้จัดการโครงการ PEA ENCOM (นายอุเทน พรหมอินคำ)

สำเนาเรียน ผู้ควบคุมงาน (นายอำนาจ กิตติโพธิ์นันท์ วศก.9 กบล.(ก.๓))
นายฉลอง โพธิ์ทอง (ผจก.กฟส.อ.เดิมบางนางบวช)

อ้างอิงสัญญา สัญญาเลขที่ จจ.(นทค.) BASP-SCT - 2/2566 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนงานขอดับไฟเพื่อปักเสาไฟ 22 เมตร จำนวน 1 ชุด


ตามที่อ้างอิง บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ตกลงว่าจ้าง บริษัท ศรีชลธร จำกัด ให้ดำเนินการงานก่อสร้างระบบส่งไฟฟ้า 115 เควี ให้แก่ บริษัท บริษัทแอนดีไซน์ เพาเวอร์ จำกัด จังหวัดสุพรรณบุรี (งานเพิ่มช่วง AB) นั้น

บริษัท ศรีชลธร จำกัด ขอแจ้งกำหนดการดับไฟ 115 เควี และ 22 เควี เพื่อทำการปักเสาไฟและพาดสายไฟ ในระหว่างวันที่ 13-23 ธันวาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. บริเวณถนนทางหลวงหมายเลข 304 ช่วง P2-P148 อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. งานปักเสาไฟและพาดสายไฟ ช่วง P118-P147 วันที่ 13 ธ.ค.67 ดับไฟระบบ 22 เควี
2. งานปักเสาไฟ ช่วง P83-P117 วันที่ 15 ธ.ค.67 ดับไฟระบบ 22 เควี
3. งานปักเสาไฟ ช่วง P23-P38 วันที่ 18 ธ.ค.67 ดับไฟระบบ 22 เควี
4. งานปักเสาไฟ ช่วง P2-P22 วันที่ 22 ธ.ค.67 ดับไฟระบบ 22 เควี
5. งานปักเสาไฟ ช่วง P148 วันที่ 23 ธ.ค.67 ดับไฟระบบ 22 และ 115 เควี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


เรียน ผจก.กฟส.เดิมบางนางบวช
เพื่อโปรดแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการ
ให้ต่อไป


๒ ธ.ค. ๒๕๖๗

(นายอำนาจ กิตติโพธิ์นันท์)
วศก.๙ กบล.(ก.๓) ผู้ควบคุมงาน

เจ้าหน้าที่บริหารสัญญา
คุณกัญญ์วรินทร์ วงษ์สนอง
093-329-8963

ขอแสดงความนับถือ





นายพรภัทร สือขจร
ผู้จัดการโครงการ

- ผบ.
ดำเนินการต่อไป


(นายฉลอง โพธิ์ทอง)

ผจก.กฟส.เดิมบางนางบวช
- 2 ธ.ค. 2567


๗ ธ.ค. ๒๕๖๗

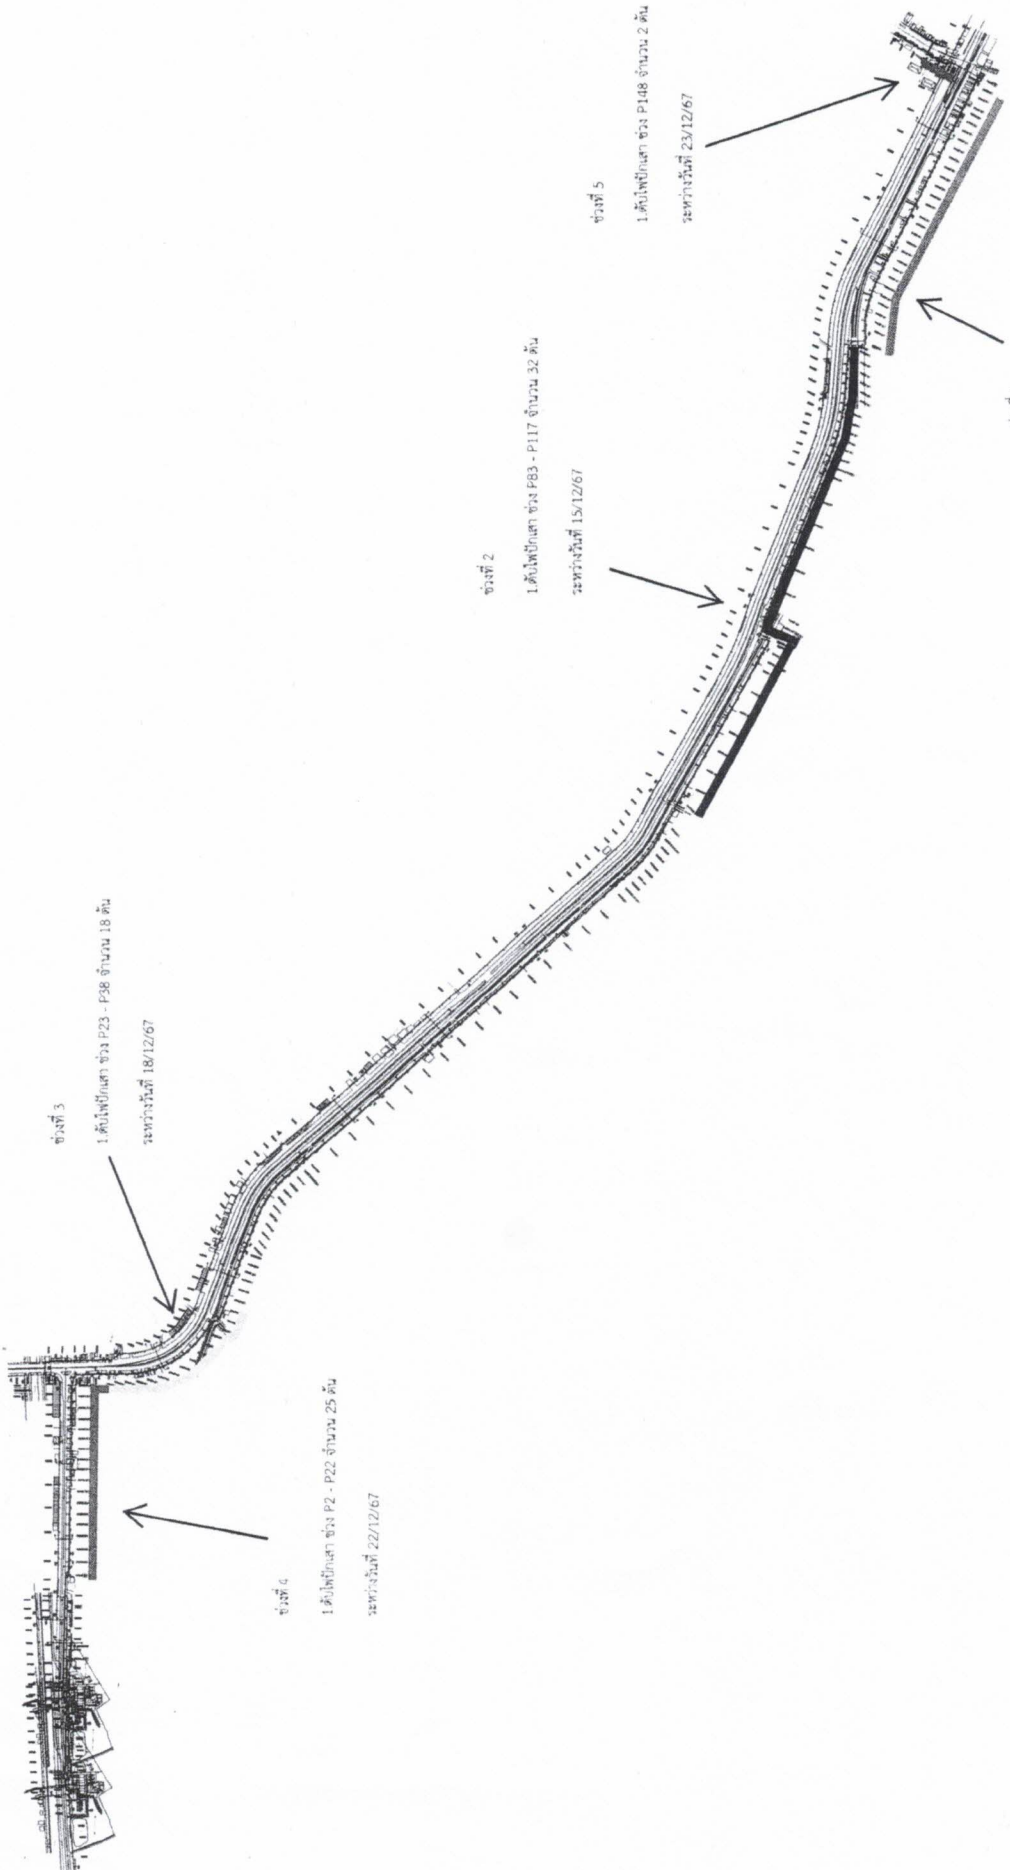

ช่วงที่ 3

1. ส่วนโพนื้คทา ช่วง P23 - P28 จำนวน 18 คัน

ระหว่างวันที่ 18/12/67

ช่วงที่ 4

1. ส่วนโพนื้คทา ช่วง P2 - P22 จำนวน 25 คัน

ระหว่างวันที่ 22/12/67

ช่วงที่ 2

1. ส่วนโพนื้คทา ช่วง P83 - P117 จำนวน 32 คัน

ระหว่างวันที่ 15/12/67

ช่วงที่ 5

1. ส่วนโพนื้คทา ช่วง P148 จำนวน 2 คัน

ระหว่างวันที่ 23/12/67

ช่วงที่ 1

1. ส่วนโพนื้คทา ช่วง P118 - P147 จำนวน 6 คัน

2. งานพาดสาย AAC100 ช่วง P118 - P147

ระหว่างวันที่ 13/12/67
