



วิทยุขอดับไฟ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ บพล.(ปบ) ๐๓๕๖ / ๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายทัศนันท์ พิศราสุวรรณชัย
ชื่อผู้ส่ง นายนรินทร์ เข้มทอง
จำนวนเอกสารแนบ ๓ แผ่น

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.บพล.

ด้วยการไฟฟ้า อ.บ่อพลอย จะขอดับอนุมัติดับกระแสไฟฟ้าเพื่อการปฏิบัติงาน สับเปลี่ยน SF๖ และซ่อมแซมระบบจำหน่าย

สถานีไฟฟ้า บ่อพลอย ๒ (ชั่วคราว) ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	สถานีบ่อพลอย ๒ (ชั่วคราว) ฟีดเดอร์ ๑-๔	๒๒ พ.ย. ๖๕	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	สับเปลี่ยน SF๖ และซ่อมแซมระบบจำหน่าย	หัว Pot Head F๑ ถึง F๔	จุดตัดเด็ดตามผัง POP 4S-12	นายประพัทธ์ เพชรวิโรจน์ชัย โทร. ๐๘๔-๗๒๗-๗๘๒๑

มีงานข้างเคียงหมายเลข 1806

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายทัตเทพ เปล่งสงคราม ตำแหน่ง พชง.๖ โทร. ๐๘๕-๒๕๓๑๙๖๔

ผู้ประสานงานหน้างาน ชื่อ นายประพัทธ์ เพชรวิโรจน์ชัย ตำแหน่ง พชง.๖ โทร. ๐๘๔-๗๒๗-๗๘๒๑

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟล.(หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

นายนรินทร์ เข้มทอง

ตำแหน่ง

ผจก.กฟอ.บ่อพลอย

๑๔ พ.ย. ๒๕๖๕

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

✓ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พัดเตอร์

80015-01

80025-01

80035-01

80045-01

DDE ตามผังแนบ, BOP4S-12

ในวันที่ 22 พ.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิ่งเลขที่ 1834/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเตอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเตอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเตอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเตอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย **อมร โมกข์พันธ์** ประสานงานขอดับไฟกับ **นครินทร์เทพ ทรัพย์สมบูรณ์**
19 พ.ย. 65

รศพร ตันธักกชกรกิจ
รศพร ตันธักกชกรกิจ
วอ. > ปฏิบัติงาน แทน นศ.อ.ป.

ผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. **รพอ. มทว., รพจ. นปร.**

อก.วว.(ก.๓)

ขั้นตอนทำสวิตชิ่ง 3 แผ่น

แผนผังแนบ ๒ แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจฟ.....(สถานี.....)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับ
ศูนย์นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น. เป็นต้นไปจนกว่างาน
จะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง


1. สถานที่ทำงาน	บริเวณหน้าสถานีบ่อพลอย 2					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	22 พ.ย. 65	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	17.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.บพล.	งานที่ทำ	เปลี่ยน SF6 และปรับปรุงระบบจำหน่าย		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1834/2565
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอมร โมกขพันธ์			วันที่	20 พฤศจิกายน 2565	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	20 พฤศจิกายน 2565	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	20 พฤศจิกายน 2565	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> นายสถาพร,นายพิชชา,นายสุธี,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) นายนครินทร์,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมโนช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	งานข้างเคียงหมายเลข 1806 (ดับไฟหม้อแปลง TP1 สถานี บ่อพลอย 2 (ชั่วคราว) เพื่อติดตั้งระบบ ATS 400 Vac)						
3	BOP05R-03	Normal	Nonreclosing		หปร.		R AVR. ทนองรี
4	DAA06R-01	Normal	Nonreclosing		ดช.		AVR บ.เขาช่องคับ
5	DAA09R-01	Normal	Nonreclosing		ดช.		AVR ทุ่งแสม
6	หลังจากสวิตชิงหมายเลข 1806 แล้วเสร็จตรวจสอบสถานะ BOU01S-01,2S-01,3S-01,4S-01 อยู่ตำแหน่ง "ปลด"						
7	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน เวลา 08.30 น						
8	BOP04S-12	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		หปร.		SF6 บ้านหนองไม้เอื้อย
9	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการไล่น้ำมันหม้อแปลงในระบบออกทั้ง 3 เฟส (วงจร BOU1,BOU2,BOU4)						
10	แจ้งชุดฮอตไลน์กระเช้า ทำการตัด DDE วงจร BOU01 บริเวณหน้าบึงตราดาว ออกทั้ง 3 เฟส						
11	แจ้งชุดฮอตไลน์กระเช้า ทำการตัด DDE วงจร BOU02 บริเวณหน้าศาลเจ้า ออกทั้ง 3 เฟส						
12	แจ้งชุดฮอตไลน์กระเช้า ทำการตัด DDE วงจร BOU04 บริเวณหน้าครัวบ้านเจ้าหนึ่ง ออกทั้ง 3 เฟส						
13	หลังจากชุดฮอตไลน์ ดำเนินการแล้วเสร็จ						
14	แจ้ง กฟอ.บพล. ทำการทดสอบไฟ, ซ็อตกราวด์จุด G1						
15	แจ้ง กฟอ.บพล. ทำการทดสอบไฟ, ซ็อตกราวด์จุด G2						
16	แจ้ง กฟอ.บพล. ทำการทดสอบไฟ, ซ็อตกราวด์จุด G3						
17	แจ้ง กฟอ.บพล. ทำการทดสอบไฟ, ซ็อตกราวด์จุด G4						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
18	แจ้ง กฟอ.บพล. ทำการทดสอบ, ข้อตรวจวัดจุด G5						
19	แจ้ง กฟอ.บพล. ทำการทดสอบ, ข้อตรวจวัดจุด G6						
20	แจ้ง กฟอ.บพล. ทำการทดสอบ, ข้อตรวจวัดจุด G7						
21	แจ้ง กฟอ.บพล. ทำการทดสอบ, ข้อตรวจวัดจุด G8						
22	หลังจาก กฟอ.บพล. ดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย						
23	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ กฟอ.บพล. รับทราบและปฏิบัติงานได้						
24	BOP05R-03	Nonreclosing	Normal		หปร.		R AVR. ทนงรี
25	DAA06R-01	Nonreclosing	Normal		ดช.		AVR บ.เขาช่องคับ
26	DAA09R-01	Nonreclosing	Normal		ดช.		AVR ทุงแสม
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
27	เมื่อ กฟอ.บพล. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
28	BOP05R-03	Normal	Nonreclosing		หปร.		R AVR. ทนงรี
29	DAA06R-01	Normal	Nonreclosing		ดช.		AVR บ.เขาช่องคับ
30	DAA09R-01	Normal	Nonreclosing		ดช.		AVR ทุงแสม
31	แจ้ง กฟอ.บพล. ทำการปลดข้อตรวจวัดจุด G1						
32	แจ้ง กฟอ.บพล. ทำการปลดข้อตรวจวัดจุด G2						
33	แจ้ง กฟอ.บพล. ทำการปลดข้อตรวจวัดจุด G3						
34	แจ้ง กฟอ.บพล. ทำการปลดข้อตรวจวัดจุด G4						
35	แจ้ง กฟอ.บพล. ทำการปลดข้อตรวจวัดจุด G5						
36	แจ้ง กฟอ.บพล. ทำการปลดข้อตรวจวัดจุด G6						
37	แจ้ง กฟอ.บพล. ทำการปลดข้อตรวจวัดจุด G7						
38	แจ้ง กฟอ.บพล. ทำการปลดข้อตรวจวัดจุด G8						
39	หลังจาก กฟอ.บพล. ดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย						
40	จ่ายไฟคืนสู่ระบบ						
41	แจ้งชุดฮอตไลน์กระเช้า ทำการเชื่อม DDE วงจร BOU01 บริเวณหน้าป้อมตราดาว เข้าทั้ง 3 เฟส						
42	แจ้งชุดฮอตไลน์กระเช้า ทำการเชื่อม DDE วงจร BOU02 บริเวณหน้าศาลเจ้า เข้าทั้ง 3 เฟส						
43	แจ้งชุดฮอตไลน์กระเช้า ทำการเชื่อม DDE วงจร BOU04 บริเวณหน้าครัวบ้านเจ้หนิง เข้าทั้ง 3 เฟส						
44	หลังจากชุดฮอตไลน์ ดำเนินการแล้วเสร็จ						
45	BOP04S-12	ปลด, ล็อคคาน	สับ		หปร.		SF6 บ้านหนองไม้เอื้อย

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
46	BOP05R-03	Nonreclosing	Normal		หปร.		R AVR. หนองรี
47	DAA06R-01	Nonreclosing	Normal		ดช.		AVR บ.เขาช่องคืบ
48	DAA09R-01	Nonreclosing	Normal		ดช.		AVR พุ่งแสม
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

สถานะการจ่ายไฟก่อนปฏิบัติงาน

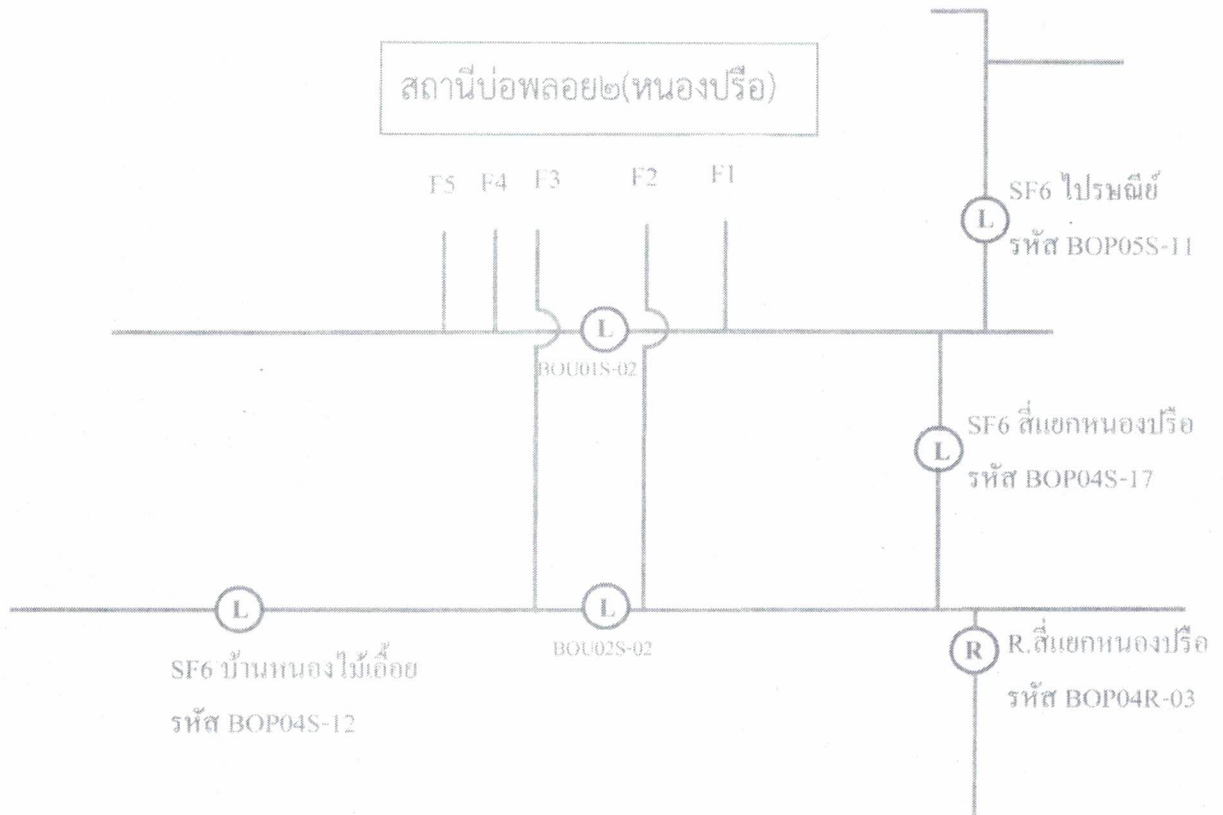

สถานะการจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน

