



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

11/12/67

เลขที่ ก.3.ดบ.(ปบ) 1189/2567
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายสมนัตติ ยศศักดิ์ศรี

วันที่ 3 ธ.ค. 2567
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)
ตำแหน่ง รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.ดบ.

ด้วย กฟอ.เดิมบางนางบวช ขอตัดไฟเพื่อให้ บ.ปรีชแอนไฮด์ เพาเวอร์ จำกัด ปฏิบัติงานปักเสาก่อสร้างสายส่ง ๑๑๕ เควี ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 3 แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	DBA 05	13 ธ.ค. 67	08.30 น.	17.00 น.	ปักเสาแรงสูง ๒๒ ม. เพื่องานก่อสร้างสายส่ง ๑๑๕ เควี ผังตรง	ดิสชั่วคราว ตรงข้ามเขาชะไอย	ดิสชั่วคราว ก่อนอำเภอเดิมบาง	นายอำนาจ กิตติโพธิ์นันท์ วศก.9 กฤษฎ.
2		15 ธ.ค. 67	08.30 น.	17.00 น.	ข้าม รพ.เดิมบางนางบวช	ดิสชั่วคราว ร้านขายของเก่า แยกนางนอน	ดิสชั่วคราว ตรงข้ามเขาชะไอย	(ก3) 086-2691259
3		18 ธ.ค. 67	08.30 น.	17.00 น.		DBA55-02 แยกนางบวช	ดิสชั่วคราว แยกวัดเขาขี้	
4	DBA 06	15 ธ.ค. 67	08.30 น.	17.00 น.		DBA 6S-02 โรงกลึงนางบวช	DBA 6S-03 หน้า สนง.ขนส่งเดิม บางนางบวช	
5		18 ธ.ค. 67	08.30 น.	17.00 น.		DBA 6S-01 หน้า สฟพ.ดบ.	DBA 6S-03 หน้า สนง.ขนส่งเดิม บางนางบวช	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หมู่ที่ 5 ต.นางบวช

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวรวิทย์ ศรีศักดิ์ ตำแหน่ง ชผ.ปบ โทร 080-847-6904

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสขำรด ผศส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสขำรด ๑.๒ ไม่มีโอกาสขำรด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓. พิกัดพื้นที่ดับไฟ 3.1 เริ่มต้น Lat : ...14.857112... Long: ...100.094584...
3.2 สิ้นสุด Lat : ... 14.80433... Long: ... 100.124706.....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ลงชื่อ.....
(นายสมนัตติ ยศศักดิ์ศรี)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.ดบ.

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พิดเดอร์ DBA5 จาก Div. 31 พบคนบวช ถึง Div. ตรงข้ามเขาชะไอย
ในวันที่ 15 ธ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1835/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 4 พิดเดอร์ DBA6 จาก DBA6S-02 ถึง DBA6S-03
ในวันที่ 15 ธ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อรุณ อรุณพงษ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ ผบ.อรรถ ธีรศักดิ์

อนุวัติ
(นายอนุวัติ เทียนทอง)
211-5 กก. นพ. นพ. นพ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปป.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ.๑๖.

อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. - (สถานี -)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายอนุวัติ เทียนทอง)

รท.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ไลน์ DBA05,06 บริเวณ DIS.ชค.ร้านขายของเก่า,DBA06S-02 ถึง DIS.ชค.ตรงข้ามเขาชะไอย,DBA06S-03		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	15 ธ.ค. 67	ระหว่าง	08.30 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ตบ.	งานที่ทำ	ปักเสาแรงสูง 22 เมตร ตามใบขอปฏิบัติงาน 1835/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์		วันที่ 11 ธันวาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 11 ธันวาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 11 ธันวาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจิรวัดน์,นายวัฒน์,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร 2. นายนครินทร์,น.ส.พิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ 3. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายวรรณพงษ์,นายมนโษ		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	DBA-KT2A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
3	DBA-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
4	DBA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		
5	DBA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		
6	DBA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		
7	- ย้ายโหลด DBA05 ไปรับไฟจาก DBA01						
8	DBA01S-03	ปลด	สับ		ตบ.	SCADA	SF6 โรงเรียนธรรมโชติ
9	DBA05S-09	สับ	ปลด		ตบ.	SCADA	SF6 หน้า รพ.เดิมบางนางบวช
10	- ย้ายโหลด DBA06 ไปรับไฟจาก DBA05						
11	DBA05S-08	ปลด	สับ		ตบ.		SF6 โรงสีบุญเจริญ
12	DBA06S-03	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		ตบ.		SF6 หน้าขนส่งเดิมบาง
13	- ย้ายโหลด DBA05 ไปรับไฟจาก DBA06						
14	DBA05S-04	ปลด	สับ		ตบ.		SF6 ช่างขนส่งเดิมบาง
15	Dis ชค.ในไลน์ DBA05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ตบ.		DIS ตรงข้ามเขาชะไอย
16	- ดับไฟไลน์ DBA05,06 เวลา 08.30 น.						
17	Dis ชค.ในไลน์ DBA05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ตบ.		DIS ร้ายขายของเก่าแยกนางนอน
18	DBA06S-02	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		ตบ.	SCADA	SF6 โรงกลิ้งนางบวช
19	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้กฟส.ตบ.รับทราบ * keep วงกัน DBN HT1A 9ต่อ5/ที่ 23.00kv						
20	แจ้งกฟส.ตบ.ทำการ Test ไฟดับแล้ว Short Ground จุด G1						
21	แจ้งกฟส.ตบ.ทำการ Test ไฟดับแล้ว Short Ground จุด G2						
22	แจ้งกฟส.ตบ.ทำการ Test ไฟดับแล้ว Short Ground จุด G3						
23	แจ้งกฟส.ตบ.ทำการ Test ไฟดับแล้ว Short Ground จุด G4						
24	แจ้งกฟส.ตบ.ลงข้อมูลใน WeSafe ก่อนปฏิบัติงาน						
25	แจ้งกฟส.ตบ.ปฏิบัติงานได้ทุกชุด						
26	DBA-KT2A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
27	DBA-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
28	DBA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		


ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ส่งการ	หมายเหตุ
29	DBA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		
30	DBA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		
%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%							
31	หลังพส.ตบ.ปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด						
32	แจ้งกพส.ตบ.ทำการปลด Short Ground จุด G1 ออก						
33	แจ้งกพส.ตบ.ทำการปลด Short Ground จุด G2 ออก						
34	แจ้งกพส.ตบ.ทำการปลด Short Ground จุด G3 ออก						
35	แจ้งกพส.ตบ.ทำการปลด Short Ground จุด G4 ออก						
36	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิชชิง						
37	DBA-KT2A/KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
38	DBA-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
39	DBA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		
40	DBA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		
41	DBA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		
42	- จ่ายไฟ						
43	Dis ชด.ไนไลน์ DBA05	ปลด	สับ		ดบ.		DIS ร้ายขายของเก่าแยกนางนอน
44	DBA06S-02	ปลด	สับ		ดบ.	SCADA	SF6 โรงกลึงนางบวช
45	- ย้ายโหลด DBA05 กลับคืนจาก DBA06						
46	Dis ชด.ไนไลน์ DBA05	ปลด	สับ		ดบ.		DIS ตรงข้ามเขาชะโอย
47	DBA05S-04	สับ	ปลด		ดบ.		SF6 ช่างขนส่งเดิมบาง
48	- ย้ายโหลด DBA06 กลับคืนจาก DBA05						
49	DBA06S-03	ปลด	สับ		ดบ.		SF6 หน้าขนส่งเดิมบาง
50	DBA05S-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ดบ.		SF6 โรงสีบุญเจริญ
51	- ย้ายโหลด DBA05 กลับคืนจาก DBA01						
52	DBA05S-09	ปลด	สับ		ดบ.	SCADA	SF6 หน้า รพ.เดิมบางนางบวช
53	DBA01S-03	สับ	ปลด		ดบ.	SCADA	SF6 โรงเรียนธรรมโชติ
54	DBA-KT2A/KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
55	DBA-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
56	DBA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		
57	DBA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		
58	DBA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		
%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%							

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ที่ตัดไฟฟ้า เพื่องานก่อสร้างสายส่ง 115 เควี

วงจร DBA05บริเวณ Disชั่วคราวร้านขายของเก่าแยกยางนอน ถึงDis ชั่วคราวตรงข้ามเขาชะรอย

วงจร DBA06บริเวณ DBA6S-02 โรงกลิ้งนางบัวช ถึงDBA6S-03 หน้า ถนนชนส่งเดิมบางนางบัวช

ในวันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 17.00 น.

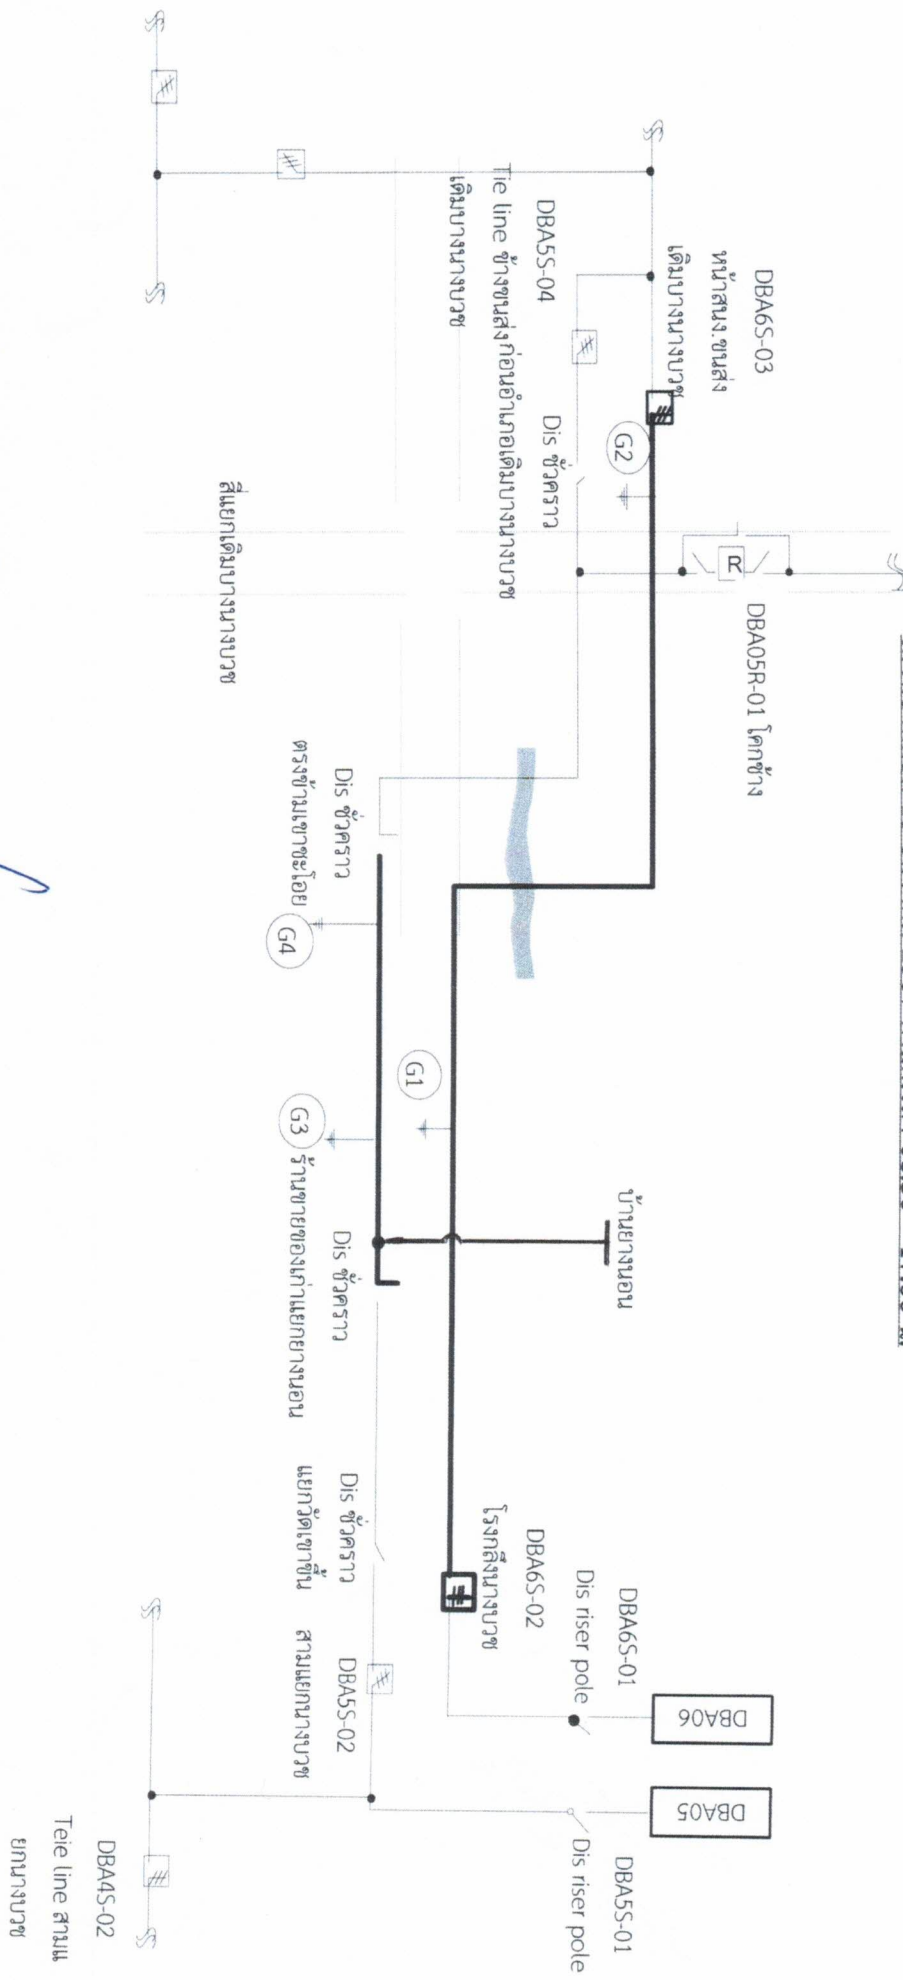

สถานะ การจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน

[Handwritten signature]

วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 17.00 น.

ตัดไฟเพื่อให้ บ.บริษัทแอนตี้ไซ พาวเวอร์ จำกัด ปิดเสาก่อสร้างสายส่ง 115 เควี
 ทหารายเขต **—** บริเวณที่ตัดไฟปฏิบัติงาน
