



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3.ตบ.(ปน) 1189/2567
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พธิราสุวรรณิชล
ชื่อผู้ส่ง นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี

Switching Deadline

13/12/67

วันที่ 3 ธ.ค. 2567
ตำแหน่ง อ.ก.ปน.(ก3)
ตำแหน่ง ร.จก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.ตบ.

ด้วย กฟอ.เดิมบางนางบวช ขอตัดไฟเพื่อให้ บ.บริษัทแอนไซด์ เพาเวอร์ จำกัด ปฏิบัติงานปักเสาก่อสร้างสายส่ง ๑๑๕ เควี ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 3 แผน ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	DBA 05	13 ธ.ค. 67	08.30 น.	17.00 น.	ปักเสาแรงสูง ๒๒ ม. เพื่องานก่อสร้างสายส่ง ๑๑๕ เควี ฝั่งตรงข้าม รพ.เดิมบางนางบวช	ดิสชั่วคราว ตรงข้ามเขาชะโอย	ดิสชั่วคราว ก่อนอำเภอเดิมบาง	นายอำนาจ กิตติโพธิ์นันท์ วศก.9 กรย. (ก3) 086-2691259
		15 ธ.ค. 67	08.30 น.	17.00 น.		ดิสชั่วคราว ร้านขายของเก่า แยกยางนอน	ดิสชั่วคราว ตรงข้ามเขาชะโอย	
		18 ธ.ค. 67	08.30 น.	17.00 น.		DBA55-02 แยกนางบวช	ดิสชั่วคราว แยกวัดเขาชัน	
	DBA 06	13, 15 ธ.ค. 67	08.30 น.	17.00 น.		DBA 65-02 โรงกลึงนางบวช	DBA 65-03 หน้า สนง.ขนส่งเดิม บางนางบวช	
		18 ธ.ค. 67	08.30 น.	17.00 น.		DBA 65-01 หน้า สฟพ.ตบ.	DBA 65-03 หน้า สนง.ขนส่งเดิม บางนางบวช	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หมู่ที่ 5 ต.นางบวช

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวรวิทย์ ศรีศักดิ์ตา ตำแหน่ง ชผ.ปน โทร. 080-847-6904

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓. พิกัดพื้นที่ดับไฟ 3.1 เริ่มต้น Lat : ...14.857112... Long: ...100.094584.....

3.2 สิ้นสุด Lat : ... 14.80433... Long: ... 100.124706.....

ลงชื่อ.....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปน.(ก๓)

(นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี)

ตำแหน่ง ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.ตบ.

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ DBA5 จาก DBA55-02 ถึง Dis ต. หนองวัดเหนือ
ในวันที่ 18 ธ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1836/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ DBA6 จาก DBA65-01 ถึง DBA65-03
ในวันที่ 18 ธ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1836/67

พนักงานศูนย์ฯ นาย อภิรักษ์ อุ่นใจ

ประสานงานการขอตัดไฟกับ อ.ท.วรวิทย์ ศรีศักดิ์ตา

(นางสาวหิษา พงษ์ศิริ
วศก.5 ททท.นช.คพ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คพ.)

เรียน ผจก. กฟภ.๑๒.

อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th



ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจพ. (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ไลน์ DBA05,06 บริเวณ DIS.ชค.แยกวัดเขาขึ้น,DBA06S-01 ถึง DBA05S-02,DBA06S-03					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	18 ธ.ค. 67	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	17.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ตบ.	งานที่ทำ	ก่อสร้างสายส่ง 115 เควี	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1836/2567	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายณัฐกาญจน์ ร่มโพธิ์ทอง			วันที่	12 ธันวาคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	12 ธันวาคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	12 ธันวาคม 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจรัสวัฒน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร 2. นายนครินทร์,น.ส.พิชยา,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ 3. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายวรรณพงษ์,นายโมซ			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)		
				(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)		
				(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	DBA-KT2A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
3	DBA-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
4	DBA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		
5	DBA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		
6	DBA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		
7	- ย้ายโหลด DBA05 ไปรับไฟจาก DBA01						
8	DBA01S-03	ปลด	สับ		ดบ.	SCADA	SF6 โรงเรียนธรรมโชติ
9	DBA05S-09	สับ	ปลด		ดบ.	SCADA	SF6 หน้า รพ.เดิมบางนางบวช
10	- ย้ายโหลด DBA06 ไปรับไฟจาก DBA05						
11	DBA05S-08	ปลด	สับ		ดบ.		SF6 โรงสีบุญเจริญ
12	DBA06S-03	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		ดบ.		SF6 หน้าขนส่งเดิมบาง
13	- ย้ายโหลด DBA05 ไปรับไฟจาก DBA06						
14	DBA05S-04	ปลด	สับ		ดบ.		SF6 ช่างขนส่งเดิมบาง
15	Dis ชค.โนไลน์ DBA05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดบ.		DIS แยกวัดเขาขึ้น
16	- ดับไฟไลน์ DBA05,06 เวลา 08.30 น.						
17	DBA05S-02	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		ดบ.		SF6 สามแยกนางบวช
18	DBA06VB-01	สับ	ปลด		DBA		CB
19	DBA06S-01	สับ	ปลด		ดบ.		DIS Pothead F6
20	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้กฟส.ตบ.รับทราบ						
21	แจ้งกฟส.ตบ.ทำการ Test ไฟดับแล้ว Short Ground จุด G1						
22	แจ้งกฟส.ตบ.ทำการ Test ไฟดับแล้ว Short Ground จุด G2						
23	แจ้งกฟส.ตบ.ทำการ Test ไฟดับแล้ว Short Ground จุด G3						
24	แจ้งกฟส.ตบ.ทำการ Test ไฟดับแล้ว Short Ground จุด G4						
25	แจ้งกฟส.ตบ.ลงข้อมูลใน WeSafe ก่อนปฏิบัติงาน						
26	แจ้งกฟส.ตบ.ปฏิบัติงานได้ทุกชุด						
27	DBA-KT2A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
28	DBA-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
29	DBA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		

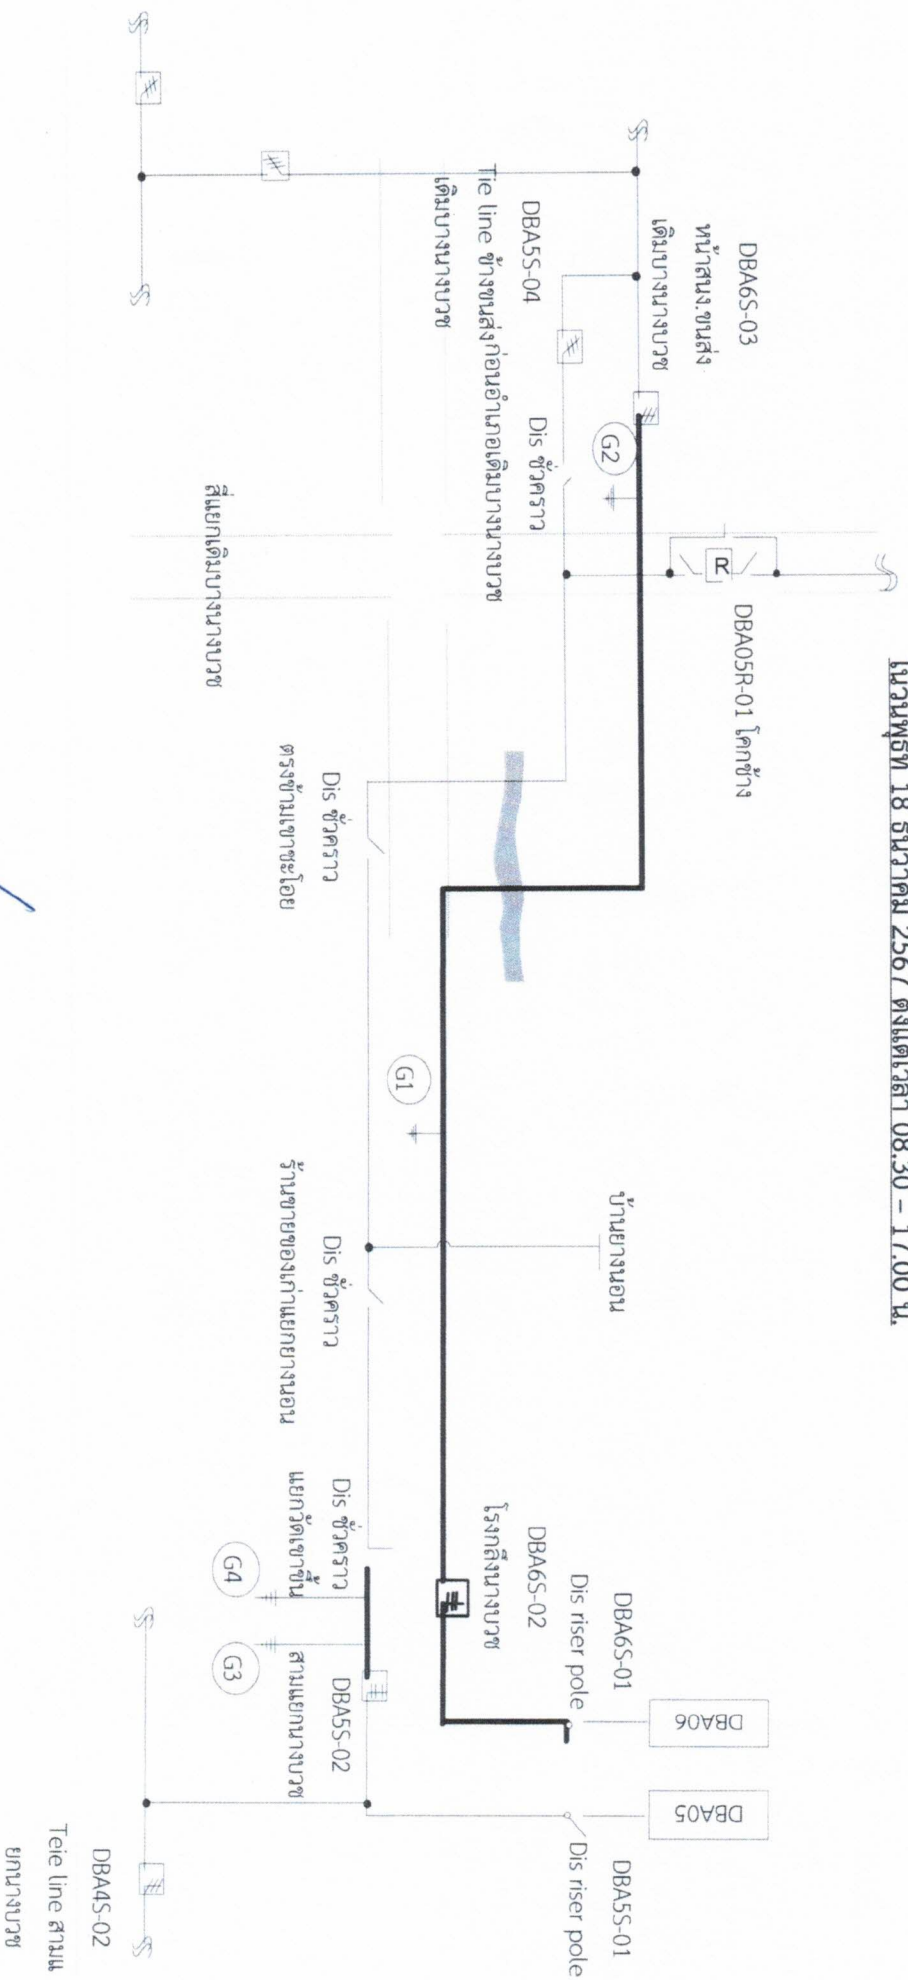
ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
30	DBA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA			
31	DBA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA			
%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%								
32	หลังกฟส.ตบ.ปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด							
33	แจ้งกฟส.ตบ.ทำการปลด Short Ground จุด G1 ออก							
34	แจ้งกฟส.ตบ.ทำการปลด Short Ground จุด G2 ออก							
35	แจ้งกฟส.ตบ.ทำการปลด Short Ground จุด G3 ออก							
36	แจ้งกฟส.ตบ.ทำการปลด Short Ground จุด G4 ออก							
37	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิชชิง							
38	DBA-KT2A/KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT			
39	DBA-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT			
40	DBA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA			
41	DBA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA			
42	DBA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA			
43	- จ่ายไฟ							
44	DBA06S-01	ปลด	สับ		ดบ.		DIS	Pothead F6
45	DBA06VB-01	ปลด	สับ "OFF" Auto Reclose		DBA		CB	
46	DBA05S-02	ปลด	สับ		ดบ.		SF6	สามแยกนางบวช
47	- ย้ายโหลด DBA05 กลับคืนจาก DBA06							
48	Dis ขด.ไนน์ DBA05	ปลด	สับ		ดบ.		DIS	แยกวัดเขาขึ้น
49	DBA05S-04	สับ	ปลด		ดบ.	SCADA	SF6	ข้างขนส่งเดิมบาง
50	- ย้ายโหลด DBA06 กลับคืนจาก DBA05							
51	DBA06S-03	ปลด	สับ		ดบ.		SF6	หน้าขนส่งเดิมบาง
52	DBA05S-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ดบ.		SF6	โรงสีบุญเจริญ
53	- ย้ายโหลด DBA05 กลับคืนจาก DBA01							
54	DBA05S-09	ปลด	สับ		ดบ.	SCADA	SF6	หน้า รพ.เดิมบางนางบวช
55	DBA01S-03	สับ	ปลด		ดบ.	SCADA	SF6	โรงเรียนธรรมโชติ
56	DBA-KT2A/KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			
57	DBA-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			
58	DBA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA			
59	DBA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA			
60	DBA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA			
%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%								

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ขับไฟ เพื่องานก่อสร้างสายส่ง 115 เควี

วงจร DBA05บริเวณ DBA55-02 แยกบงบวช ถึง Dis ชั่วคราวแยกวัดเขาชั้น

วงจร DBA06บริเวณ DBA6S-01 หน้า สฟพ.ตบ. ถึงDBA6S-03 หน้า สบง.ชนส่งเดิมบงบวช

ในวันพุธที่ 18 ธันวาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.00 น.



สถานะ การจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน

Handwritten signature and date

วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.00 น.

ตีไฟเพื่อให้ บ.บริษัชแอนตีสไซ พาวเวอร์ จำกัด ปักเสาก่อสร้างสายส่ง 115 เควี
หมายเหตุ — บริเวณที่ขอตัดไฟปฏิบัติงาน
