



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.อทง.(ปบ) ๔๘๑๒/๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พธิราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายอรุณ จรดล

10/12/67

วันที่ ๓. ธันวาคม ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อุทง

ด้วยการไฟฟ้า อุทง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน สับเปลี่ยนเสาไฟฟ้าขนาด ๑๔.๓๐ เมตร แดกร้าว/บับ บริเวณ อุทงโพล่า (ลูกเงิน) ตามแผนผังสังเขปแนบจำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	F2 UTG02, F8 UTG08	11 ธ.ค. 2567	08.30	16.30	สับเปลี่ยนเสาไฟฟ้าขนาด ๑๔.๓๐ เมตร แดกร้าว/บับ บริเวณ อุทงโพล่า (ลูกเงิน)	จุดตัด DDE UTG08 โดย Hotline พิกัด 14.371836, 99.892637	บริเวณ อุทงโพล่า พิกัด 14.376712, 99.8940874	นายณัฐพงศ์ มุสิกภูมิ พชง.๖ ผบ.กฟส.อุทง โทร.๐๙๘-๕๐๖๘๐๙๐

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).ม.๖.อ.อุทง

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายณัฐพงศ์ มุสิกภูมิ ตำแหน่ง พชง.๖ โทร ๐๙๘-๕๐๖๘๐๙๐

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายอรุณ จรดล)

ตำแหน่ง

ผจก.กฟส.อุทง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอฯ 1 ฟีดเดอร์ UT02 จาก UTG 25-32 ถึง UTG 25-03
ในวันที่ 11 ธ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่ 1838/67
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอฯ ฟีดเดอร์ UT08 จาก DDE ของพื้นที่อุทงโพล่า ถึง UTG 25-28
ในวันที่ 11 ธ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สุภัทร โพธิ์พินธุ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายณัฐพงศ์ มุสิกภูมิ

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส.อุทง., กฟส.สตง., กฟส.สม.
อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

(นายสุภัทร โพธิ์พินธุ์)
วตท.๕ 11ทท นพ.คฟ.

ขั้นตอนการสวิชซึ่ง 3 แผ่น
แผนผังแนบ 2 แผ่น

ผจพ. - (สถานี -)



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

หน้าที 1 จาก 3
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	อู่ทองโพล่า (UTG02,08)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	11 ธ.ค. 67	เวลา	08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.อทอง.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 1838/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพีรภัทร โพธิ์พันธุ์		วันที่ 8 ธันวาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 8 ธันวาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 8 ธันวาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพีรภัทร,นางสาวสุภัสชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายวรรณพงษ์,นายมนิช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายจิรวัดณ์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		


ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการ Switching						
2	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		-
3	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		-
4	UTG02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		-
5	UTG03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		-
6	UTG07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		-
7	UTG08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		-
8	DOA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		- -
9	DOA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		- -
10	SPB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPB		- -
11	DOA09R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.	SCADA	R วัดพันต่าลีง
12	ย้ายโหลด UTG08 บางส่วน ไปจ่ายจาก SPB04						
13	DOA09S-12	ปลด	สับ		สดง.		SF6 สามเหลี่ยม
14	UTG08S-08	สับ	ปลด		สดง.	SCADA	SF6 บั้มแยกตอนแจง
15	ย้ายโหลด UTG02 บางส่วน ไปจ่ายจาก DOA08						
16	DOA08S-14	ปลด	สับ		สดง.	SCADA	SF6 บ้านสามเหลี่ยม ผังซ้าย
17	UTG07S-08	สับ	ปลด		สดง.	SCADA	SF6 บ้านตอนแจง
18	ย้ายโหลด UTG02 บางส่วน ไปจ่ายจาก UTG03						
19	UTG07S-05	ปลด	สับ		อทง.		SF6 หน้า ธกส.
20	UTG02S-28	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อทง.		DIS UG ผังบั้ม PT
21	ย้ายโหลด UTG08 บางส่วน ไปจ่ายจาก UTG07						
22	UTG07S-03	ปลด	สับ		อทง.	SCADA	SF6 คูเมือง
23	UTG08S-02	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		อทง.		SF6 ว่องไวพานิชย์
24	เมื่อพร้อมดับไฟ						
25	แจ้ง กฟส.อทอง. ตรวจสอบ SF6 รหัส UTG02S-03 สาธารณะสุขอยู่ตำแหน่ง "OPEN+LOCK"						
26	UTG02S-32	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อทง.		DIS ตรงข้ามอู่ทองศึกษาลัย
27	แจ้ง กฟส.อทอง. ทำการไลนโหลด ช่วงตรงข้ามอู่ทองศึกษาลัย - SF6 UTG08S-02 ว่องไวพานิช (UTG08) ออกทั้ง 3 เฟส						
28	เมื่อ กฟส.อทอง. ทำการไลนโหลด ช่วงตรงข้ามอู่ทองศึกษาลัย - SF6 UTG08S-02 ว่องไวพานิช (UTG08) ออกทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ						
29	แจ้ง HOTLINE ทำการตัด DDE บริเวณตรงข้ามอู่ทองศึกษาลัย (UTG08) ออกทั้ง 3 เฟส						
30	เมื่อ HOTLINE ทำการตัด DDE บริเวณตรงข้ามอู่ทองศึกษาลัย (UTG08) ออกทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ						
31	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
32	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G1						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
33	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G2						
34	หลังจากทำการ Test ไฟ Short Ground ครบทุกจุด พร้อมลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อย						
35	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้						
36	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		- -
37	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		- -
38	UTG02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		- -
39	UTG03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		- -
40	UTG07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		- -
41	UTG08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		- -
42	DOA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		- -
43	DOA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		- -
44	SPB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPB		- -
45	DOA09R-02	Nonreclosing, ALT	Normal, ALT		สพ.	SCADA	R วัดพันต่าลิง
***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก *****							
46	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ						
47	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		- -
48	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		- -
49	UTG02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		- -
50	UTG03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		- -
51	UTG07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		- -
52	UTG08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		- -
53	DOA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		- -
54	DOA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		- -
55	SPB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPB		- -
56	DOA09R-02	Normal, ALT	Nonreclosing, ALT		สพ.	SCADA	R วัดพันต่าลิง
57	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ ปลด Short Ground จุด G1						
58	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ ปลด Short Ground จุด G2						
59	หลังจากทำการ ปลด Short Ground ออก ครบทุกจุด พร้อมยืนยันข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อย						
60	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
61	แจ้ง HOTLINE ทำการเชื่อม DDE บริเวณตรงข้ามอุทงศึกษาลัย (UTG08) เข้าทั้ง 3 เฟส						
62	เมื่อ HOTLINE ทำการเชื่อม DDE บริเวณตรงข้ามอุทงศึกษาลัย (UTG08) เข้าทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ						
63	UTG02S-32	ปลด	สับ		อทง.		DIS ตรงข้ามอุทงศึกษาลัย
64	ย้ายโหลด UTG08 บางส่วน คินจาก UTG07						
65	UTG08S-02	ปลด, ล็อคคาน	สับ		อทง.		SF6 ว่องไวพาณิชย์
66	UTG07S-03	สับ	ปลด		อทง.	SCADA	SF6 คูเมือง
67	ย้ายโหลด UTG02 บางส่วน คินจาก UTG03						
68	UTG02S-28	ปลด	สับ		อทง.		DIS UG ฝั่งป้อม PT
69	UTG07S-05	สับ	ปลด		อทง.	SCADA	SF6 หน้า ธกส.
70	ย้ายโหลด UTG02 บางส่วน คินจาก DOA08						
71	UTG07S-08	ปลด	สับ		สดง.	SCADA	SF6 บ้านดอนแจ่ง
72	DOA08S-14	สับ	ปลด		สดง.	SCADA	SF6 บ้านสามเหลี่ยม ฝั่งซ้าย
73	ย้ายโหลด UTG08 บางส่วน คินจาก SPB04						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
74	UTG08S-08	ปลด	สับ		สดง.	SCADA	SF6 บั้มแยกตอนแฉง
75	DOA09S-12	สับ	ปลด		สดง.		SF6 สามเหลี่ยม
76	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		- -
77	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		- -
78	UTG02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		- -
79	UTG03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		- -
80	UTG07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		- -
81	UTG08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		- -
82	DOA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		- -
83	DOA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		- -
84	SPB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPB		- -
85	DOA09R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		สพ.	SCADA	R วัดพันต่ำลิ่ง
***** ลีนสุด Switching ทั้งหมด *****							

สับเปลี่ยน เส้าไฟฟ้าแตกกร้าว/บิ่น บริเวณ ตู้ทองปล้ำ (จุดเดิม)

ก่อนดับไฟ

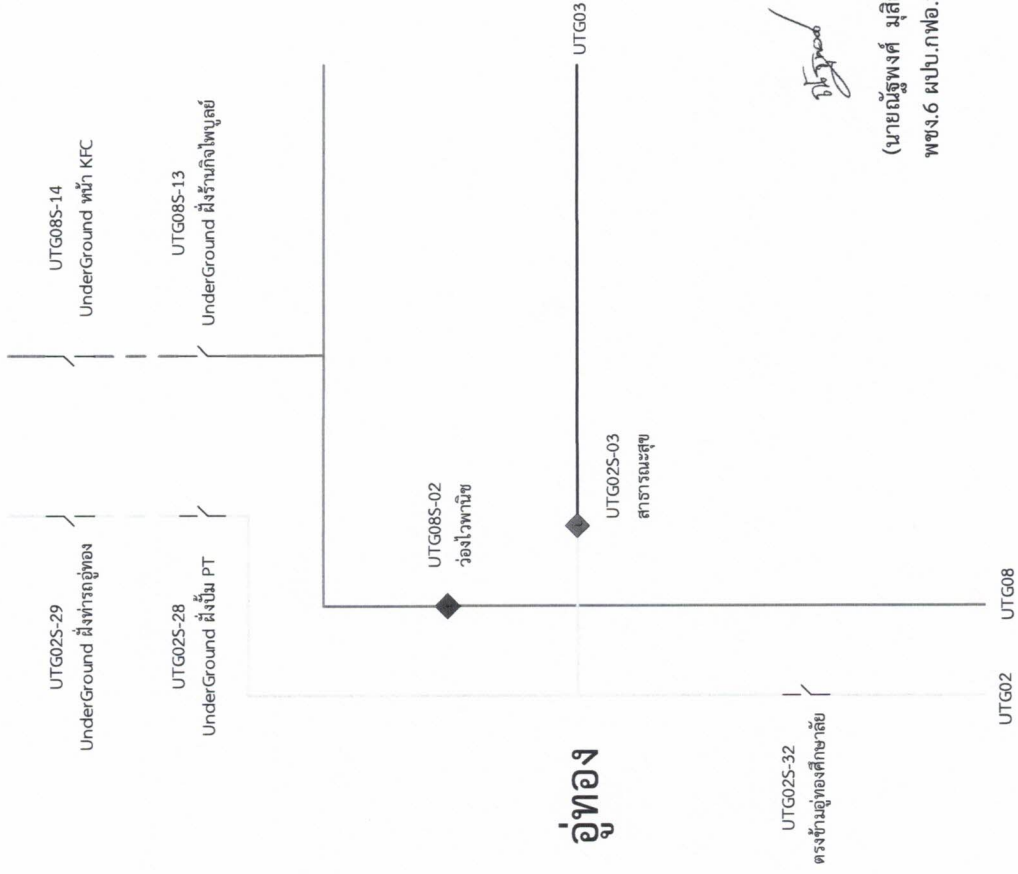


[Signature]

(นายณัฐพงศ์ มุสิกภูมิ)
พจน.6 ควบ.ภพอ.อุททอง

สับเปลี่ยน เส้าไฟฟ้าแตกกราว/บิ่น บริเวณ อุ้ทองโพล่า (อุกเจิน)

หลังดับไฟ

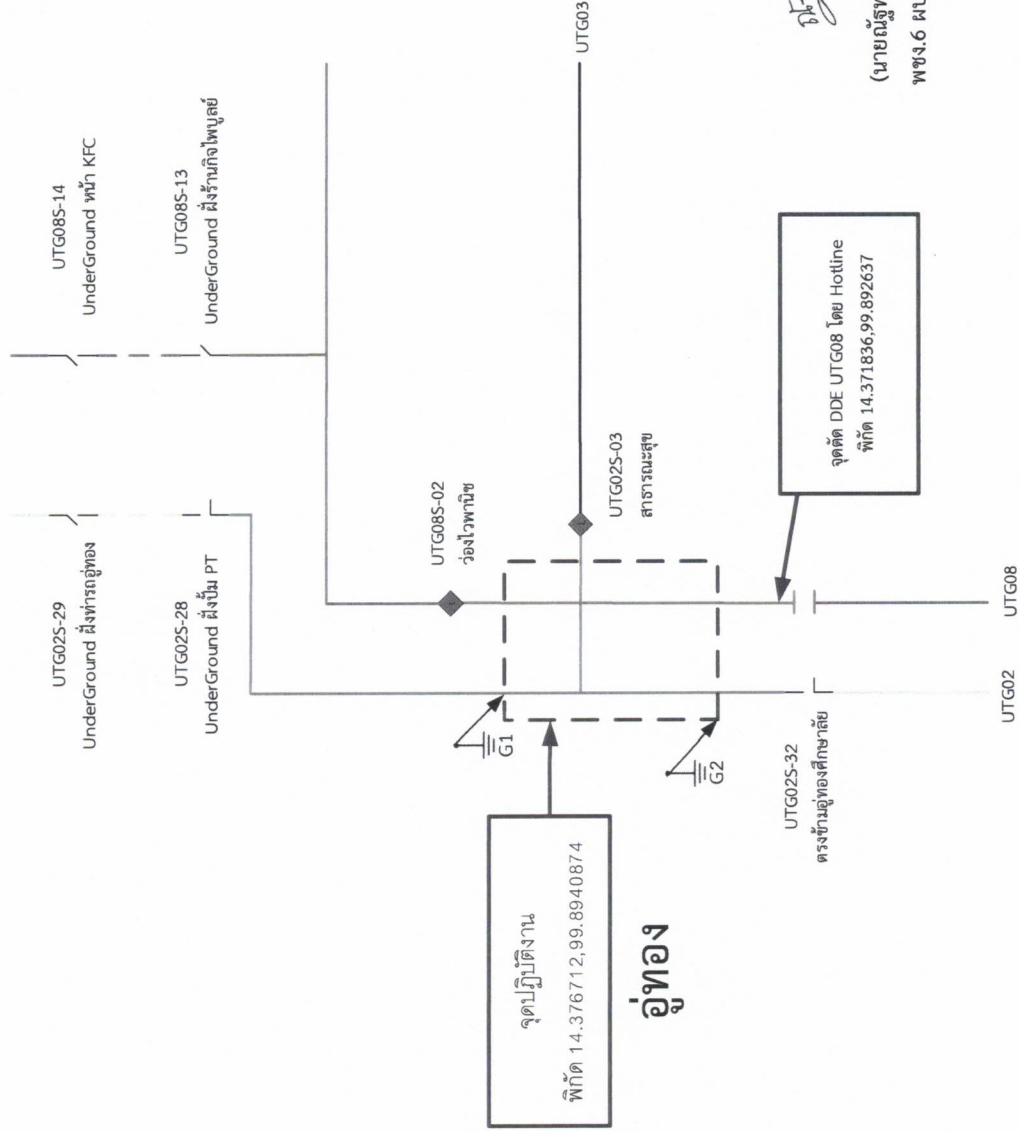

[Signature]
(นายณัฐพงษ์ มุสิกภูมิ)
พชง.6 ผบ.กฟอ.อุ้ทอง
