

Switching Deadline

25 ธ.ค. 66



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.อท.(ปบ).๖๒๓๕/๒๕๖๖

ชื่อผู้รับ นายพิทพันธ์ พิชิตสุวรรณพล

ชื่อผู้ส่ง นายอาวุธณ จรดล

วันที่ ๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๖

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.อุทอง

ด้วยการไฟฟ้า อุทอง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย (แรงดัน) บริเวณ แยกจรัใหม่ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	F.2 (UTV)	26 ธ.ค.2566	08.30	12.00	ปรับปรุงระบบจำหน่าย (แรงดัน) บริเวณ แยกจรัใหม่	ODE สามแยกจรัใหม่ 14.577070, 99.869443	บริเวณ Recloser แยกจรัใหม่ UTV2R-01 14.57711, 99.86903	นายจกมล พิธิกุล ชผ.ปบ.กฟอ.อุทอง โทร.๐๘๕-๒๖๖๘๘๙๑๙

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายจกมล พิธิกุล ตำแหน่ง ชผ.ปบ. โทร๐๘๕-๒๖๖๘๘๙๑๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายอาวุธณ จรดล.)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.อุทอง

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ UTV 2 จาก ODE สามแยกจรัใหม่ ถึง UTV 2R-01
ในวันที่ 26 ธ.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1853/66

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย พนิช ราชบุรีรัมย์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ ผจก.กฟอ.อุทอง

(นายพิทพันธ์ พิธิสุวรรณ)

ว.ก.๔ แทน ผค.คฟ.

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 2 แผ่น

ผจพ. - (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ. ๐๖๐.

อก.บข.(ก๓), อก.วว.(ก๓)


อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)


ร.ก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	แยกจรัญใหม่				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	26 ธ.ค. 66	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	26 ธ.ค. 66 12.00 น. ✓
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.อทง.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	ตามใบขอปฏิบัติงาน 1853/2566	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพนิต ราชกรัณิยม			วันที่	22 ธันวาคม 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	22 ธันวาคม 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	22 ธันวาคม 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายสิริวัฒน์, นายพิชชา, นายวิรัช, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นส.พิชยา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโอช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	UTG02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG	-	L=1.9MW.
3	UTV02R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		อทง.	SCADA	แยกจรัญใหม่
4	UTV04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		อทง.	SCADA	รง.น้ำตาลีไฟนซ์มงคล
5	ย้ายโหลด UTV02 บางส่วนไปจ่ายจาก UTV04						
6	UTV02S-09	ปลด	สับ		อทง.	DIS	แยกวางพยอม
7	UTV02R-01	สับ	ปลด		อทง.	SCADA	แยกจรัญใหม่
8	แจ้ง กฟอ.อทง. ปลดใบมีดด้านออกไลน์ UTV02R-01 รีโคลสเซอร์แยกจรัญใหม่ ออกทั้ง 3 เฟส						
9	เมื่อพร้อมดับไฟ						
10	แจ้งชุดขอทไลน์กระเช้าตัดเดท บริเวณสามแยกจรัญใหม่ โดยวิธีขอทไลน์ (ตามผังแนบ)						
11	เมื่อชุดขอทไลน์กระเช้าตัดเดท บริเวณสามแยกจรัญใหม่ แล้วเสร็จ						
12	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานทราบ						
13	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
14	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
15	เมื่อชุดปฏิบัติงาน Test ไฟ และ Short Ground พร้อมลงใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
16	แจ้งชุดปฏิบัติงานลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
17	UTG02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG	-	-
18	UTV04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		อทง.	SCADA	รง.น้ำตาลีไฟนซ์มงคล
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
19	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานแล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหลดกลับ						
20	UTG02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG	-	-
21	UTV04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		อทง.	SCADA	รง.น้ำตาลีไฟนซ์มงคล
22	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1						
23	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2						
24	ยืนยันการลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
25	แจ้งชุดขอทไลน์กระเช้าเชื่อมเดท บริเวณสามแยกจรัญใหม่ (ตามผังแนบ)						
26	เมื่อชุดขอทไลน์กระเช้าเชื่อมเดท บริเวณสามแยกจรัญใหม่ แล้วเสร็จ						
27	แจ้ง กฟอ.อทง. สับใบมีดด้านออกไลน์ UTV02R-01 รีโคลสเซอร์แยกจรัญใหม่ เข้าทั้ง 3 เฟส						
28	ย้ายโหลด UTV02 กลับจาก UTV04						
29	UTV02R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		อทง.	SCADA	แยกจรัญใหม่
30	UTV02S-09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อทง.	DIS	แยกวางพยอม

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
31	UTG02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		-	-
32	UTV02R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		อทง.	SCADA	R	แยกจรัใหม่
33	UTV04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		อทง.	SCADA	R	รง.น้ำตาลีไฟน์ชัยมงคล
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด								

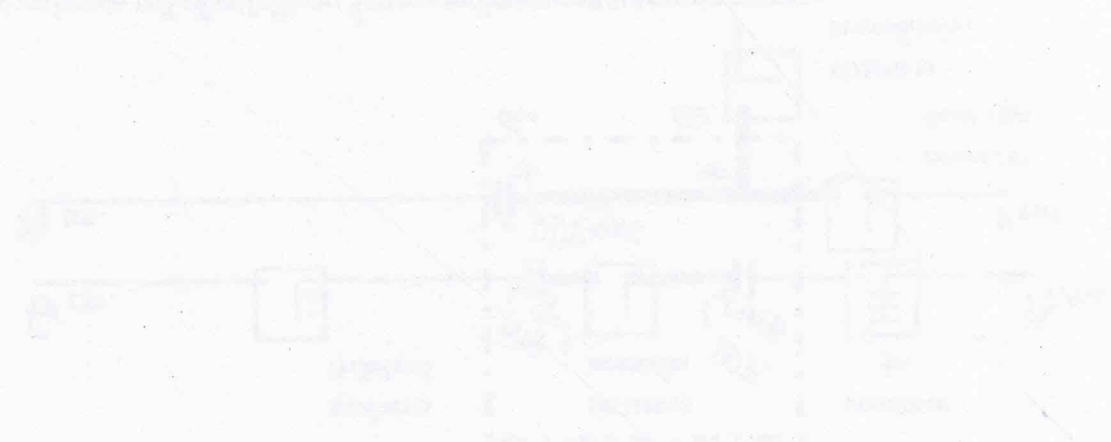

แผนผังงานดับไฟ เร่งด่วน บริเวณ แยกห้าใหม่ ก่อนดับไฟ



แผนผังงานดับไฟ แรงดัน บริเวณ แยกเจ้าใหม่ ก่อนดับไฟ
(ปฏิบัติงานโดยขอทไลน์)

