



วิทยุขอดับไฟ

Switching Deadline

19 ธ.ค. 67

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ บพล.(ปป) ๐๖๓๕ /๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชิราสุวรรณษ์
ชื่อผู้ส่ง นายพิชา ตันยิตเส็ง
จำนวนเอกสารแนบ ๖ แผ่น

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อก.ปป.(ก๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.บพล.

ด้วยการไฟฟ้า สาขาบ่อพลอย ดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน ติดตั้ง Recloser บ้านหินดาดทอง ในไลน์
เชื่อมโยง F๔-F๕ บ้านหินดาดทอง ม.๗ ต.หนองรี อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี สถานีไฟฟ้าบ่อพลอย ๒

สถานีไฟฟ้า บ่อพลอย ๒ ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ ปฏิบัติ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๔ สถานี บ่อพลอย ๒	๒๔ ธ.ค. ๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ติดตั้ง Recloser บ้านหินดาด ทอง สับเปลี่ยน ดรอปเอาท์ BOU๐๔F-๑๖ ฟิวส์ เป็น Dis สับเปลี่ยน ดรอปเอาท์ BOU๐๔F-๓๓ ฟิวส์ เป็น Dis	Recloser หนองรี-ลำอิฐ รหัส BOU๐๔R-๐๑ ดรอปเอาท์กลาง ไลน์ บ้านหิน ดาดทอง ม.๗ ต.หนองรี ดรอปเอาท์ไลน์ บ้านโป่งช้าง ม.๗ ต.หนองปรือ	สูตรระบบ จำหน่าย บ้าน หนองรี-ลำอิฐ	นายวิษณุ มีผล พงง.๖(ปป.) โทร.๐๘๒- ๒๕๒๕๖๘๕

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายณเรศ พูลพจน์ ตำแหน่ง พงง.๗ (สข) โทร.๐๘๔-๒๕๖๙๕๒๔
ผู้ประสานงานหน้างาน ชื่อ นายวิษณุ มีผล ตำแหน่ง พงง.๖(ปป.) โทร.๐๘๒-๒๕๒๕๖๘๕

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ.(หากมีโอกาสชำระ ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบ
ก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑.มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำระ ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำระ
- ๒.ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายพิชา ตันยิตเส็ง)

ตำแหน่ง

ผจก.กฟส.บ่อพลอย

๒๕๖๗

- ๖ ธ.ค. 2567

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ศคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ศคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเตอร์ 80๗๐4 จาก D/O บ้านเนินลาดทอง ถึง ๗15 ๕๑. ตำบลบ้านเนินลาดทอง
ในวันที่ 24 ธ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา ๐8:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 1857/67
อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่
อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่
อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่
อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่
พนักงานศูนย์ฯ นาย อ.ร. โภกขันธ์ ประสานงานขอดับไฟกับ นายณรงค์ พุฒพันธ์
18 ธ.ค. 67

(นายจิรวุฒน์ แก้วฉิมนิล)

อส.ก.5 บบพร ๒๕-๑๗.

ผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(ศคฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ.๓.๗๗, กฟภ.๓.๗๘.

อก.วว.(ก.๓)

ขั้นตอนทำสวิตซ์ชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 6 แผ่น



อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับ
ศูนย์นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น. เป็นต้นไปจนกว่างาน
จะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)


ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณบ้านหินดาดทอง					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	24 ธ.ค. 67	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	16.30 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.บพล.	งานที่ทำ	ติดตั้ง Recloser	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1857/2567	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอมร โมกขพันธ์			วันที่	19 ธันวาคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	19 ธันวาคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	19 ธันวาคม 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, น.ส.พิชญา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีระวัชร, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร, น.ส.สุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					


ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	BOU04R-01	Normal	Non-Reclosing		หปร.	R	บ้านหนองรี-ลำอี่ชู
3	BOU01R-01	Normal	Non-Reclosing		หปร.	R	หน้า กฟส.หนองปรือ
4	ย้ายโหลด BOU04 บางส่วน ฝาก BOU05 (ดับไฟย้ายโหลด)						
5	DIS ชค. BOU04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		หปร.	DIS	ท้ายบ้านหินดาดทอง
6	BOU05S-04	ปลด	สับ		หปร.	DIS	ท้ายบ้านวังยาว-โป่งช้าง
7	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน เวลา 08.30 น.						
8	Drop BOU4	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		หปร.	D/O	บ้านหินดาดทอง
9	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
10	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
11	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
12	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน WE SAFE						
13	BOU04R-01	Non-Reclosing	Normal		หปร.	R	บ้านหนองรี-ลำอี่ชู
14	BOU01R-01	Non-Reclosing	Normal		หปร.	R	หน้า กฟส.หนองปรือ
15	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน WE SAFE เสร็จเรียบร้อย						
16	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
17	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ลงข้อมูลใน WE SAFE เสร็จเรียบร้อย พร้อมย้ายโหลดกลับ						
18	ตรวจสอบ Recloser ติดตั้งใหม่ (บ้านหินดาดทอง) อยู่สถานะ "OPEN"						
19	ทำการสับ Sw. Bypass ของ Recloser ติดตั้งใหม่ (บ้านหินดาดทอง) เข้าทั้ง 3 เฟส						
20	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1						
21	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2						
22	BOU04R-01	Normal	Non-Reclosing		หปร.	R	บ้านหนองรี-ลำอี่ชู
23	BOU01R-01	Normal	Non-Reclosing		หปร.	R	หน้า กฟส.หนองปรือ
24	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
25	Drop BOU4	ปลด	สับ		หปร.	D/O	บ้านหินดาดทอง

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ส่งการ	หมายเหตุ
26	ย้ายโหลด BOU04 บางส่วน กลับจาก BOU05 (ดับไฟย้ายโหลด)						
27	BOU05S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		หปร.		DIS ทำบ้านหินดาตทอง
28	DIS ชค. BOU04	ปลด	สับ		หปร.		DIS ทำบ้านวังยาว-โป่งช้าง
29	BOU04R-01	Non-Reclosing	Normal		หปร.		R บ้านหนองรี-ลำอิฐู
30	BOU01R-01	Non-Reclosing	Normal		หปร.		R หน้า กฟส.หนองปรือ
<i>สิ้นสุด Switching ทั้งหมด</i>							

สถานะการจ่ายไฟก่อนปฏิบัติงาน

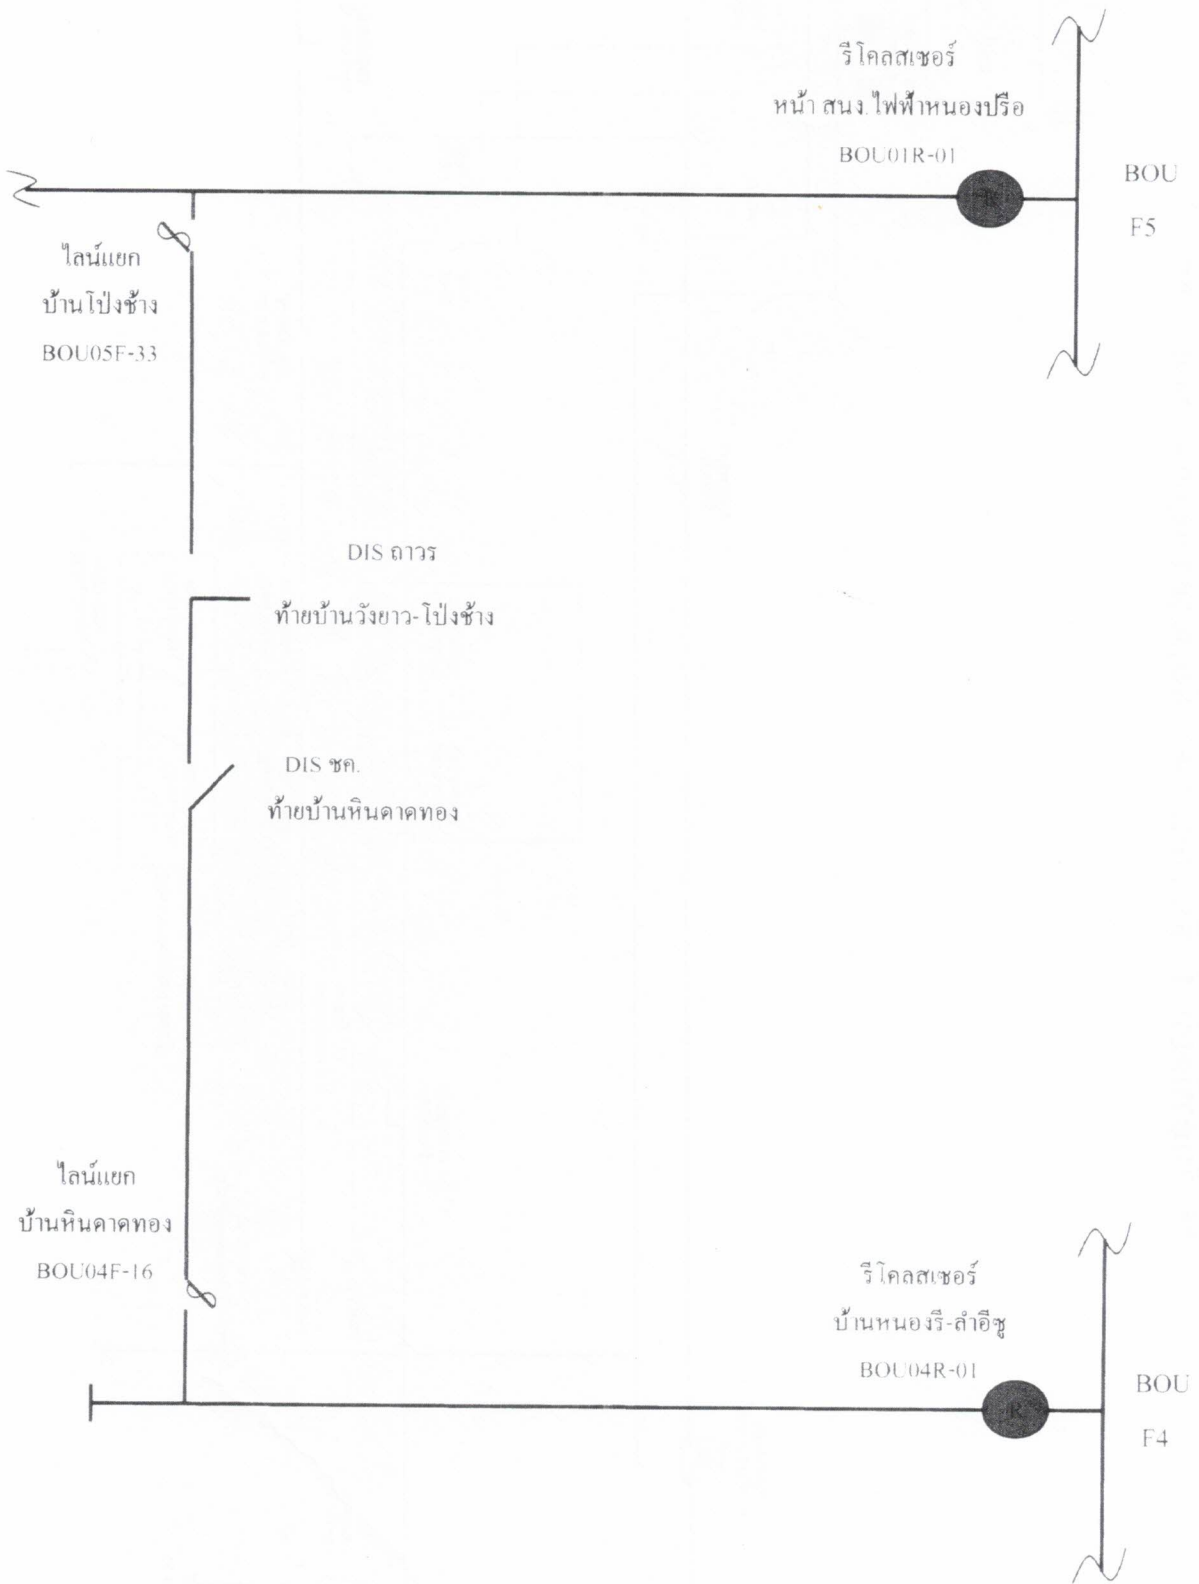

สถานะการจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน

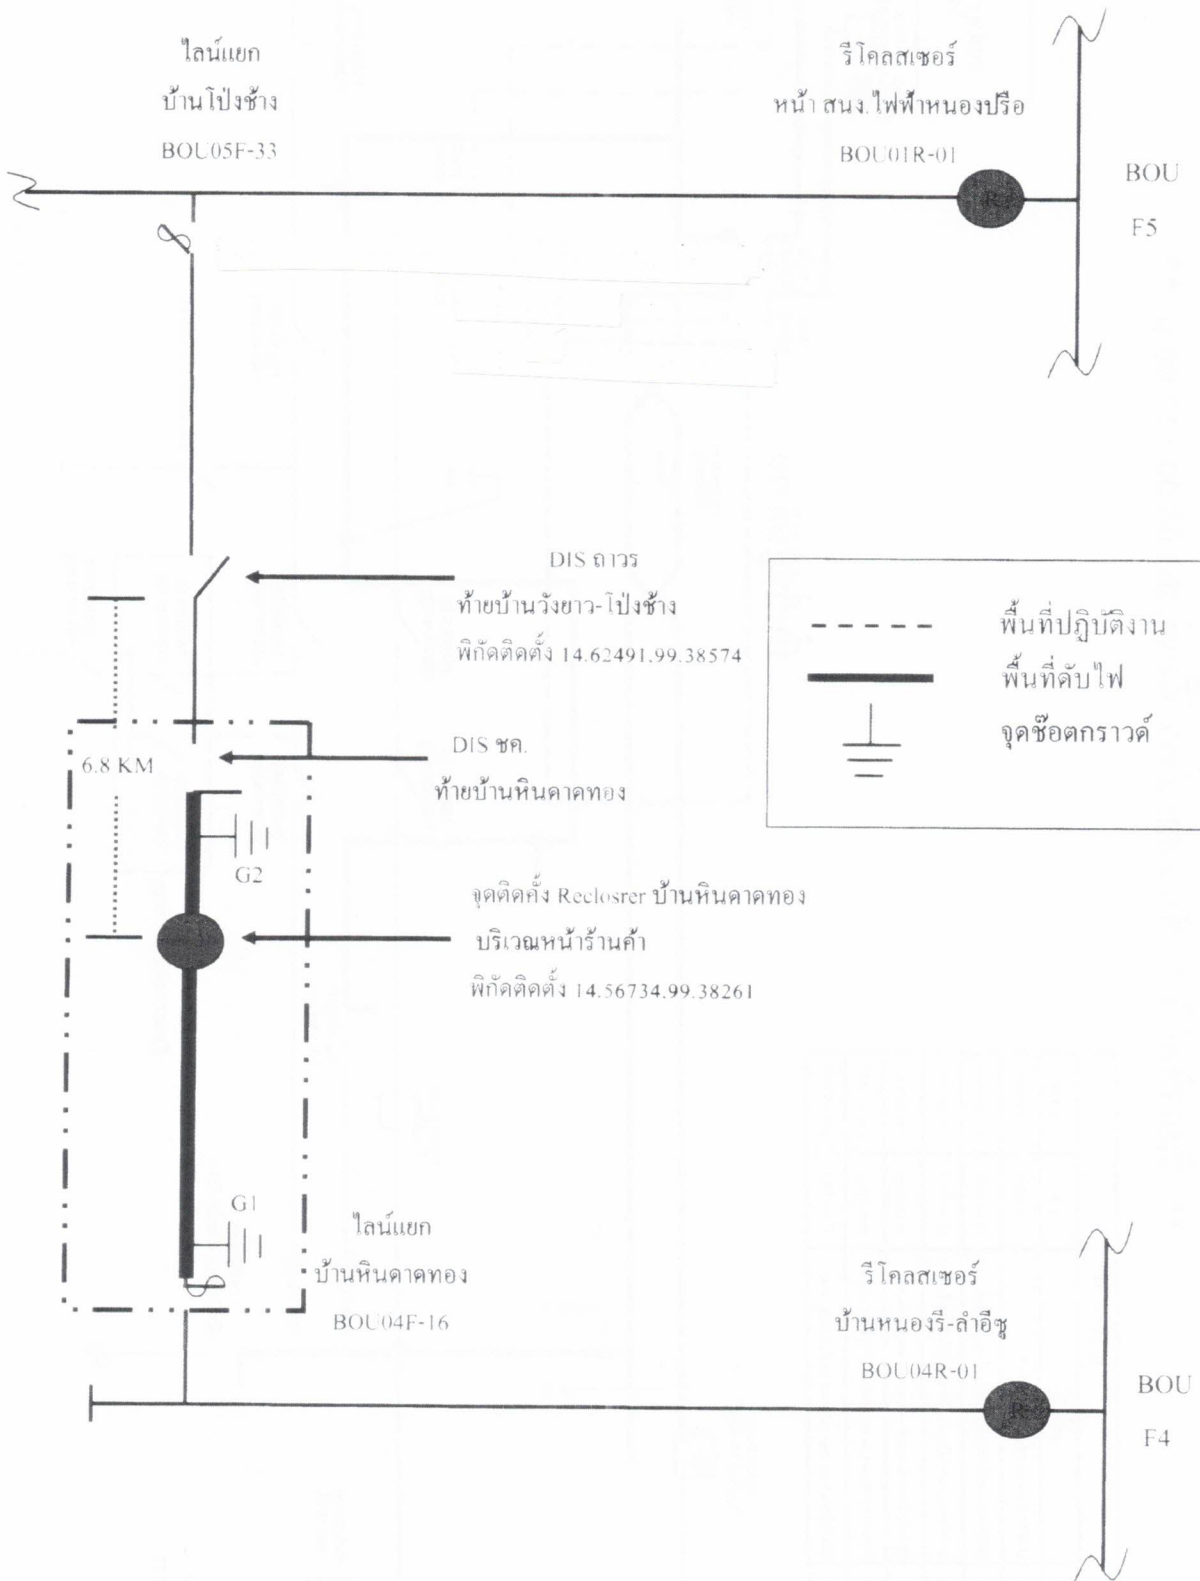

สถานะการจ่ายไฟหลังปฏิบัติงาน

