



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3.กฟส.ท่าเรือ.(กป) 1246 /2567
ชื่อผู้รับ นายพิทอนันท์ พธิวิสาสุวรรณ
ผู้ส่ง นายสันติ งามชื่น

Switching Deadline

13 ธ.ค. 67

วันที่ 5 ธ.ค. ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.3) ชื่อ
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ระดับ 9.กฟส.ท่าเรือ

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.ท่าเรือ จะขอตัดไฟ สายส่ง 115 เควี และระบบจำหน่าย วงจร TMW03, TMW09, TMW05, TMW10 และ TMW10 สถานีท่ามะกา 2 เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง สถานีท่ามะกา 2 (ถาวร) ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 3 แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	PTU2YB01	15 ธ.ค.67	10.00 น.	16.30 น.	พาดสายเพิ่มวงจรระบบ จำหน่ายแรงสูง 22 kV รองรับสถานีท่ามะกา2 (ถาวร)	สถานีพนมทวน	สถานีท่ามะกา 2 (ถาวร)	กฤตภาส ปิ่นเจริญ 090-9918873
2	TMW 03	15 ธ.ค.67	08.30 น.	17.00 น.		TMW03VB-01	DIS ชั่วคราว แสนรุ่งพานิชย์	
3	TMW 09	15 ธ.ค.67	08.30 น.	17.00 น.		TMW09VB-01	TMW09S-02 บ้านดอนโพลง	
4	TMW 05	15 ธ.ค.67	08.30 น.	17.00 น.		TMW05VB-01	TMW05S-03 ร้านขายอาหาร สัตว์สามแยกพระ แท่น	
5	TMW 10	15 ธ.ค.67	08.30 น.	17.00 น.		TMW10VB-01	TMW05S-04 ตลาดพระแท่น	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) มีผู้ใช้ไฟ 1175 ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเสนีย์ ศรีมงคล ตำแหน่ง ผ.ก.ป.กฟส.ท่าเรือ โทร.098-6619787

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงาน มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ.(หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก3) จะไปตรวจสอบก่อน

ปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
- พิกัดพื้นที่จ่ายไฟ
 - สถานีพนมทวน Lat 14.12020 Long 99.68248
 - สถานีท่ามะกา 2 (ถาวร) Lat 14.03572 Long 99.81512
 - DIS ชั่วคราว แสนรุ่งพานิชย์ Lat 14.03705 Long 99.79399
 - TMW09S-02 บ้านดอนโพลง Lat 14.03679 Long 99.80179
 - TMW09S-02 ร้านขายอาหารสัตว์
สามแยกพระแท่น Lat 14.03819 Long 99.79052
 - TMW09S-02 ตลาดพระแท่น Lat 14.03579 Long 99.7905

ลงชื่อ

(นายสันติ งามชื่น)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ระดับ 9.กฟส.ท่าเรือ

- ๖ ธ.ค. ๒๕๖๗

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3

เรียน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

TMN03YB-01

PTU02YB-06 บ.โกมพิ์ส์

ถึง PTU02YB-04 จอห์นไดนาโม

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง 115 kV จาก PTU02YB-01 ถึง PTU02YB-04
ในวันที่ 15 ธ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 10:00 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1858/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 วงจร/หม้อแปลง TMN03 จาก TMN03YB-01 ถึง Dis ๕๓. ปลั๊กพ่วงพานี่
ในวันที่ 15 ธ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1858/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 3 วงจร/หม้อแปลง TMN09 จาก TMN09YB-01 ถึง TMN09S-02
ในวันที่ 15 ธ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1858/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 4 วงจร/หม้อแปลง TMN05 จาก TMN05YB-01 ถึง TMN05S-03
ในวันที่ 15 ธ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1858/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 5 วงจร/หม้อแปลง TMN10 จาก TMN10YB-01 ถึง TMN05S-04
ในวันที่ 15 ธ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1858/2567

พนักงานศูนย์ฯ นาย สุภัตตรา จงดีบุญภาค ประสานงานการขอดับไฟกับ หมอสินีมี ตวีมงคล

สุภัตตรา

(นางสาวสุภัตตรา จงดีบุญภาค)

วทศ. 5 ๓๓๓ ทพ.๓๗.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก..... กฟภ. ๓๗., กฟภ. ๓๗.

อก.บช.(ก3), อก.วว.(ก3)


อนุมัติ และแจ้ง จป.เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย พร้อมทั้ง
ลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


ขั้นตอนการสวิชชิง 7 แผ่น

แผนผังแนบ 3 แผ่น


ผจพ. 2 (สถานี PTU, TMN)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08:00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ ท่ามะกา 2 (ถาวร), แยกคอนโพรง					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	15 ธ.ค. 67	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	17.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ทร.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1858/67	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	น.ส.สุภัชชา วงศ์บุญมาก			วันที่	7 ธันวาคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	7 ธันวาคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	7 ธันวาคม 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสร สัตต์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนเฑียร 2. นายพิรภัทร, น.ส.สุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต 3. นายนครินทร์, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)	(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)	(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	งานที่ทำ : 1.สลับวงจรบน-ล่าง ระหว่างวงจร TMW05 และ TMW10 และตัดจ่ายใหม่						
2	2.พาดสายระบบ 22 เควี บริเวณแยกคอนโพรง พร้อมเช็คเฟส และย้ายจุดเชื่อมต่อเพื่อรับไฟจาก TMW03						
3	3.ตัดเสาบบริเวณหน้าสถานีฯ ท่ามะกา 2 (ถาวร) ดำเนินการโดย กจร.(ก3)						
4	4.เชื่อมต่อ DDE บริเวณตรงข้ามตลาดนัดพระแท่น ในไลน์วงจร TMW03 (เข้า SF6 รหัส TMW03S-02)						
5	5.บริษัท ไทยฟิวส์ฯ ขอตัดไฟ 115 เควี เวลา 10.00 น.						
6	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
7	PTU02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PTU		
8	TMW01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMW		
9	TMW03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMW		
10	TMW-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMW		
11	TMW01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMW		
12	TMW02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMW		
13	TMW03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMW		
14	TMW05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMW		
15	TMW09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMW		
16	TMW10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMW		
17	KSA-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KSA		
18	KSA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		
19	KSA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		
20	SPO-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPO		
21	SPO08R-01	Normal	Non-Reclosing, ALT		ทคก.	R	บ่อสุพรรณ
22	TMK-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMK		
23	TMK07R-01	Normal	Non-Reclosing, ALT		ทร.	R	เลยวัดหนองลาน
24	PTU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PTU		
25	PTU03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PTU		
26	ย้ายโหลด TMW03 ไปจ่ายจาก PTU03						
27	PTU03S-03	ปลด	สับ		ทร.	SCADA	SF6 บ้านหนองพง
28	TMW03VB-01	สับ	ปลด		TMW	CB	22 เควี
29	ย้ายโหลด TMW09 บางส่วนไปจ่ายจาก SPO08						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
30	SPO08S-06	ปลด	สับ		ทร.	SCADA	SF6	ป้อมตำรวจดอนกะเพรา
31	TMW09S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ทร.	SCADA	SF6	บ้านดอนโพรง
32	ย้ายโหลด TMW01 ไปจ่ายจาก TMW02							
33	TMU04S-02	ปลด	สับ		ทร.		DIS	คาร์แคร์หนองลาน
34	TMW01VB-01	สับ	ปลด		TMW		CB	22 เควี
35	ย้ายโหลด TMW05 บางส่วนไปจ่ายจาก TKM07							
36	TMW10S-08	ปลด	สับ		ทร.	SCADA	SF6	ตรงข้ามวัดตะคร้ำเอน
37	TMW05S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ทร.		SF6	ร้านขายอาหารสัตว์สามแยกพระแท่น
38	ย้ายโหลด KSA08 บางส่วนไปจ่ายจาก KSA09							
39	KSA08S-10	ปลด	สับ		กพส.	SCADA	SF6	ไปรษณีย์
40	KSA08S-09	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กพส.		SF6	ม.เกษตรรา
41	ย้ายโหลด TMW02 ไปจ่ายจาก KSA08							
42	TMU04S-10	ปลด	สับ		กพส.	SCADA	SF6	หนองไม้งาม
43	TMW02VB-01	สับ	ปลด		TMW		CB	22 เควี
44	ตรวจสอบ TMW04S-01 อยู่สถานะ "OPEN"							
45	ตรวจสอบ SF6 รหัส TMW04S-02, TMW02S-02 หน้าสถานีฯ ท่ามะกา 2 (ถาวร) อยู่สถานะ "OPEN + LOCK"							
46	ตรวจสอบ SF6 รหัส TMW01S-02, TMW05S-02 ตรงข้ามหน้าสถานีฯ ท่ามะกา 2 (ถาวร) อยู่สถานะ "OPEN + LOCK"							
47	ตรวจสอบ SF6 รหัส TMW05S-04 ตลาดพระแท่น อยู่สถานะ "OPEN + LOCK"							
48	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.30 น.							
49	TMW05VB-01	สับ	ปลด		TMW		CB	22 เควี
50	TMW09VB-01	สับ	ปลด		TMW		CB	22 เควี
51	TMW10VB-01	สับ	ปลด		TMW		CB	22 เควี
52	ย้ายโหลด TMW07 ไปจ่ายจาก KSA08 (ขึ้น BUS ผ่านไลน์ TMW02)							
53	TMW02VB-01	ปลด	สับ "OFF" Auto Reclose		TMW		CB	22 เควี
54	TMW01BVB-01	สับ	ปลด		TMW			Incoming 1
55	TMW03S-01	สับ	ปลด		ทร.			Pothead F3
56	TMW05S-01	สับ	ปลด		ทร.			Pothead F5
57	TMW09S-01	สับ	ปลด		ทร.			Pothead F9
58	TMW10S-01	สับ	ปลด		ทร.			Pothead F10
59	Dis ชค ในไลน์ TMW03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทร.		DIS	ชั่วคราวแสนรุ่งพานิชย์
60	TMW10S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ทร.	SCADA	SF6	ข้าวแกง 15 บาท
61	ดับไฟ 115 เควี ตั้งแต่ ABS จอห์นไดนาโม รหัส PTU02YS-04 ถึง สถานีฯ ท่ามะกา 2 (ถาวร)							
62	TMW02YB-01	สับ	ปลด		TMW		CB	เบรกเกอร์ 115 เควี
63	TMW01YB-01	สับ	ปลด		TMW		CB	เบรกเกอร์ 115 เควี
64	TMW03YB-01	สับ	ปลด		TMW		CB	เบรกเกอร์ 115 เควี
65	TMW01YS-01	สับ	ปลด		TMW			ใบมิด 115 เควี
66	TMW01YS-02	สับ	ปลด		TMW			ใบมิด 115 เควี
67	TMW02YS-01	สับ	ปลด		TMW			ใบมิด 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
68	TMW03YS-01	สับ	ปลด		TMW		ใบมิด 115 เควี
69	TMW03YS-02	สับ	ปลด		TMW		ใบมิด 115 เควี
70	PTU02YS-04	สับ	ปลด, ล็อคกุญแจ		ทร.	ABS	จอห์นไดนาโม
71	**สามารถทำการ Short Ground จุด G3, G6 และทำงานตัดเสาหน้าสถานีฯ ท่ามะกา 2 (ถาวร) ได้ก่อนระหว่างระดับ 115 เควี เวลา 10.00						
72	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟส.ทร. รับทราบ (ระบบ 22 เควี และระบบ 115 เควี บางส่วน)						
73	แจ้ง กฟส.ทร. ทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G3						
74	แจ้ง กฟส.ทร. ทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G6						
75	เมื่อ กฟส.ทร. ทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G3, G6 พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE ก่อนปฏิบัติงานเรียบร้อย						
76	แจ้ง กฟส.ทร. แจ้ง ทรย.(ก3) ปฏิบัติงานตัดเสาบริเวณหน้าสถานีฯ ท่ามะกา 2 (ถาวร) ได้						
77	PTU02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PTU		
78	TMW-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMW		
79	TMW02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMW		
80	KSA-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KSA		
81	KSA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		
82	KSA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		
83	SPO-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPO		
84	SPO08R-01	Non-Reclosing, ALT	Normal, ALT		ทคก.	R	บ่อสุพรรณ
85	TMK-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMK		
86	TMK07R-01	Non-Reclosing, ALT	Normal, ALT		ทร.	R	เลยวัดหนองลาน
87	PTU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PTU		
88	PTU03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PTU		
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
89	เมื่อบริษัท ไทยฟู้ดส์ฯ ปลดโหลดภายในเรียบร้อย พร้อมดับไฟเวลา 10.00 น.						
90	PTU02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PTU		
91	PTU02YB-01	สับ	ปลด		PTU		เบรกเกอร์ 115 เควี
92	PTU02YS-01	สับ	ปลด		PTU		ใบมิด 115 เควี
93	PTU02YS-02	สับ	ปลด		PTU		ใบมิด 115 เควี
94	PTU02YS-06	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		ทร.	ABS	บริษัท ไทยฟู้ดส์ฯ
95	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟส.ทร. รับทราบ (ระบบ 115 เควี)						
96	แจ้ง กฟส.ทร. ทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G1						
97	แจ้ง กฟส.ทร. ทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G2						
98	แจ้ง กฟส.ทร. ทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G4						
99	แจ้ง กฟส.ทร. ทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G5						
100	เมื่อ กฟส.ทร. ทำการ Test ไฟ และ Short Ground ครบทั้ง 4 จุด พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE ก่อนปฏิบัติงานเรียบร้อย						
101	แจ้ง กฟส.ทร. ปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงที่สอง							
102	หลังจาก กฟส.ทร. แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
103	แจ้ง กฟส.ทร. ทำการ Short Ground จุด G1						


ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ส่งการ	หมายเหตุ
104	แจ้ง กฟส.ทร. ทำการ Short Ground จุด G2						
105	แจ้ง กฟส.ทร. ทำการ Short Ground จุด G3						
106	แจ้ง กฟส.ทร. ทำการ Short Ground จุด G4						
107	แจ้ง กฟส.ทร. ทำการ Short Ground จุด G5						
108	แจ้ง กฟส.ทร. ทำการ Short Ground จุด G6						
109	ตรวจสอบไลน์ที่พาดใหม่บริเวณแยกตอนโพรง เชื่อม DDE เข้าสนิททั้ง 3 เฟสตลอดไลน์						
110	ตรวจสอบ SF6 ตลาคันัดพระแท่น รหัส TMW03S-02 อยู่สถานะ "OPEN + LOCK"						
111	เมื่อชุด HL พร้อมเชื่อม DDE บริเวณตรงข้ามตลาคันัดพระแท่น เข้า SF6 รหัส TMW03S-02 ในไลน์วงจร TMW03						
112	PTU03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PTU		
113	แจ้งชุด HL ทำการเชื่อม DDE บริเวณตรงข้ามตลาคันัดพระแท่น เข้าสนิททั้ง 3 เฟส						
114	เมื่อชุด HL ทำการเชื่อม DDE บริเวณตรงข้ามตลาคันัดพระแท่น เข้าสนิททั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ						
115	แจ้ง กฟส.ทร. ดำเนินการเปลี่ยนจุดเชื่อมสายบริเวณ TMW03S-01 มาเชื่อมกับไลน์พาดใหม่						
116	เมื่อ กฟส.ทร. ดำเนินการเปลี่ยนจุดเชื่อมสายบริเวณ TMW03S-01 มาเชื่อมกับไลน์พาดใหม่ แล้วเสร็จ						
117	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
118	TMW-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMW		
119	TMW02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMW		
120	KSA-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KSA		
121	KSA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		
122	KSA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		
123	SPO-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPO		
124	SPO08R-01	Normal, ALT	Non-Reclosing, ALT		ทคก.	R	บ่อสุพรรณ
125	TMK-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMK		
126	TMK07R-01	Normal, ALT	Non-Reclosing, ALT		ทร.	R	เลยวัดหนองลาน
127	TMK08R-01	Normal	Non-Reclosing, ALT		ทร.	R	คร้วทอง (บึงบางจาก)
128	PTU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PTU		
129	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
130	จ่ายไฟระบบ 115 เควี						
131	PTU02YS-04	ปลด, ล็อคกุญแจ	สับ		ทร.	ABS	จอห์นไดนาโม
132	PTU02YS-01	ปลด	สับ		PTU		ใบมิต 115 เควี
133	PTU02YS-02	ปลด	สับ		PTU		ใบมิต 115 เควี
134	TMW01YS-01	ปลด	สับ		TMW		ใบมิต 115 เควี
135	TMW01YS-02	ปลด	สับ		TMW		ใบมิต 115 เควี
136	TMW02YS-01	ปลด	สับ		TMW		ใบมิต 115 เควี
137	TMW03YS-01	ปลด	สับ		TMW		ใบมิต 115 เควี
138	TMW03YS-02	ปลด	สับ		TMW		ใบมิต 115 เควี
139	PTU02YB-01	ปลด	สับ "OFF" Auto Reclose		PTU		เบรกเกอร์ 115 เควี
140	TMW03YB-01	ปลด	สับ "OFF" Auto Reclose		TMW	CB	เบรกเกอร์ 115 เควี
141	TMW01YB-01	ปลด	สับ "OFF" Auto Reclose		TMW	CB	เบรกเกอร์ 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
142	TMW02YB-01	ปลด	สับ		TMW		CB	เบรกเกอร์ 115 เควี
143	ปรับแรงดันที่ Bus ให้อยู่ที่ 22.7 kV							
144	TMW01BVB-01	ปลด	สับ		TMW			Incoming 1
145	TMW02VB-01	สับ	ปลด		TMW		CB	22 เควี
146	เมื่อบริษัท ไทยฟู้ดส์ฯ พร้อมรับไฟ							
147	PTU02YS-06	ปลด, ล็อคกุญแจ	สับ		ทร.		ABS	บริษัท ไทยฟู้ดส์ฯ
148	เมื่อพร้อม AC ไลน์วงจร TMW03 เป็นเวลา 10 นาที							
149	TMW03S-01	ปลด	สับ		ทร.			Pothead F3
150	TMW03VB-01	ปลด	สับ "OFF" Auto Reclose		TMW		CB	22 เควี
151	เมื่อ AC ครบ 10 นาที							
152	TMW03VB-01	สับ "OFF" Auto Reclose	ปลด		TMW		CB	22 เควี
153	TMW03S-01	สับ	ปลด		ทร.			Pothead F3
154	เมื่อพร้อมเช็คเฟส TMW03 ที่ TMW03S-01 (ไลน์ใหม่)							
155	TMW03S-02	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ทร.		SF6	ตลาดนัดพระแท่น
156	TMW03VB-01	ปลด	สับ "OFF" Auto Reclose		TMW		CB	22 เควี
157	แจ้ง HL ทำการเช็คเฟสที่ TMW03S-01 เมื่อเช็คเฟสเสร็จ เฟสตรง							
158	TMW03VB-01	สับ "OFF" Auto Reclose	ปลด		TMW		CB	22 เควี
159	เมื่อพร้อมเช็คเฟส TMW04 ที่ TMW04S-01							
160	Dis ชค ในไลน์ TMW04	ปลด	สับ		ทร.		DIS	ชั่วคราวแสนรุ่งพานิชย์
161	TMW04VB-01	ปลด	สับ "OFF" Auto Reclose		TMW		CB	22 เควี
162	แจ้ง HL ทำการเช็คเฟสที่ TMW04S-01 เมื่อเช็คเฟสเสร็จ เฟสตรง							
163	TMW04VB-01	สับ "OFF" Auto Reclose	ปลด		TMW		CB	22 เควี
164	เมื่อพร้อมเช็คเฟส TMW09 ที่ TMW09S-01							
165	TMW09S-02	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ทร.	SCADA	SF6	บ้านดอนโพรง
166	TMW09VB-01	ปลด	สับ "OFF" Auto Reclose		TMW		CB	22 เควี
167	แจ้ง HL ทำการเช็คเฟสที่ TMW09S-01 เมื่อเช็คเฟสเสร็จ เฟสตรง							
168	TMW09VB-01	สับ "OFF" Auto Reclose	ปลด		TMW		CB	22 เควี
169	จ่ายไฟระบบ 22 เควี							
170	TMW03S-01	ปลด	สับ		ทร.			Pothead F3
171	TMW04S-01	ปลด	สับ		ทร.			Pothead F4
172	TMW05S-01	ปลด	สับ		ทร.			Pothead F5
173	TMW09S-01	ปลด	สับ		ทร.			Pothead F9
174	TMW10S-01	ปลด	สับ		ทร.			Pothead F10
175	ย้ายโหลด TMW01 กลับจาก TMW02							
176	TMW01VB-01	ปลด	สับ "OFF" Auto Reclose		TMW		CB	22 เควี
177	TMU04S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทร.		DIS	คาร์แคร์หนองลาน
178	ย้ายโหลด TMW02, 07 กลับจาก KSA08							
179	TMW02VB-01	ปลด	สับ "OFF" Auto Reclose		TMW		CB	22 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
180	TMU04S-10	สับ	ปลด		กพส.	SCADA	SF6	หนองไม่งาม
181	ย้ายโหลด KSA08 กลับจาก KSA09							
182	KSA08S-09	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		กพส.		SF6	ม.เกษตรฯ
183	KSA08S-10	สับ	ปลด		กพส.	SCADA	SF6	ไปรษณีย์
184	ย้ายโหลด TMW09 กลับจาก SPO08							
185	TMW09VB-01	ปลด	สับ "OFF" Auto Reclose		TMW		CB	22 เควี
186	SPO08S-06	สับ	ปลด		ทร.	SCADA	SF6	ป้อมตำรวจดอนกะเพรา
187	ย้ายโหลด TMW03, TMW04 กลับจาก PTU03							
188	TMW03VB-01	ปลด	สับ "OFF" Auto Reclose		TMW		CB	22 เควี
189	TMW04VB-01	ปลด	สับ "OFF" Auto Reclose		TMW		CB	22 เควี
190	TMW03S-03	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		ทร.		SF6	หน้าโลตัสพระแท่น
191	PTU03S-03	สับ	ปลด		ทร.	SCADA	SF6	บ้านหนองพง
192	จ่ายไฟ TMW10 พร้อมตัดจ่ายใหม่							
193	TMW10VB-01	ปลด	สับ "OFF" Auto Reclose		TMW		CB	22 เควี
194	TMW10S-02	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		ทร.	SCADA	SF6	ข้าวแกง 15 บาท
195	TMW05S-03	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		ทร.		SF6	ร้านขายอาหารสัตว์สามแยกพระแท่น
196	TMW10S-08	สับ	ปลด		ทร.	SCADA	SF6	ตรงข้ามวัดตะคร้ำเอน
197	จ่ายไฟ TMW05 พร้อมตัดจ่ายใหม่							
198	TMW05VB-01	ปลด	สับ "OFF" Auto Reclose		TMW		CB	22 เควี
199	TMW05S-04	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		ทร.		SF6	ตลาดพระแท่น
200	TMK08S-05	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		ทร.		SF6	หน้าศูนย์ฮอนด้า
201	PTU02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PTU			
202	TMW01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMW			
203	TMW03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMW			
204	TMW-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMW			
205	TMW01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMW			
206	TMW02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMW			
207	TMW03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMW			
208	TMW04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMW			
209	TMW05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMW			
210	TMW09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMW			
211	TMW10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMW			
212	KSA-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KSA			
213	KSA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA			
214	KSA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA			
215	SPO-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPO			
216	SPO08R-01	Non-Reclosing, ALT	Normal		ทคก.		R	บ่อสุพรรณ
217	TMK-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMK			

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
218	TMK07R-01	Non-Reclosing, ALT	Normal		ทร.		R	เลยวัดหนองลาน
219	TMK08R-01	Non-Reclosing, ALT	Normal		ทร.		R	ครัวทอง (ป้อมบางจาก)
220	PTU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PTU			
221	PTU03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PTU			
สิ้นสุด Switching ช่วงทั้งหมด								


สภาพการจ่ายไฟก่อนปฏิบัติงาน

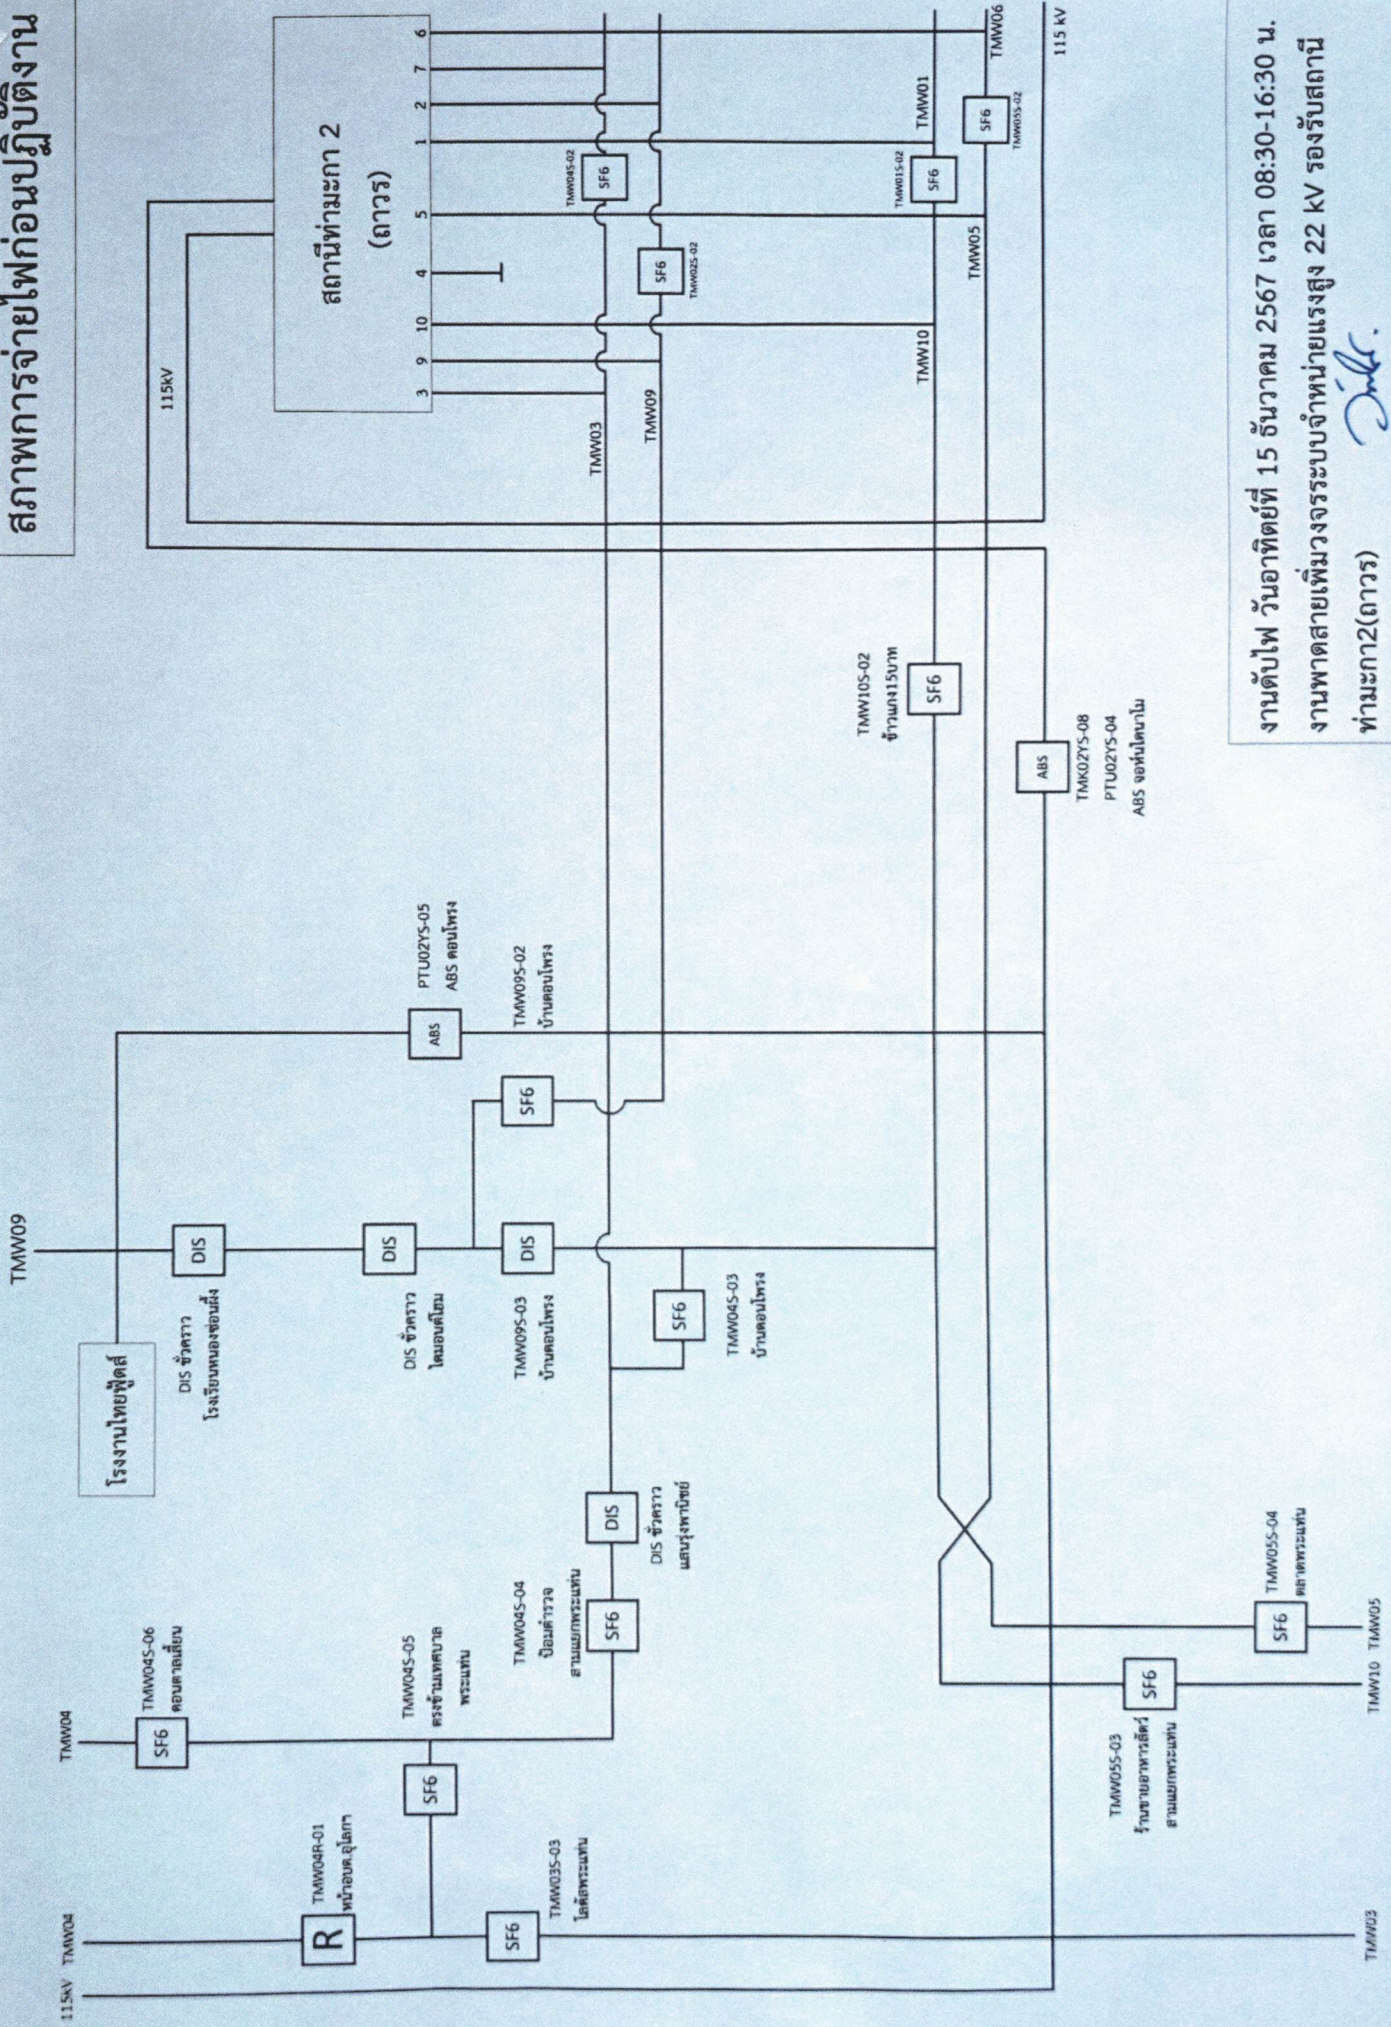

งานดับไฟ วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2567 เวลา 08:30-16:30 น.
 งานพาดสายเพิ่มวงจรระบบจำหน่ายแรงสูง 22 KV รองรับสถานี
 ท่ามะกา2(ถาวร)

Sub.

สภาพการจ่ายไฟหลังปฏิบัติงาน

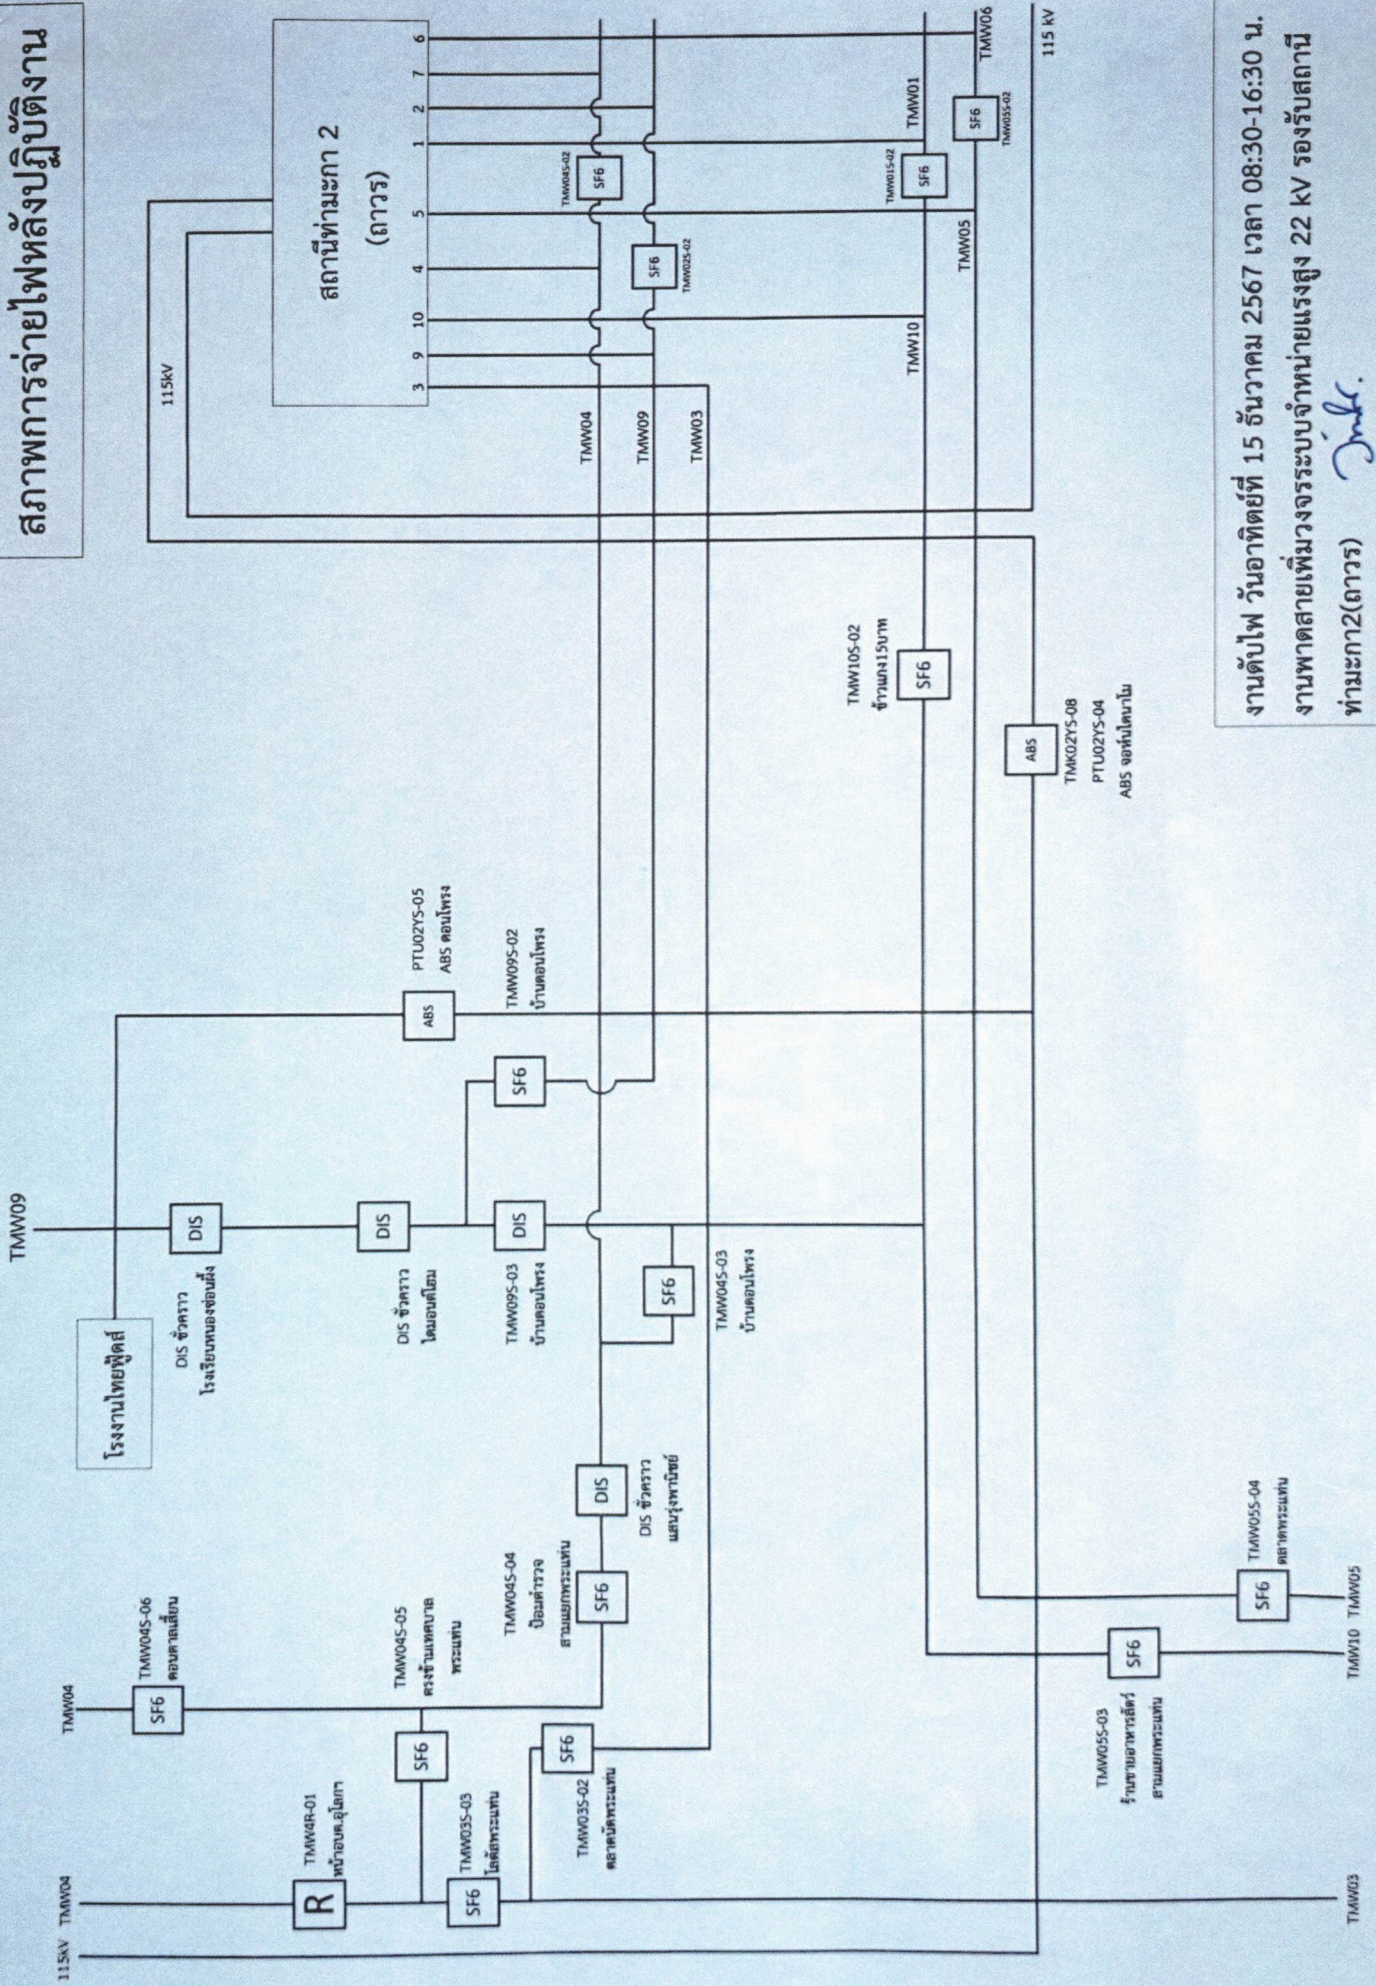

งานดับไฟ วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2567 เวลา 08:30-16:30 น.
 งานพาดสายเพิ่มวงจรระบบจำหน่ายแรงสูง 22 kV รองรับสถานี
 ท่ามะกา2(ถาวร) *Jink.*
