



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอดับไฟ

Switching Deadline

14 ธ.ค. 67

เลขที่ ก.ต.สค.(ปน) ๓๒๖๘ /๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชค
ชื่อผู้ส่ง นายวิโรจน์ เอกอำไพ

วันที่ ๙ ธ.ค. ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อภ.ปน.(กต)
ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.ภฟส.สค.

ด้วยการไฟฟ้า.....ภฟส.สค.....จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน ก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ KV บริเวณตั้งแต่ปากทางบางกะเจ้า ถึง CTแบ่งแดน บ้านแพ้ว ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....๔.....แผ่น ดังนี้


ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SMB๐๘	๑๕ ธ.ค.๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ก่อสร้างปรับปรุงระบบ จำหน่าย ๒๒ KV บริเวณ ตั้งแต่ปากทางบางกะเจ้า ถึง CTแบ่งแดน บ้าน แพ้ว	SMB๐๘S-๑๑ สะพานลอยบาง กะเจ้า	SMB๐๘S-๑๒ ปากซอยย่านชื่อ	นายศรชัย แสงสน โทร. ๐๘๓๑๕๕๖๒๙๙
๒	SMB๐๘	๑๕ ธ.ค.๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		SMB๐๘S-๑๑ สะพานลอยบาง กะเจ้า	ดิสชั่วคราวตรง ข้ามวัดบางตะ คอย	
๓	SMB๐๓	๑๕ ธ.ค.๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		SMB๐๓S-๐๖ สะพานลอยบาง กะเจ้า	ดิสชั่วคราวตรง ข้ามวัดบางตะ คอย	
๔	SMB๐๓	๑๕ ธ.ค.๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		ดิสชั่วคราวบ้ บางจาก	SMB๐๓S-๐๔ ซอยบางกะเจ้า	
๕	๑๑๕ เควี	๑๕ ธ.ค.๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		สถานีฯ สค.๕	SME๒YS-๐๗ สยามสมุทรไฟ เซนฟู้ดส์	
๖	๑๑๕ เควี	๑๕ ธ.ค.๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		SME๒YS-๐๗ สยามสมุทรไฟ เซนฟู้ดส์	สถานีฯ สค.๑๑	
๗	๑๑๕ เควี	๑๕ ธ.ค.๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		SME๒YS-๐๗ สยามสมุทรไฟ เซนฟู้ดส์	SME๒YS-๑๒ เคหะท่าจีน	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ..บริเวณ ตั้งแต่ปากทางบางกะเจ้าถึง ชนคณนบ้านแพ้ว

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....นายจิรวัฒน์ บุญพร้อม.....ตำแหน่ง..... พชง.๑.....โทร.....๐๘๖-๓๘๓๒๐๘๐.....

พื้นที่ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ.(หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....

(นาย วิโรจน์ เอกอำไพ)


ตำแหน่ง.....รจก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สค.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ SM608 จาก SMB85-11 ถึง SMB85-12
ในวันที่ 15 ธ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่ 1869/67
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ SM808 จาก SMB85-11 ถึง Dis ๖ด. ตรงข้ามวัดบางตะดอย
ในวันที่ 15 ธ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 3 ฟีดเดอร์ SM803 จาก SMB35-๐6 ถึง Dis ๓ด. ตรงข้ามวัดบางตะดอย
ในวันที่ 15 ธ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 4 ฟีดเดอร์ SM803 จาก Dis ๖ด. ไปบางจาก ถึง SMB35-04
ในวันที่ 15 ธ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 5 ฟีดเดอร์ 1151ด จาก SME ถึง SME2YS-07
ในวันที่ 15 ธ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 6 ฟีดเดอร์ 1151ด จาก SME2YS-07 ถึง SMK
ในวันที่ 15 ธ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 7 ฟีดเดอร์ 1151ด จาก SME2YS-07 ถึง SME2YS-12
ในวันที่ 15 ธ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย พิรุณกร โพธิ์โพธิ์ ประสานงานการขอดับไฟกับ นายวิวัฒน์ บุญโพธิ์


(นายพิรุณกร โพธิ์โพธิ์)
07 ธ.ค. 5 11:๓๔ นน.คพ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส.สค. , กฟส.สค. 2(บพ.)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 6 แผ่น
แผนผังแนบ 4 แผ่น


ผจพ. 2 (สถานี SMK)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)


(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณปาก ซ.บางกระเจ้า - แบ่งแดนบ้านแพ้ว (SMB03,08) , 115 KV					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	15 ธ.ค. 67	เวลา	08.00 น.	ถึง เวลา	17.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ศค.	งานที่ทำ	ก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1869/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย			นายพีรภัทร โพธิ์พันธุ์	วันที่	13 ธันวาคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	13 ธันวาคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	13 ธันวาคม 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย			1. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายวรรณพงษ์,นายมน โนช		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)	
			2. นายพีรภัทร,นางสาวสุกัญชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต		(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)	
			3. นายนครินทร์,นางสาวพิชยา,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ		(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการสวิตชิง						
2	** ขากลับ จ่ายไฟสถานีฯ สมุทรสาคร 15 รูปแบบ IN-OUT **						
3	SN2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		KT1A -
4	SN2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		KT2A -
5	SN2-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		KT3A -
6	SMB03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB		CB -
7	SMB08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB		CB -
8	SMB13VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB		CB -
9	SMB15VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB		CB -
10	SMK-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMK		TP1 -
11	SMK03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMK		CB -
12	SMK10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMK		CB -
13	SME-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SME		TP1 -
14	SME-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SME		TP2 -
15	SME01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME		CB -
16	SME06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME		CB -
17	SME08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME		CB -
18	SME02YB-03	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
19	SMD03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMD		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
20	SMK03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMK		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
21	- ย้ายโหลด SMB03 บางส่วน ไปจ่ายไฟจาก SME01						
22	SMB08S-13	ปลด	ล๊اب		บพว.		SF6 ตรงข้ามแยกบ้านแพ้ว
23	SMB03S-10	ปลด	ล๊اب		บพว.	SCADA	SF6 หน้าซีพี
24	SMEVB-01	ปลด	ล๊اب		SME		CB ขนานบัส
25	SMBVB-01	ปลด	ล๊اب		SMB		CB ขนานบัส
26	SMB03S-06	ล๊اب	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ศค.		DIS หน้า บ.สยามสมุทรโพเซนท์ (วงจรบน)
27	SMEVB-01	ล๊اب	ปลด		SME		CB ขนานบัส

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
28	SMBBV-01	สับ	ปลด		SMB		CB	ขนานบัส
29	SMB08S-13	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บพว.		SF6	ตรงข้ามแยกบ้านแพ้ว
30	- ย้ายโหลด SMB03 บางส่วน ไปจ่ายไฟจาก SMB13							
31	SMB03S-05	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สค.		SF6	ท้ายซอยบางกระเจ้า
32	SMB04VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMB		CB	-
33	SMB14VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMB		CB	-
34	SMB03S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สค.		DIS	ปาก ซ.บางกระเจ้า
35	SMB14VB-01	สับ	ปลด		SMB		CB	-
36	- ย้ายโหลด SMK06,07,08,10 ไปจ่ายไฟจาก SMB15 (ผ่านไลน์ SMK10)							
37	SMK10S-03	ปลด	สับ		สค.		SF6	ปากทางกระเช้าขาว
38	SMKBVB-01	สับ	ปลด		SMK		CB	ขนานบัส
39	- ย้ายโหลด SMK01,03,05 ไปจ่ายไฟจาก SMB04							
40	SMK1BVB-01	สับ	ปลด		SMK		CB	Incoming 1
41	SMK02YB-01	สับ	ปลด		SMK		CB	เบรกเกอร์ 115 เควี
42	SMK03YB-01	สับ	ปลด		SMK		CB	เบรกเกอร์ 115 เควี
43	SMK03YS-01	สับ	ปลด		SMK		DIS	ใบมิด 115 เควี
44	SMK03YS-02	สับ	ปลด		SMK		DIS	ใบมิด 115 เควี
45	แจ้ง Hotline 115 เควี ปลดสายส่ง 115 เควี บริเวณแยกก้านวัลลภ (ตามผังแนบ) เพื่อลดทอนระยะสายส่ง 115 เควี โดยวิธี Hotline แบบมีไฟ							
46	เมื่อ Hotline 115 เควี ปลดสายส่ง 115 เควี บริเวณแยกก้านวัลลภ แล้วเสร็จ							
47	แจ้งกฟส.บพว. ให้ ผขฟ. 115 เควี บริษัท CP ปลดโหลดภายในออก เตรียมพร้อมดับไฟระบบ 115 เควี							
48	ตรวจสอบสถานะจ่ายไฟระบบ 115 เควี สถานีฯ SME02YB-02,03 ,SME03YB-02,03 ,SME04YB-02,03 จ่ายไฟแบบ Close Loop ปกติ							
49	Open Loop ระบบสายส่ง 115 เควี							
50	- เมื่อพร้อมดับไฟระบบ 22 เควี และ 115 เควี ปฏิบัติงานเวลา 08.00 น.							
51	Dis ชั่วคราว SMB03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สค.		DIS	บีมบางจาก
52	SMB08S-11	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สค.		DIS	หน้าสยามสมุทรโพธิ์เช่นฟู้ด
53	SME02YB-02	สับ	ปลด		SME		CB	เบรกเกอร์ 115 เควี
54	SME02YB-03	สับ	ปลด		SME		CB	เบรกเกอร์ 115 เควี
55	SME02YS-04	สับ	ปลด		SME		DIS	ใบมิด 115 เควี
56	SME02YS-05	สับ	ปลด		SME		DIS	ใบมิด 115 เควี
57	SME02YS-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สค.		ABS	หน้า บ.สยามสมุทรโพธิ์เช่นฟู้ดส์
58	SME02YS-10	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บพว.		ABS	บ.เจริญโภคภัณฑ์
59	SME02YS-12	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สค.		ABS	ปากทางเคหะท่าจีน
60	แจ้งสถานะพื้นที่ไต่บให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ							
61	แจ้ง Hotline 115 เควี ปลดสายส่ง 115 เควี บริเวณหน้าสถานีฯ สมุทรสาคร 15 ออกทั้ง 3 เฟส							
62	เมื่อ Hotline 115 เควี ปลดสายส่ง 115 เควี บริเวณหน้าสถานีฯ สมุทรสาคร 15 ออกทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ							
63	แจ้ง Hotline 115 เควี เชื่อมสายส่ง 115 เควี ภายในสถานีฯ สมุทรสาคร 15 (เบย์ SMO03YB-01) เข้าทั้ง 3 เฟส							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
64	เมื่อ Hotline 115 เควี เชื่อมสายส่ง 115 เควี ภายในสถานีฯ สมุทรสาคร 15 (เบย์ SMO03YB-01) เข้าทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ						
65	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1 (ระบบ 115 เควี)						
66	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2 (ระบบ 115 เควี)						
67	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1 (ระบบ 22 เควี)						
68	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2 (ระบบ 22 เควี)						
69	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G3 (ระบบ 22 เควี)						
70	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G4 (ระบบ 22 เควี)						
71	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G5 (ระบบ 22 เควี)						
72	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G6 (ระบบ 22 เควี)						
73	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe						
74	SN2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		KT1A -
75	SN2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		KT2A -
76	SN2-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		KT3A -
77	SMB03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB		CB -
78	SMB07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB		CB -
79	SMB08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB		CB -
80	SMB13VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB		CB -
81	SMB15VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB		CB -
82	SME-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SME		TP1 -
83	SME-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SME		TP2 -
84	SME01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SME		CB -
85	SME06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SME		CB -
86	SME08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SME		CB -
87	SMD03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMD		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
88	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย						
89	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
90	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
91	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1 (ระบบ 115 เควี)						
92	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2 (ระบบ 115 เควี)						
93	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1 (ระบบ 22 เควี)						
94	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2 (ระบบ 22 เควี)						
95	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G3 (ระบบ 22 เควี)						
96	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G4 (ระบบ 22 เควี)						
97	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G5 (ระบบ 22 เควี)						
98	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G6 (ระบบ 22 เควี)						
99	SN2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		KT1A -
100	SN2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		KT2A -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
101	SN2-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		KT3A	-
102	SMB03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB		CB	-
103	SMB08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB		CB	-
104	SMB13VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB		CB	-
105	SMB15VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB		CB	-
106	SME-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SME		TP1	-
107	SME-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SME		TP2	-
108	SME01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME		CB	-
109	SME06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME		CB	-
110	SME08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME		CB	-
111	SME02YB-03	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME		CB	เบรกเกอร์ 115 เควี
112	-เมื่อพร้อมจ่ายไฟระบบ 22 เควี และ 115 เควี **ตรวจสอบงานหมายเลข 1816 ของ กฟส.ศค.2(บพว) ทำงานแล้วเสร็จพร้อมรับไฟ**							
113	Dis ชั่วคราว SMB03	ปลด	สับ		สค.		DIS	บึ้มบางจาก
114	SMB08S-11	ปลด	สับ		สค.		DIS	หน้า บ.สยามสมุทรโพเซ่นฟู้ดส์ (วงจรถ่วง)
115	SME02YS-12	ปลด, ล็อคกุญแจ	สับ		สค.		ABS	ปากทางเคหะท่าจีน
116	SME02YS-07	ปลด, ล็อคกุญแจ	สับ		สค.		ABS	หน้า บ.สยามสมุทรโพเซ่นฟู้ดส์
117	SME02YS-04	ปลด	สับ		SME		DIS	ใบมิด 115 เควี
118	SME02YS-05	ปลด	สับ		SME		DIS	ใบมิด 115 เควี
119	SME02YB-02	ปลด	สับ		SME		CB	เบรกเกอร์ 115 เควี
120	SME02YB-03	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SME		CB	เบรกเกอร์ 115 เควี
121	SMOBY-01	ปลด	สับ		SMO		DIS	ใบมิด 115 เควี
122	SMO01YS-01	ปลด	สับ		SMO		DIS	ใบมิด 115 เควี
123	SMO01YS-02	ปลด	สับ		SMO		DIS	ใบมิด 115 เควี
124	SMO03YS-01	ปลด	สับ		SMO		DIS	ใบมิด 115 เควี
125	SMO03YS-02	ปลด	สับ		SMO		DIS	ใบมิด 115 เควี
126	SMO01YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMO		CB	เบรกเกอร์ 115 เควี
127	SMO03YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMO		CB	เบรกเกอร์ 115 เควี
128	แจ้ง กฟส.บพว. ให้ ผขฟ. 115 เควี บริษัท CP พร้อมรับไฟภายใน							
129	SME02YS-10	ปลด ล็อคกุญแจ	สับ		บพว.		ABS	บ.เจริญโภคภัณฑ์
130	แจ้ง Hotline 115 เควี เชื่อมสายส่ง 115 เควี บริเวณแยกก้านวัลลภ (ตามผังแนบ) โดยวิธี Hotline แบบมีไฟ							
131	เมื่อ Hotline 115 เควี เชื่อมสายส่ง 115 เควี บริเวณแยกก้านวัลลภ แล้วเสร็จ							
132	- ย้ายโหลด SMK01,03,05 กลับจาก SMB04 (ผ่านไลน์ SMK03)							
133	SMK03YS-01	ปลด	สับ		SMK		DIS	ใบมิด 115 เควี
134	SMK03YS-02	ปลด	สับ		SMK		DIS	ใบมิด 115 เควี
135	SMK03YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMK		CB	เบรกเกอร์ 115 เควี
136	SMK02YB-01	ปลด	สับ		SMK		CB	เบรกเกอร์ 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
137	SMK1BVB-01	ปลด	สับ		SMK		CB	INC.01
138	SMB04VB-01	สับ	ปลด		SMB		CB	-
139	- ย้ายโหลด SMK06,07,08,10 กลับจาก SMB15 (ผ่านไลน์ SMK10)							
140	SMKBVB-01	ปลด	สับ		SMK		CB	ขนานบัส
141	SMK10S-03	สับ	ปลด		สค.		SF6	ปากทางกระช้ำขาว
142	- ย้ายโหลด SMB03 บางส่วน กลับจาก SMB13							
143	SMB04VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMB		CB	-
144	SMB14VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMB		CB	-
145	SMB03S-04	ปลด	สับ		สค.		DIS	ปาก ช.บางกระเจ้า
146	SMB03S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สค.		SF6	ท้ายซอยบางกระเจ้า
147	SMB04VB-01	สับ	ปลด		SMB		CB	-
148	SMB14VB-01	สับ	ปลด		SMB		CB	-
149	- ย้ายโหลด SMB03 บางส่วน กลับจาก SME01							
150	SMB08S-13	ปลด	สับ		บพว.		SF6	ตรงข้ามแยกบ้านแพ้ว
151	SMEBVB-01	ปลด	สับ		SME		CB	ขนานบัส
152	SMBBVB-01	ปลด	สับ		SMB		CB	ขนานบัส
153	SMB03S-06	ปลด	สับ		สค.		DIS	หน้า บ.สยามสมุทรโพเซนต์ (วงจรบน)
154	SMB03S-10	สับ	ปลด		บพว.	SCADA	SF6	หน้าซีพี
155	SMEBVB-01	สับ	ปลด		SME		CB	ขนานบัส
156	SMBBVB-01	สับ	ปลด		SMB		CB	ขนานบัส
157	SMB08S-13	สับ	ปลด		บพว.		SF6	ตรงข้ามแยกบ้านแพ้ว
158	SN2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		KT1A	-
159	SN2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		KT2A	-
160	SN2-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		KT3A	-
161	SMB03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB		CB	-
162	SMB08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB		CB	-
163	SMB13VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB		CB	-
164	SMB15VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB		CB	-
165	SMK-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMK		TP1	-
166	SMK03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMK		CB	-
167	SMK10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMK		CB	-
168	SME-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SME		TP1	-
169	SME-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SME		TP2	-
170	SME01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SME		CB	-
171	SME06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SME		CB	-
172	SME08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SME		CB	-


ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
173	SME02YB-03	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SME		CB	เบรกเกอร์ 115 เควี
174	SMD03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMD		CB	เบรกเกอร์ 115 เควี
175	SMK03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMK		CB	เบรกเกอร์ 115 เควี
176	SMO01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		#N/A		CB	เบรกเกอร์ 115 เควี
177	SMO03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		#N/A		CB	เบรกเกอร์ 115 เควี
<u>สิ้นสุด Switching ทั้งหมด</u>								

สถานะการจ่ายไฟตอนปฏิบัติงาน

วัดบางตะคอก

พื้นที่ปฏิบัติงาน

เลขสะพานลอยตรงข้ามบางกะเจ้า

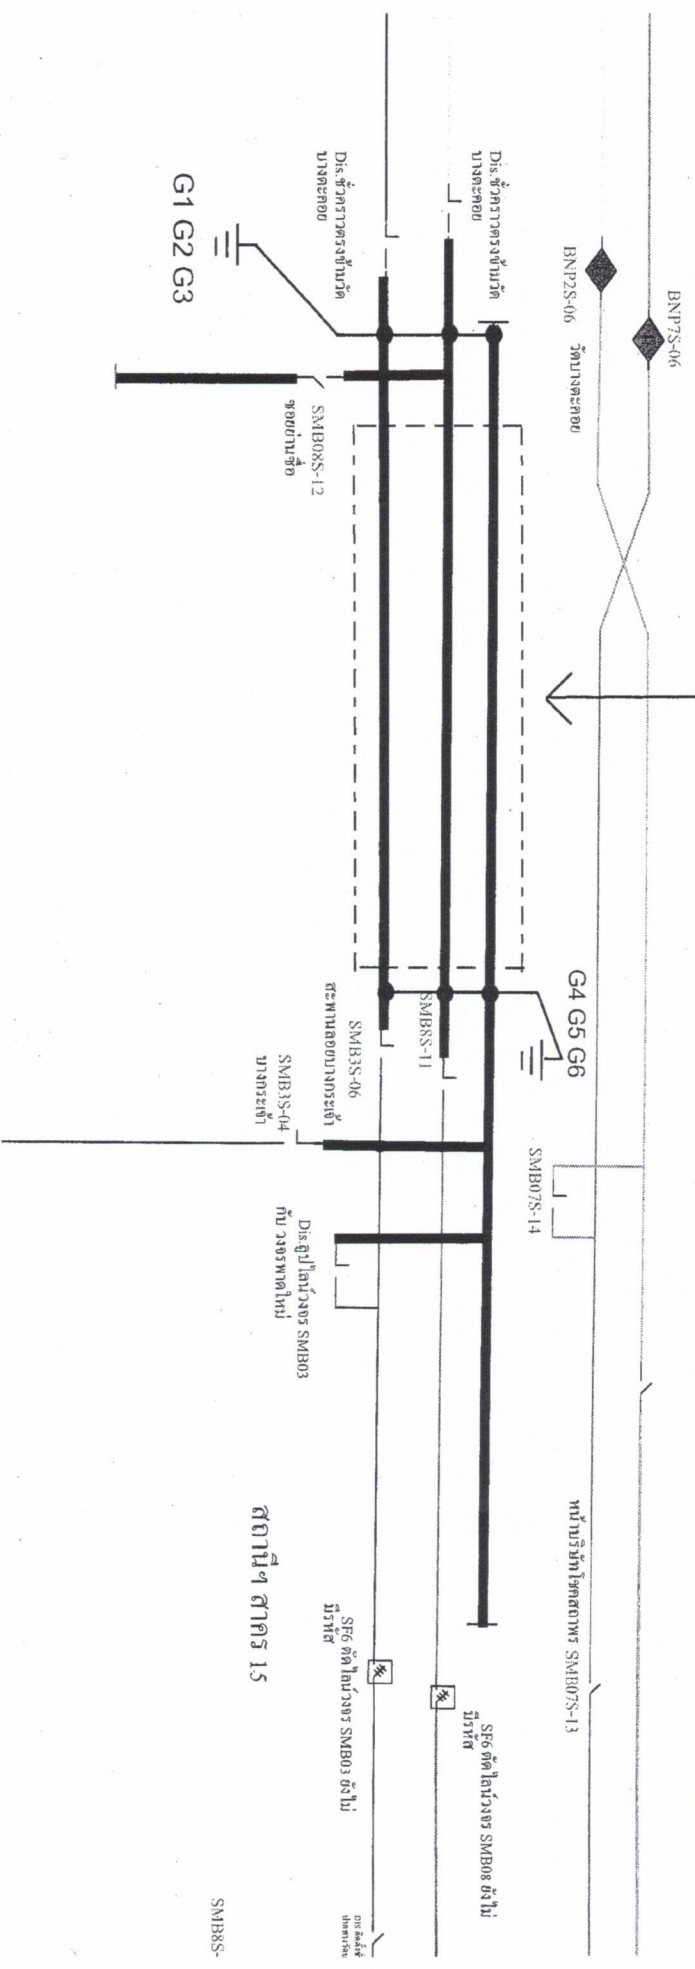

สถานีฯ ศาคร 15

SMB8S-

