



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
REGIONAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.สข.(กป.) ๓๑ /๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ ทวีธาสุวรรณพงษ์

ชื่อผู้ส่ง นายอุดมพงศ์ กาหลง

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.สข.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.อ.สามชุก จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงเปลี่ยนสายแรงสูงระบบจำหน่าย พีดเดอร์ ๓
สถานีไฟฟ้า เต็มบางฯ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	DOA๐๓	๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ตัดไฟปักเสา ทาดสายใหม่ บริเวณดิสชั่วคราวก่อนวัดหนองหินถึงดิสชั่วคราวหนองหัววัง	Dis ชั่วคราว ก่อนวัดหนองหิน	Dis ชั่วคราว หนองหัววัง	นายณัฐพงษ์ เข้มเพชร ๐๘๕-๕๕๘๓๐๔๖

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หม้อแปลง ๑๐ เครื่อง ๓๓๐ เควีเอ ผู้ใช้ไฟประมาณ ๒๕๐ ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเทอดไทย จันทร์เพ็ญ ตำแหน่ง ขส.กป โทร ๐๘๖-๗๖๖๑๑๒

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

นายอุดมพงศ์

(นายอุดมพงศ์ กาหลง)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.สข.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พีดเดอร์ DOA๐๓ จาก Dis ชั่ว ก่อนวัดหนองหินถึง Dis ชั่ว หนองหัววัง

ในวันที่ 1๖ ก.พ. 67 ตั้งแต่เวลา 0๘.๐๐ น. ถึง 17.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 188/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อัครเดช เกวาชิ่ง ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเทอดไทย จันทร์เพ็ญ
2 ก.พ. 67

(นายอุดมพงศ์)
กค.๖ ปฏิบัติงานแทน ผคฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส. อ.สข.

อก.บข.(ก.๓), อก.กว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

ขั้นตอนการสวิตชิง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผคฟ. (สถานี)



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

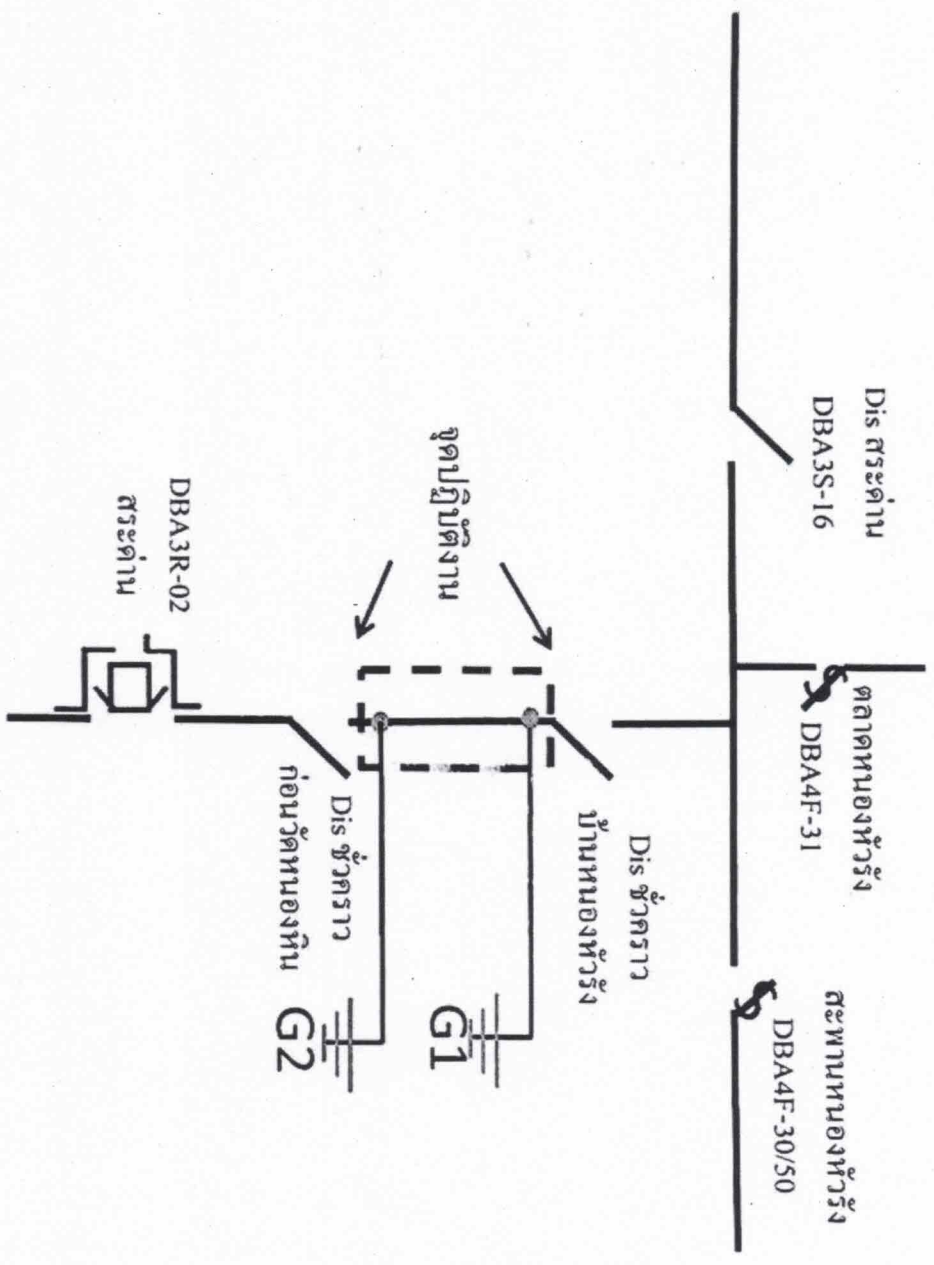
kt

1. สถานที่ทำงาน	วัดหนองหิน - หนองหัวรัง					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	13 ก.พ. 67	เวลา	08.00 น.	ถึง	17.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สช.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย		ตามใบขอปฏิบัติงาน	188/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวีรวัชร เสมามิ่ง			วันที่	2 กุมภาพันธ์ 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	2 กุมภาพันธ์ 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	2 กุมภาพันธ์ 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายนครินทร์,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิศ,นายวรรณพงษ์,นายมนโชน (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร,นางสาวสุกชชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		-
3	DOA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		
4	DBA03R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		สามชุก		R บ้านสระด่าน
5	DOA06R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ดจ.		R โคกหม้อ
6	ย้ายโหลด DOA03 บางส่วนไปจ่ายจาก DOA06						
7	DOABVB-01	ปลด	สับ		DOA		- ขนานบัส
8	DBA03S-16	ปลด	สับ		สามชุก		DIS บ้านสระด่าน
9	DIS ชค. DOA03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สามชุก		DIS ก่อนวัดหนองหิน
10	DOABVB-01	สับ	ปลด		DOA		- ขนานบัส
11	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
12	DIS ชค. โล้น DOA03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สามชุก		DIS หนองหัวรัง
13	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้พนักงานรับทราบ						
14	แจ้งพนักงานเทสไฟ ช็อตกราวด์ จุด G1						
15	แจ้งพนักงานเทสไฟ ช็อตกราวด์ จุด G2						
16	เมื่อไฟฟ้าหน้างาน ทำการเทสไฟ และช็อตกราวด์ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมให้ลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย						
17	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
18	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		-
19	DOA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		
20	DBA03R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		สามชุก		R บ้านสระด่าน
21	DOA06R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ดจ.		R โคกหม้อ
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
22	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
23	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		-
24	DOA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		
25	DBA03R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		สามชุก		R บ้านสระด่าน
26	DOA06R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ดจ.		R โคกหม้อ

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	แจ้งหน่วยงาน ปลดข้อตรารวด จุด G1						
28	แจ้งหน่วยงาน ปลดข้อตรารวด จุด G2						
29	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
30	DIS ชค. โลต์ DOA03	ปลด	สับ		สามชุก		DIS หนองหัวรัง
31	ย้ายโหลด DOA03 บางส่วนไปจ่ายจาก DOA06						
32	DOABVB-01	ปลด	สับ		DOA		- ขนานบัส
33	DIS ชค. DOA03	ปลด	สับ		สามชุก		DIS ก่อนวัดหนองหิน
34	DBA03S-16	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สามชุก		DIS บ้านสระด่าน
35	DOABVB-01	สับ	ปลด		DOA		- ขนานบัส
36	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		-
37	DOA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		
38	DBA03R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		สามชุก		R บ้านสระด่าน
39	DOA06R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ดจ.		R โคกหม้อ
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

ปฏิบัติงานเปลี่ยนสายแรงสูงระบบจำหน่าย วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567



G1 ช้อตกราวด์ นายปณิฑิต เทพบุตร ความคุมงาน
G2 ช้อตกราวด์ นายธนัช จันทร์เพ็ญ ความคุมงาน
