



Switching Deadline

30 พ.ย. 65

เลขที่ ก.๓/๒๕๖๕ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
 ชื่อผู้รับ นายพิพัฒน์ พงษ์สุวรรณมงคล ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)
 ชื่อผู้ส่ง นายเกิดดีพัฒน์ สุวรรณอักษรเดชา ตำแหน่ง ร.จก.(ท.) กฟผ.สพ.

ด้วยการไฟฟ้าสุพรรณบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน รื้อถอนอุปกรณ์ทางด้านแรงสูงงานสถานีสุพรรณบุรี๒ ตามแผนผังสังเขป

แนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	4 สท.	3/12/65	08.00	17.00	แก้ไขเสาแรงสูงที่บริเวณแยกหัวเกาะ	Dis SPA04S-04, Disชั่วคราวหัวเกาะ	SPA02S-03 SPA4S-02	โทร.๐๘๑-๘๕๖๖๕๗๙ นายวรพล สุทธิไกร
๒	2 สท.	3/12/65	08.00	17.00		DDE แยกตัว 1ก.	SPA2R-02	ร.น.วิทย์

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธนกร สุวรรณประทีป ตำแหน่ง พ.จ. (สท.) โทร. ๐๘๑-๘๓๖๐๒๖๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดผ. ครร. (ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
 ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายเกิดดีพัฒน์ สุวรรณอักษรเดชา)

ตำแหน่ง ร.จก.(ท.) กฟผ.สพ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ SPA4 จาก SPA4S-02 ถึง SPA2S-03, SPA4S-01
 ในวันที่ 3 ธ.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 1909/2565
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พิดเตอร์ SPA2 จาก DDE แยกตัว 1ก. ถึง SPA2R-02
 ในวันที่ 3 ธ.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 08.๐๐ น. ถึง 17.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อ.ไพโรจน์ ๑ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย ธนกร สุวรรณประทีป 1

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ป.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ. สพ.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายไพโรจน์ ไพโรจน์)
 ๐๘๑. 4 ๓๓๓ ๔๓๓๓

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง 2 แผ่น


แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
 ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเสอพงค์ แก่นจันทร์)
 รก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณแยกหัวเกาะ							
2. กำหนดวันที่ทำงาน	3 ธ.ค. 65	ระหว่าง	08.00	น.	ถึง	3 ธ.ค. 65	17.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ.สพ.	งานที่ทำ	แก้ไขเสาแรงสูงหัก			ตามใบขอปฏิบัติงาน 1909/2565		
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมนเฑาะ ท่องย้อย					วันที่	30 พฤศจิกายน 2565	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย						วันที่	30 พฤศจิกายน 2565	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย						วันที่	30 พฤศจิกายน 2565	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายพิชชา, นายสุธี, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SPA02R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.		R หัวเกาะ
3	SPA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-
4	SPA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-
5	*ย้ายโหลด SPA02 บางส่วนไปรับไฟจาก SPA04*						
6	SPA02S-05	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6 รั้วพอเพียง
7	SPA02R-02	สับ	ปลด		สพ.		R หัวเกาะ
8	ปลดสวิตซ์ใบมีดด้านโหลดของ SPA02R-02 (R.หัวเกาะ) ออกทั้งสามเฟส						
9	*ย้ายโหลด SPA04 บางส่วนไปรับไฟจาก SPA02*						
10	SPA02S-20	ปลด	สับ		สพ.		SF6 แยกไฟแดงสะพานลอยโพธิ์พระยา
11	SPA04S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS สุพรรณคอนกรีต
12	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.00 น.						
13	SPA04S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS หน้าสถานีฯ
14	แจ้ง กฟจ.สพ. ทำการโอนโหลดหม้อแปลงตั้งจุดตัด DDE(บริเวณแยกหัวเกาะ) -SPA02S-03(แยกหัวเกาะซอย 5)-SPA02R-02(หัวเกาะ) ออกทั้งหมด						
15	หลังจากกฟจ.สพ. ทำการโอนโหลดหม้อแปลงตั้งจุดตัด DDE(บริเวณแยกหัวเกาะ) -SPA02S-03(แยกหัวเกาะซอย 5)-SPA02R-02(หัวเกาะ) ออกทั้งหมดแล้วเสร็จ						
16	แจ้ง ฮอทไลน์กระเช้าสุพรรณบุรีทำการตัด DDE บริเวณแยกหัวเกาะ ออกทั้งสามเฟส						
17	หลังจากฮอทไลน์กระเช้าสุพรรณบุรีทำการตัด DDE บริเวณแยกหัวเกาะ ออกทั้งสามเฟส แล้วเสร็จ						
18	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานทราบ						
19	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
20	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
21	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G3						
22	หลังจากชุดปฏิบัติงาน Test ไฟ และ Short Ground พร้อมลงใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
23	แจ้งชุดปฏิบัติงานปฏิบัติงานได้						
24	SPA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
25	SPA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							150
26	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานแล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหลดกลับ						
27	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตช์ตัดตอน ก่อนทำการสวิตซ์						
28	SPA02R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.		R หัวเกาะ
29	SPA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-
30	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1						
31	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2						
32	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G3						
33	ยืนยันการลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
34	แจ้ง ฮอทไลน์กระเช้าสุพรรณบุรีทำการเชื่อม DDE บริเวณแยกหัวเกาะ เข้าทั้งสามเฟส						
35	หลังจากฮอทไลน์กระเช้าสุพรรณบุรีทำการเชื่อม DDE บริเวณแยกหัวเกาะ เข้าทั้งสามเฟส แล้วเสร็จ						
36	แจ้ง กฟจ.สพ. นำโหลดหม้อแปลงกลับคืนสภาพปกติ						
37	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
38	SPA04S-02	ปลด	ล๊ับ		สพ.		DIS หน้าสถานีฯ
39	*ย้ายโหลด SPA04 บางส่วนกลับคืนจาก SPA02*						
40	SPA04S-04	ปลด	ล๊ับ		สพ.		DIS สุพรรณคอนกรีต
41	SPA02S-20	ล๊ับ	ปลด, ล็อคคาน		สพ.		SF6 แยกไฟแดงสะพานลอยโพธิ์พระยา
42	*ย้ายโหลด SPA02 บางส่วนกลับคืนจาก SPA04*						
43	ล๊ับสวิตซ์ขีมีตด้านโหลดของ SPA02R-02 (R.หัวเกาะ) เข้าทั้งสามเฟส						
44	SPA02R-02	ปลด	ล๊ับ คง Nonreclosing		สพ.		R หัวเกาะ
45	SPA02S-05	ล๊ับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6 รั้วพอเพียง
46	SPA02R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		สพ.		R หัวเกาะ
47	SPA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
48	SPA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบ.กฟภ.สท.
เลขที่ ก.3 สท.(ปบ.)-

เรื่อง ขออนุมัติแผนงานค้ำกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย
เรียน ผจก.กฟภ.สท./รจก.กฟภ.สท.

ถึง ผจก.กฟภ.สท.
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดสุพรรณบุรี


๕๕:30

ด้วยในวันที่ 3 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. กฟภ.สุพรรณบุรี มีแผนงานค้ำไฟฟ้าบริเวณ ...แยกหัวเกาะ ...เพื่อ ...แก้ไขเสาแรงสูงหักค้ำตั้งข้ามถนนบริเวณแยกหัวเกาะ สถานีสุพรรณบุรี...โดยมีรายละเอียด

พิกัด ...4... สถานี ...สุพรรณบุรี... ตั้งแต่บริเวณ ...แยกหัวเกาะ

กฟภ.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้นายปรีชา ทองระย้า ตำแหน่ง ผจก.กฟภ.สท. เบอร์โทรศัพท์ ...090-1439114...เป็นผู้ควบคุมงานและให้...นายวรพล สุทธิไกร ...ตำแหน่ง ผ.กส.กฟภ.สท.เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ...098-2753640...

เป็นผู้ประสานงานการค้ำไฟเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด

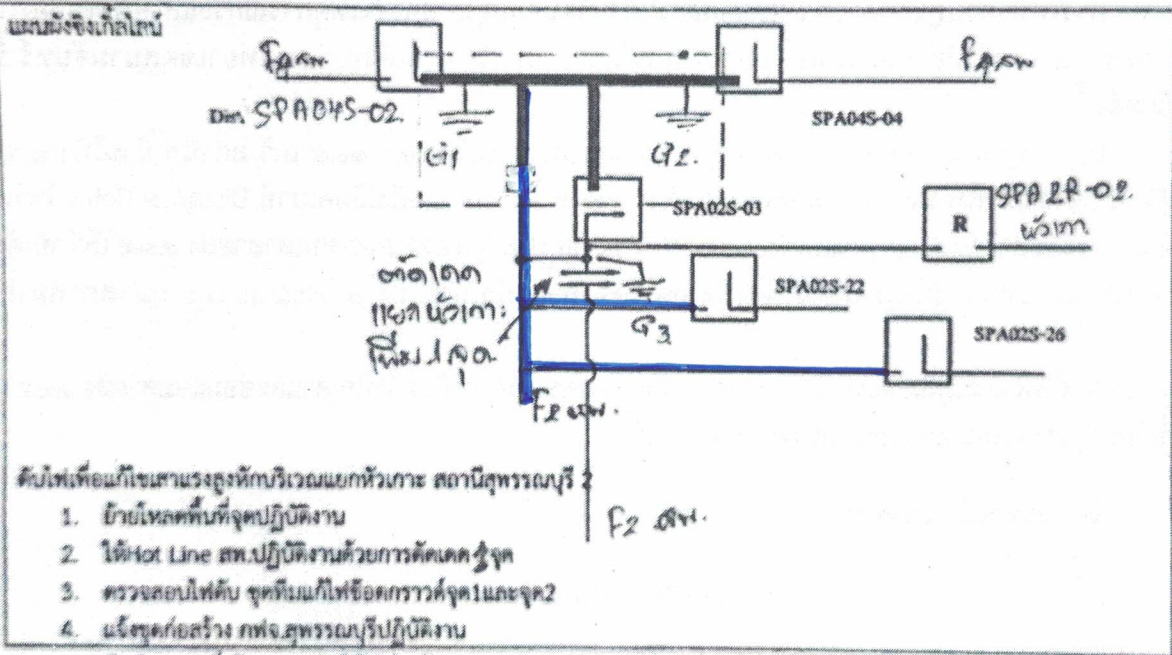

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย

อนุมัติ

Ok
(นายอนนกร สุวรรณประทีป)
พช.6(สท.) ผบ.กฟภ.สท.

(นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอักษรเดชา)
ของผู้จัดการปฏิบัติงานแทนผู้จัดการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรี

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา

โทร 035-5251276, 5255110

OPPO A9 2020
