



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.อ.ม.น.(ป.น.) 2132./๒๕๖๗.

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตราสุวรรณชวล

ชื่อผู้ส่ง นายสมศักดิ์ นุชสาย

วิญญูขอตัดไฟ

Switching Deadline

23 ธ.ค. 67

วันที่ ๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๗

ตำแหน่ง อ.ก.ป.น.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.อ.ม.น.

ด้วยการไฟฟ้า อ้อมน้อย ขอตัดไฟระบบ ๑๑๕ เควี ให้ชุดงานก่อสร้าง กฟส.อ้อมน้อย ปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี ไต้ไลน์ ๑๑๕ เควี ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผน ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	๑๑๕ kV	๒๔ ธ.ค. ๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ขอตัดไฟระบบ ๑๑๕ เควี เพื่อให้ชุดงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี ไต้ไลน์ ๑๑๕ เควี แนวถนนพุทธสาคร	ONB๐๒YS-๐๑	ONE๐๑YS-๐๑	นายวรพจน์ แก่นสวาสดี ๐๙๔-๔๓๙-๒๒๖๑ พชง.๕ กฟส.อ้อมน้อย

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ)...(ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ.)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเกียรติศักดิ์...ขาวหนู ตำแหน่ง พชง.๖ ผปบ. โทร ๐๖๓-๒๔๖-๔๙๕๓

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓. พิกัดพื้นที่ดับไฟ

๓.๑ เริ่มต้น Lat : ๑๓.๖๗๔๘๕๕๑ , ๑๐๐.๓๑๘๘๘๘๑


๓.๒ สิ้นสุด Lat : ๑๓.๖๗๙๗๗๖๘ , ๑๐๐.๓๒๐๕๕๖



(นายสมศักดิ์...นุชสาย.)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อมม.

๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๗



แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา

โทร ๐๒-๔๒๐๖๖๕๖

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเตอร์ 115kv จาก ONB 298-01 ถึง ONE 148-01
ในวันที่ 24 ธ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1921/67

พนักงานศูนย์ฯ นาย อภิชาติ เกษมกุล ประสานงานการขอดับไฟกับ นายเกษร ศิษิตถ์ ยานนท์

อภิชาติ
(นายอภิชาติ เกษมกุล)
๑๑๑.5 นท. นท.๑๗.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ. ๑๓๗.

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง.....1.....แผ่น

แผนผังแนบ.....1.....แผ่น

(ONB) (ONE)
ผจพ. 2 (สถานี อ้อมน้อย ๑, อ้อมน้อย 5 (การร))

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)


รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำ Switching

1. สถานที่ทำงาน	แนวถนนพุทธสาคร (ONB02YB-01 - ONE01YB-01)				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	24 ธ.ค. 67	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.อมมร.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่ายใต้โลนสายส่ง 115 เควี ตามใบขอปฏิบัติงาน 1921/2567		
4. เตรียมการ Switching โดย	นายศุภสวัสดิ์ เที่ยงผดุง			วันที่	20 ธันวาคม 2567
5. ตรวจสอบ Switching โดย				วันที่	20 ธันวาคม 2567
6. อนุมัติ Switching โดย				วันที่	20 ธันวาคม 2567
7. สั่งทำ Switching โดย	1. นายนครินทร์, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายจิรวัฒน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร, น.ส.สุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการ Switching						
2	ONB02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB		
3	ONE01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONE		
4	เมื่อพร้อมดับไฟ						
5	ตรวจสอบสภาพการจ่ายไฟระบบ 115 เควี Loop SAA01YB-01, SAA03YB-01 จ่ายไฟ Close Loop ปกติ						
6	ONB02YB-01	สับ	ปลด		ONB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
7	ONB02YS-02	สับ	ปลด		ONB		- ใบมีด 115 เควี
8	ONB02YS-03	สับ	ปลด		ONB		- ใบมีด 115 เควี
9	ONE01YB-01	สับ	ปลด		ONE		- เบรกคดกอร์ 115 เควี
10	ONE01YS-01	สับ	ปลด		ONE		- ใบมีด 115 เควี
11	ONE01YS-03	สับ	ปลด		ONE		- ใบมีด 115 เควี
12	แจ้งสถานะการจ่ายไฟให้ผู้ควบคุมงานทราบ						
13	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G1 (115 เควี)						
14	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G2 (115 เควี)						
15	หลังจากทำการ Test ไฟ Short Ground ครบทุกจุด พร้อมลงรายละเอียดใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
16	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้						
***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก *****							
17	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
18	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ ปลด Short Ground จุด G1 (115 เควี)						
19	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ ปลด Short Ground จุด G2 (115 เควี)						
20	หลังจากทำการ ปลด Short Ground ออก ครบทุกจุด พร้อมยืนยันข้อมูลลงใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
21	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
22	ONB02YS-02	ปลด	สับ		ONB		- ใบมีด 115 เควี
23	ONB02YS-03	ปลด	สับ		ONB		- ใบมีด 115 เควี
24	ONB02YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		ONB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
25	จ่ายไฟระบบ 115 เควี Loop SAA01YB-01, SAA03YB-01 Close Loop ตามสภาพปกติ						
26	ONE01YS-01	ปลด	สับ		ONE		- ใบมีด 115 เควี
27	ONE01YS-03	ปลด	สับ		ONE		- ใบมีด 115 เควี
28	ONE01YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		ONE		- เบรกคดกอร์ 115 เควี
29	ONB02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONB		
30	ONE01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONE		
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							

สถานีอ้อมน้อย 5 (ถาวร) (ONE)
พิกัด 13.6900910 , 100.3256650

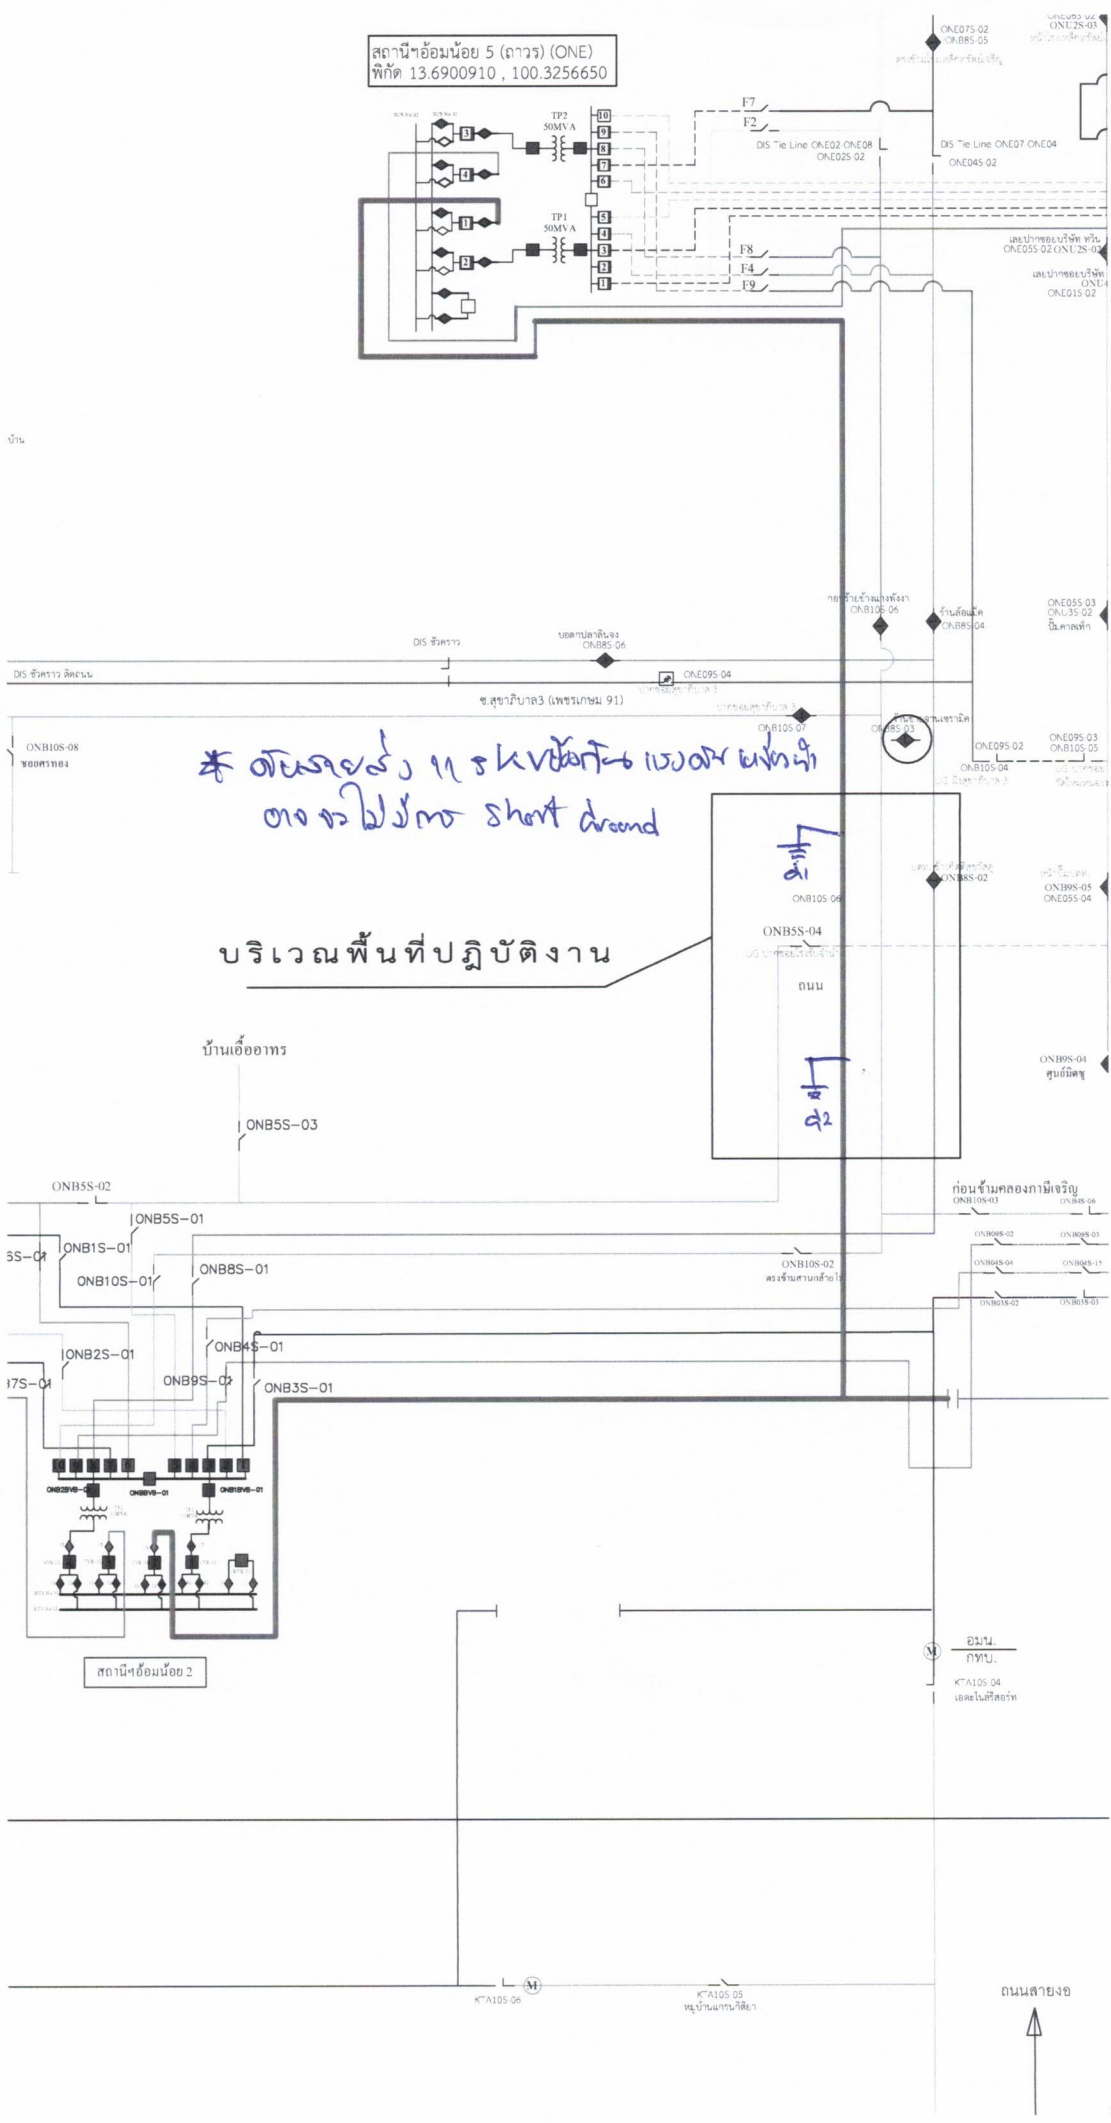

* ตรวจสอบว่า มี short circuit ในบริเวณพื้นที่
ของบริเวณ short circuit

บริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน

สถานีอ้อมน้อย 2





การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกส.กฟส.อ้อมน้อย

ถึง ผกส.กฟส.อ้อมน้อย

เลขที่

วันที่ ๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน

อ้างถึง อนุมัติ ก.๓ กวว.(วร) ๔๗๘/๒๕๖๗ ลว. ๑ มี.ค. ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนผังบริเวณที่ขอดับไฟ

เรียน ผกส./ รจก(ท.) กฟส.อ้อมน้อย

ด้วยในวันอังคารที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ผกส.กฟส.อ้อมน้อย มีแผนปฏิบัติงานปักเสาแรงสูงแซมไลน์ ขนาด ๑๒.๒๐ เมตร งานป.ระบบจำหน่าย๒๒ เควี (ได้แนวสายส่ง ๑๑๕ เควี) จำนวน ๓ ต้น โดยมีรายละเอียดวงจรถัดไปปฏิบัติงานดังนี้

๑. ระบบสายส่ง ๑๑๕ เควี สถานีฯ.....ตั้งแต่ บริเวณปากซอยแยกเพชรเกษม ๑๑

ถึง.....ร้านขายพืชศุภกรณ์ก่อสร้าง เชียงสะพานลอย.....

๒. ระบบจำหน่าย ๒๒ เควี สถานีฯ.....ตั้งแต่.....

ถึง.....

๓. ระบบจำหน่ายแรงต่ำ หม้อแปลง.....ตั้งแต่.....

ทั้งนี้ ผกส.กฟส.อ้อมน้อย ได้มอบหมายให้ นายวรพจน์ แก่นสวาสดี พนักงานช่างระดับ ๕ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ๐๙๔-๔๓๙๒๒๖๑ เป็นผู้ควบคุมและประสานงานในการดับไฟให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และแล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด

(นายเสนห์ พยับเดช)

ผ.ก.ส.กฟส.อ้อมน้อย

ผ.ป.บ.,ผ.ก.ส.

- อนุมัติและแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการ
- ประสานงาน ผกส. พร้อมจัดทำประกาศดับไฟ

(นายจรเดช นิยมศิริ)

รจก(ท) ปฏิบัติงานแทน

ผกส.กฟส.อ้อมน้อย

แผนกก่อสร้าง

โทรศัพท์ ๑๔๓๕๑
