



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3.สข.(กป.) 477 /2567

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชัย

ชื่อผู้ส่ง นางวรรณวิภา สุวรรณสมบัติ

Switching Deadline

26 ธ.ค. 2567

วันที่ 20 ธ.ค. 2567

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.3)

ตำแหน่ง ทพ.บค.รักษาการแทน ผจก.กฟส.สามชุก

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.สามชุก จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย ฟีดเดอร์ 2 สถานีไฟฟ้า
สามชุก ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

| ที่ | ฟีดเดอร์ | วัน/เดือน/ปี | ตั้งแต่เวลา | ถึงเวลา | ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ | จาก | ถึง | ผู้ควบคุมงาน |
|-----|----------|--------------|-------------|----------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| ๑. | XCA2 | 27 ธ.ค. 2567 | 08.30 น. | 17.00 น. | ดับไฟพาดสายติดอุปกรณ์ | DIS ชั่วคราว บ้านดอนมดดำ | DIS ชั่วคราว ใต้สายส่ง E-GAT | นายณัฐพงษ์ เข้มเพ็ชร 085-5583046 |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หม้อแปลง 2 เครื่อง 60 เควีเอ ผู้ใช้ไฟประมาณ 100 ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเทอดไทย จันทร์เพ็ญ ตำแหน่ง ชผ.กป โทร 086-7661012

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

1. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด

2. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

3. พิกัดพื้นที่ดับไฟ

3.1 เริ่มต้น

3.2 สิ้นสุด

14.722742, 100.132827
14.725009, 100.139807

(นางวรรณวิภา สุวรรณสมบัติ)

ทพ.บค.รักษาการแทน ผจก.กฟส.สามชุก

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.3

เรียน อก.ปบ.(ก.3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 5CA106 จาก *Dis ชั่ว* ถึง *Antihacker Expert*

ในวันที่ ๑๗ ธ.ค. ๖๗ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1923/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ... ฟีดเดอร์... จาก... ถึง...

ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่...

ออกกฟผ.

พนักงานศูนย์ฯ นาย ศักดิ์สิทธิ์ โองมระชาต ประสานงานการขอตัดไฟกับ *Antihacker Expert*

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. *Antihacker Expert*

.....อก.บช.(ก.3), อก.วว.(ก.3)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

รุ่งโรจน์
(นางสาวรุ่งโรจน์ รุ่งโรจน์)
รศ.ร 1111 ทพ.กฟ.



ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)


ใบสั่งทำสวิตชิง

| | | | | | | |
|------------------------|--|----------|---------------------------|-------------------|---|--|
| 1. สถานที่ทำงาน | บริเวณบ้านดอนมดดำ - ใต้สายส่ง Egat (XCA06) | | | | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 27 ธ.ค. 67 | ระหว่าง | 08.30 น. | ถึง | 17.00 น. | |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟส.สข. | งานที่ทำ | ปรับปรุงระบบจำหน่าย XCA06 | ตามใบขอปฏิบัติงาน | 1923/2567 | |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด | | | วันที่ | 22 ธันวาคม 2567 | |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | | วันที่ | 22 ธันวาคม 2567 | |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย |  | | | วันที่ | 22 ธันวาคม 2567 | |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. จรวัฒน์, วัฒนา, พิชชา, วีรวัชร, ออมร 2. นครินทร์, สาวพิชชา, ณัฐกาญจน์, สุธี, สามารถ 3. ศุภสวัสดิ์, อนุสรณ์, ธนิต, วรณพงษ์, มโนช | | | | (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | |

| ที่ | รหัสอุปกรณ์ | สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ | ดำเนินการ | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ |
|--|--|--------------------------------------|----------------------|------|--------------|------------|-----------------|
| 1 | ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง | | | | | | |
| 3 | XCA06VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | XCA | | CB |
| 4 | - เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 08.30 น. | | | | | | |
| 5 | DIS ชค. XCA06 | สับ | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) | | สข. | | DIS บ้านดอนมดดำ |
| 6 | แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ | | | | | | |
| 7 | แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1 | | | | | | |
| 8 | แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2 | | | | | | |
| 9 | แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe | | | | | | |
| 10 | XCA06VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | XCA | | CB |
| 11 | เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย | | | | | | |
| 12 | แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้ | | | | | | |
| สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า | | | | | | | |
| เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ | | | | | | | |
| 13 | แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1 | | | | | | |
| 14 | แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2 | | | | | | |
| 15 | XCA06VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | XCA | | CB |
| 16 | - เมื่อพร้อมจ่ายไฟ | | | | | | |
| 17 | DIS ชค. XCA06 | ปลด | สับ | | สข. | | DIS บ้านดอนมดดำ |
| 18 | XCA06VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | XCA | | CB |
| สิ้นสุด Switching ทั้งหมด | | | | | | | |

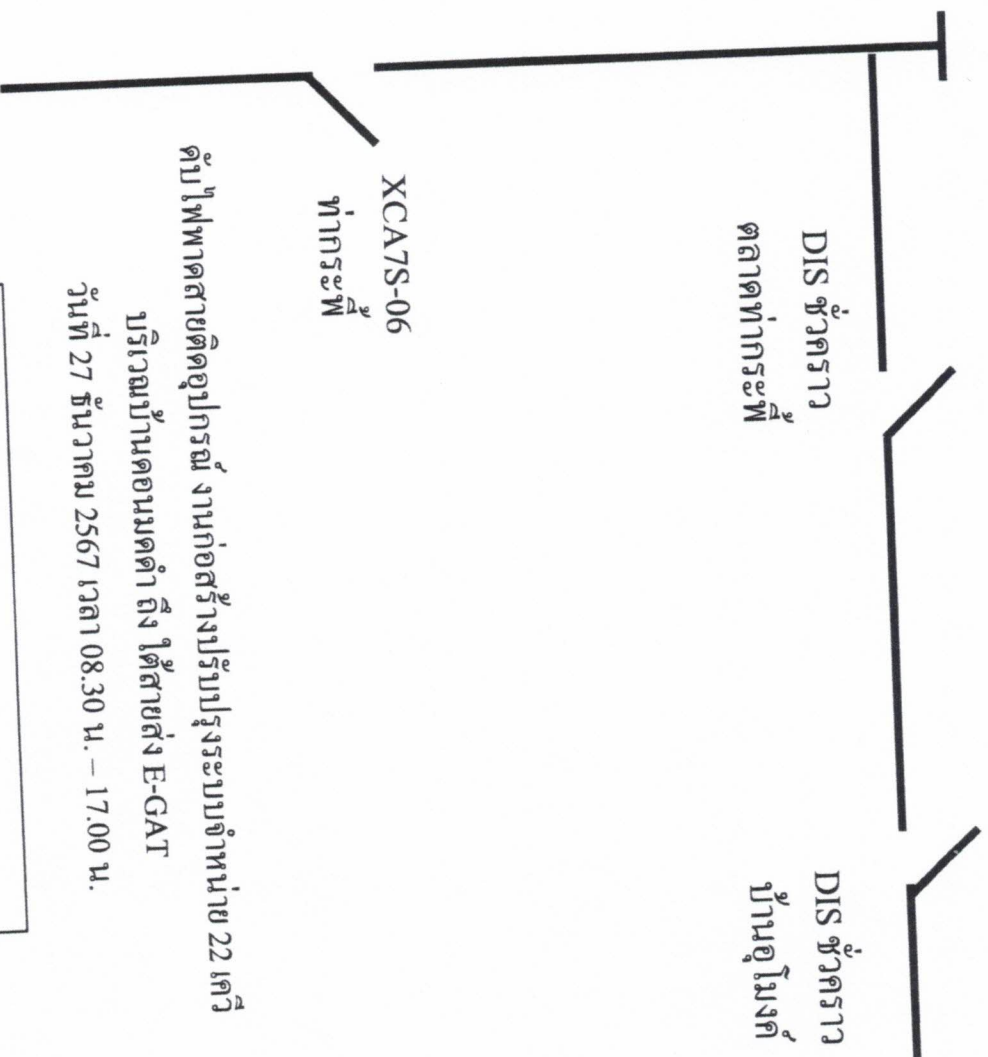

ดับไฟพาดสายติดอุปกรณ์ งานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี
บริเวณบ้านคอนมตต่ำ ถึง ใต้สายส่ง E-GAT
วันที่ 27 ธันวาคม 2567 เวลา 08.30 น. - 17.00 น.

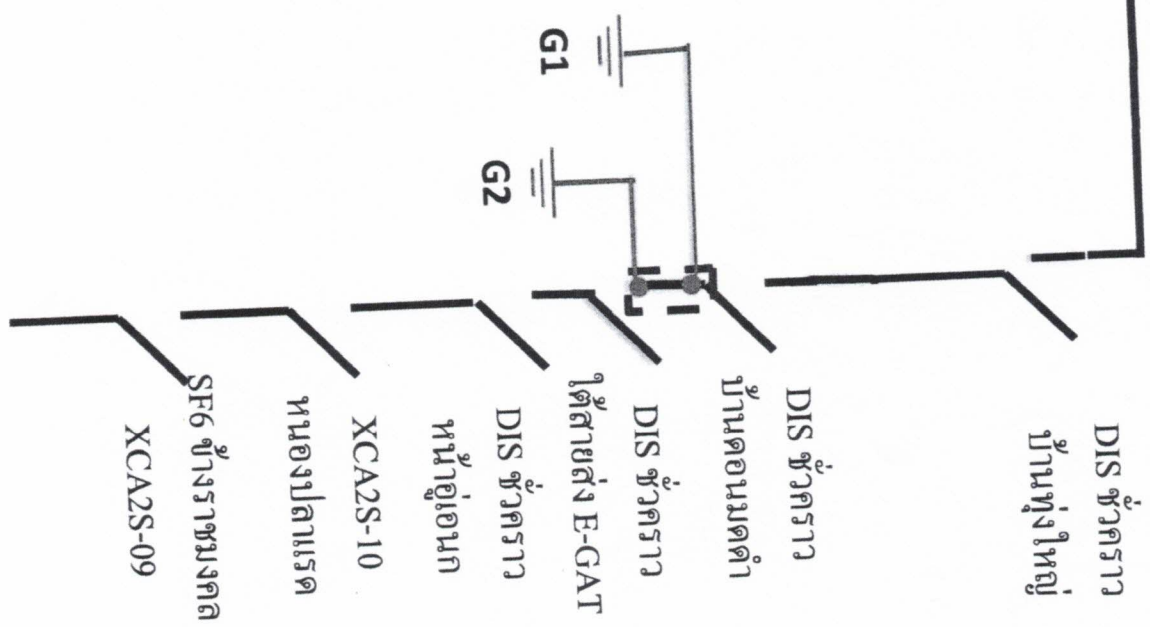

ผู้ช้ขอตรวจวัดจุด G1
นายภูวนัย ทิมหอม พชง.4 ผกป.กฟส.สามชุก
ผู้ช้ขอตรวจวัดจุด G2
นาย ปิณฑพัทธ์ เทพบุตร พชง.5 ผกป.กฟส.สามชุก
