



## วิญญูขอตัดไฟ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITYเลขที่ ก.๓.สค.(ปน.) ๗๑๕๓ /๒๕๖๕  
ชื่อผู้รับ นายพิทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล  
ชื่อผู้ส่ง นายยศพัทธ์ บัวบุตรวันที่ ๒๕ พ.ย. ๒๕๖๕  
ตำแหน่ง อ.ก.ปน.(ก๓)  
ตำแหน่ง ร.จก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟล.สค.ชั้น๑ด้วยการไฟฟ้า กฟล.สค.ชั้น๑ จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบจำหน่าย ๒๒ เครือ ตามแผนผังสังเขป  
แนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	พีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SMW๐๕	๙ ธ.ค. ๖๕	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ย้ายแนวสายไฟ ระบบ จำหน่าย ๒๒ เครือ ให้อบจ. สร้างสะพาน บริเวณ ปากช.เสรี	จุดปลดสายโดยวิธี ฮอทไลน์กระเช้า บริเวณ ปากช.เสรี	Dis ติดตั้งชั่วคราว หน้า บ. เทพปราณี น้ำแข็ง	นายสุรพันธ์ คำอูคม โทร.๐๘๔-๖๓๕๓๖๖๘

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บริเวณ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอำนาจ เวียนทอง ตำแหน่ง ทผ.ปน โทร ๐๘๑-๙๙๕๕๒๖๐

พื้นที่ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ.(หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

( นายยศพัทธ์ บัวบุตร )

ตำแหน่ง ร.จก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟล.สค.ชั้น๑

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓  
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเตอร์ SMV5 จาก ๑๑๒๓๔๕๖๗๘๙ ถึง Div ๑๓. นาย บ.เทพประสิทธิ์  
ในวันที่ ๑ ธ.ค. ๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1930/2565
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....


พนักงานศูนย์ฯ นาย อธิคุณ วัฒนสิทธิ์ ประธานงานการขอดับไฟกับ ๑๓๐๖๒๓๔ ๑๕๖๗๘

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ.๑๓.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)


  
(นาย..... สังกัด.....)  
๑๓.๑๒.๖๕

ขั้นตอนการสวิตซ์..... 2 ..... แผ่น  
แผนผังแนบ..... 2 ..... แผ่น

ผจฟ. (สถานี.....)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

  
(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ปากซอย เสรี					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	9 ธ.ค. 65	เวลา	08.00 น.	ถึง	เวลา	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	สค.	งานที่ทำ	ย้ายแนวสายไฟ ให้ อบจ.สร้างสะพาน		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1930/65
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายณัฐกาญจน์ รมโพธิ์ทอง			วันที่	1 ธันวาคม 2565	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	1 ธันวาคม 2565	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	1 ธันวาคม 2565	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)		
	2. นายสถาพร, นายพิชชา, นายสุธี, นายอมร			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)		
	3. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

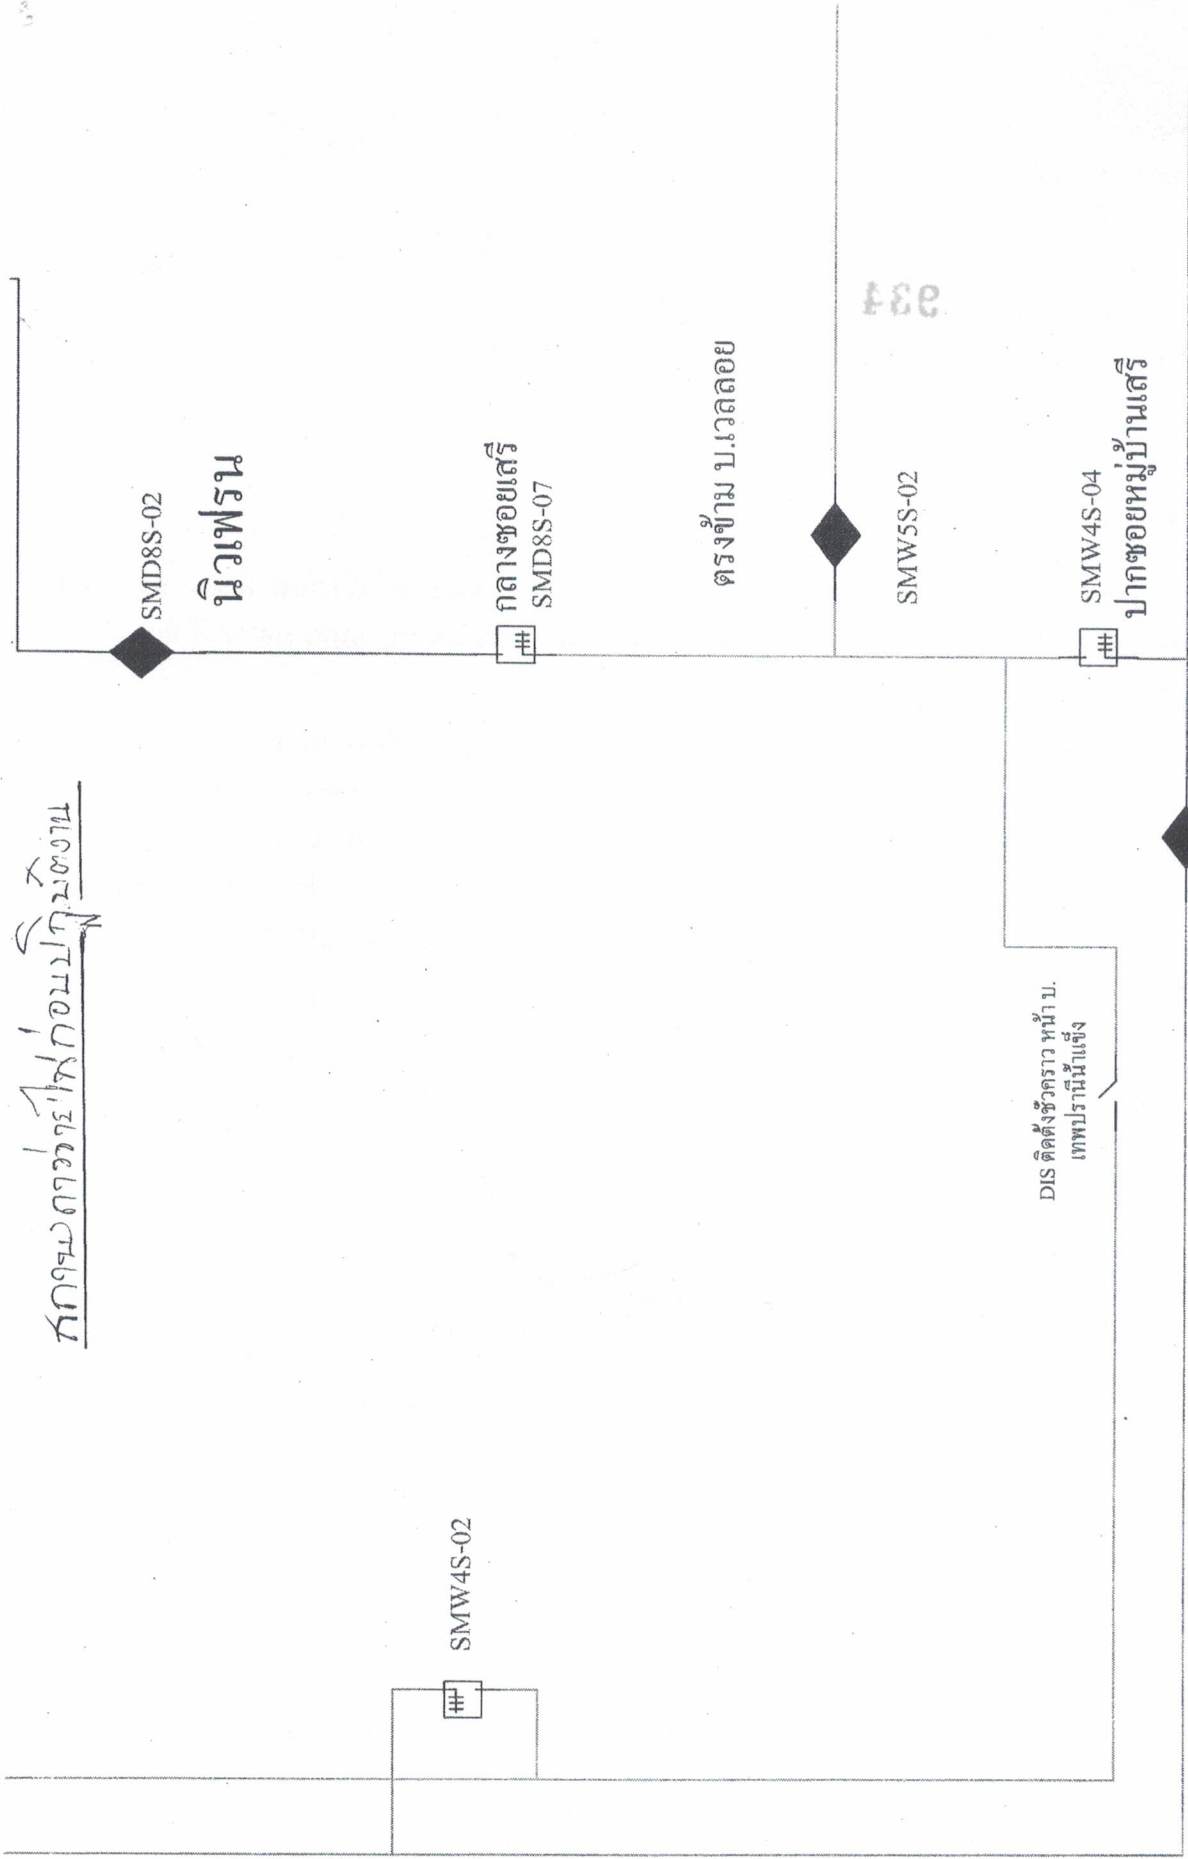
ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการสวิตชิง						
2	ย้ายโหลด SMW05 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก SMW04						
3	SMW04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMW		โหลด = 4.3 MW
4	SMW05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMW		โหลด = 2.3 MW
5	SMW04S-04	ปลด	สับ		สค.	SCADA	SF6 ปากซอยหมู่บ้านเสรี
6	DIS ชค. SMW05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สค.		DIS หน้า บ.เทพปราณีนน้ำแข็ง
7	SMW05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SMW		
8	เมื่อถึงเวลา 08.00 หน่วยงานพร้อมดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน						
9	แจ้ง Hotline กระเช้าทำการปลดสายแรงสูง บริเวณปากซอยเสรีได้ (ตามผังแนบ) ไม่มีโหลดผู้ใช้ไฟ						
10	เมื่อ Hotline กระเช้าทำการปลดสายแรงสูง บริเวณปากซอยเสรี (ตามผังแนบ) แล้วเสร็จ						
11	แจ้งพื้นที่ไฟดับแก่ชุดปฏิบัติงาน						
12	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ TEST ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
13	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ TEST ไฟพร้อม Short ground จุด G2 <i>น.สงวน We safe ได้รีบรอดก่อนปฏิบัติงาน</i>						
14	SMW04VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SMW		
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
15	เมื่อหน่วยงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมยืนยันจ่ายไฟได้						
16	SMW04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMW		
17	SMW05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMW		
18	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1						
19	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2						
20	แจ้ง Hotline กระเช้าทำการจัมสายแรงสูง บริเวณปากซอยเสรีได้ (ตามผังแนบ) ไม่มีโหลดผู้ใช้ไฟ						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
21	เมื่อ Hotline กระเช้าทำการจัมสายแรงสูง บริเวณปากซอยเสรี (ตามผังแนบ) แล้วเสร็จ						
22	DIS ชค. SMW05	ปลด	สับ		สค.		DIS หน้า บ.เทพปราณีน้ำแข็ง
23	SMW04S-04	สับ	ปลด		สค.	SCADA	SF6 ปากซอยหมู่บ้านเสรี
24	SMW04VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SMW		
25	SMW05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SMW		
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

1310



การวางสายไฟก่อนปลูกฝังงาน



SMW4S-03  
บ.เทพปราณีน้ำแข็ง

432

