



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิญญูขอดับไฟ

Switching Deadline

27 ธ.ค. 67

เลขที่ ก.ต.สค.(ปน) ๗๕๙๑ /๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพิทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายวีโรจน์ เอกอำไพ

วันที่ ๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อ.ก.ปน.(ก๓)
ตำแหน่ง ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผ.จก.กฟส.สค.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.สค. จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน แก๊ส CT แบ่งแดนชำรุด บริเวณ ตรงข้ามวัดบางตะคอย ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SMO๐๒	๒๙ ธ.ค.๖๗	๐๙.๐๐ น.	๑๕.๐๐ น.	แก๊ส CT แบ่งแดนชำรุด บริเวณ ตรงข้ามวัด บางตะคอย (เร่งด่วน)	จุดตัดเบรกโดย วิธีฮอทไลน์ กระเช้า ๒๒ เควี เลยปากซอยย่าน ชื่อ	Dis ชั่วคราว ติดตั้งใหม่ ตรง ข้ามวัดบางตะ คอย	นายจิรวัดน์ บุญพร้อม โทร.๐๘๖๓๘๓๒๐๙๐

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายจิรวัดน์ บุญพร้อม ตำแหน่ง พ.ชง.๖ โทร. ๐๘๖-๓๘๓๒๐๙๐

พื้นที่ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟก.(หากมีโอกาสชำรุด ผ.คส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ 

(นาย วีโรจน์ เอกอำไพ)

ตำแหน่ง ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผ.จก.กฟส.สค.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟิวเตอร์ SM002 จาก DDJ 1 คชป.ภรช.๙๓ ¹¹⁰ ถึง 018 อ.ร.ว.ท.ว.จ.ม.ร.อ.บ.ท.๑๐๖
ในวันที่ 29 ธ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชหมายเลขที่ 1933/67
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟิวเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชหมายเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟิวเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชหมายเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟิวเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชหมายเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟิวเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชหมายเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟิวเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชหมายเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟิวเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชหมายเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟิวเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชหมายเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ขุนทอง ฝ่ายเงิน ประสานงานการขอดับไฟกับ นายสิริวัฒน์ บุญพร้อม

นายสิริวัฒน์ โปธิพันธ์
อดีต.5 แทน ผคฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟล.๙๑ กฟล.บพว.



อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผน
แผนผังแนบ 2 แผน

ผจพ. (สถานี.....)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน บริเวณตรงข้ามวัดบางตะคอก
2. กำหนดวันที่ทำงาน 29 ธ.ค. 67 เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟช.สก. งานที่ทำ แก้ไข CT แบ่งแดนชั่วคราว ตามใบขอปฏิบัติงาน 1933/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายขุนทอง ฝาเงิน วันที่ 24 ธันวาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 24 ธันวาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 24 ธันวาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
 1. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวิรัช, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายโมฆ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SMO-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMO		
3	SMO-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMO		
4	SMO02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMO		
5	SMO07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMO		
6	- ย้ายโหลด SMO02 บางส่วนไปรับไฟจาก SMO07						
7	SMOBVB-01	ปลด	สับ		SMO		ขนานบัส
8	SMB03S-08	ปลด	สับ		บพว.	DIS	ปากทางวังน้ำวน
9	DIS ชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สก.	DIS	ตรงข้ามวัดบางตะคอก
10	SMOBVB-01	สับ	ปลด		SMO		ขนานบัส
11	- เมื่อพร้อมดับไฟ SMO02VB-01 เวลา 09.00 น.						
12	แจ้งกฟช.สก.ทำการตัดเตส SMO02 บริเวณเลยปากซอยย่านชื่อ ออกทั้ง 3 เฟส (ตามผังแนบ)จุดตัดเตส-DIS ไม่มีโหลดผู้ใช้ไฟ						
13	หลังจากกฟช.สก.ทำการตัดเตส SMO02 บริเวณเลยปากซอยย่านชื่อ ออกทั้ง 3 เฟส เสร็จเรียบร้อย						
14	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กฟช.สก.รับทราบ						
15	แจ้งกฟช.สก.ทดสอบไฟดับแล้วทำการช็อดกราวด์ จุด G1						
16	แจ้งกฟช.สก.ทดสอบไฟดับแล้วทำการช็อดกราวด์ จุด G2						
17	แจ้งกฟช.สก.ลง WE SAFE ให้เรียบร้อย						
18	แจ้งกฟช.สก.ปฏิบัติงานได้						
19	SMO-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMO		
20	SMO-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMO		
21	SMO02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMO		
22	SMO07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMO		
%%%%%%%%%% ลีนสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%							
23	หลังจากกฟช.บพว.ปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด						
24	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
25	SMO-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMO		
26	SMO-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMO		
27	SMO02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMO		
28	SMO07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMO		
29	แจ้งกฟช.สก.ทำการปลดช็อดกราวด์ จุด G1 ออก						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
30	แจ้งกฟส.ศค.ทำการปลดช็อคกราวด์ จุด G2 ออก						
31	แจ้งกฟส.ศค.ทำการเชื่อมเตส SMO02 บริเวณเลยปากซอยย่านซื่อ เข้าทั้ง 3 เฟส (ตามผังแนบ)จุดตัดเตส-DIS ไม่มีโหลดผู้ใช้ไฟ						
32	หลังจากกฟส.ศค.ทำการเชื่อมเตส SMO02 บริเวณเลยปากซอยย่านซื่อ เข้าทั้ง 3 เฟส เสร็จเรียบร้อย						
33	- ย้ายโหลด SMO02 บางส่วนกลับจาก SMO07						
34	SMOBVB-01	ปลด	สับ		SMO		ขนานบัส
35	DIS ชั่วคราว	ปลด	สับ		ศค.	DIS	ตรงข้ามวัดบางตะคอย
36	SMB03S-08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บพว.	DIS	ปากทางวังน้ำวน
37	SMOBVB-01	สับ	ปลด		SMO		ขนานบัส
38	SMO-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMO		
39	SMO-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMO		
40	SMO02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMO		
41	SMO07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMO		
%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%							

สถานะการจ่ายไฟก่อนปฏิบัติงาน

วัดบางตะคอก

BNP7S-06

BNP2S-06 วัดบางตะคอก

ระรอม 2

Dis.ชั่วคราวตรงข้ามวัด
บางตะคอก

Dis.ชั่วคราวตรงข้ามวัด
วัดบางตะคอก
ติดตั้ง วันที่ 27 ธ.ค.67

SMI

SMB8S-11

Dis.ชั่วคราวตรงข้ามวัด
บางตะคอก

SMB3S-06

สะพานลอยบางกระเจ้า

SMB08S-12

ชอยย่านชื้อ

SMB3S-04

บางกระเจ้า

บ.สีโปสเตอร์

สถานะการจ่ายไฟตอนปฏิบัติงาน

วัดบางตะคอก

BNP7S-06

วัดบางตะคอก

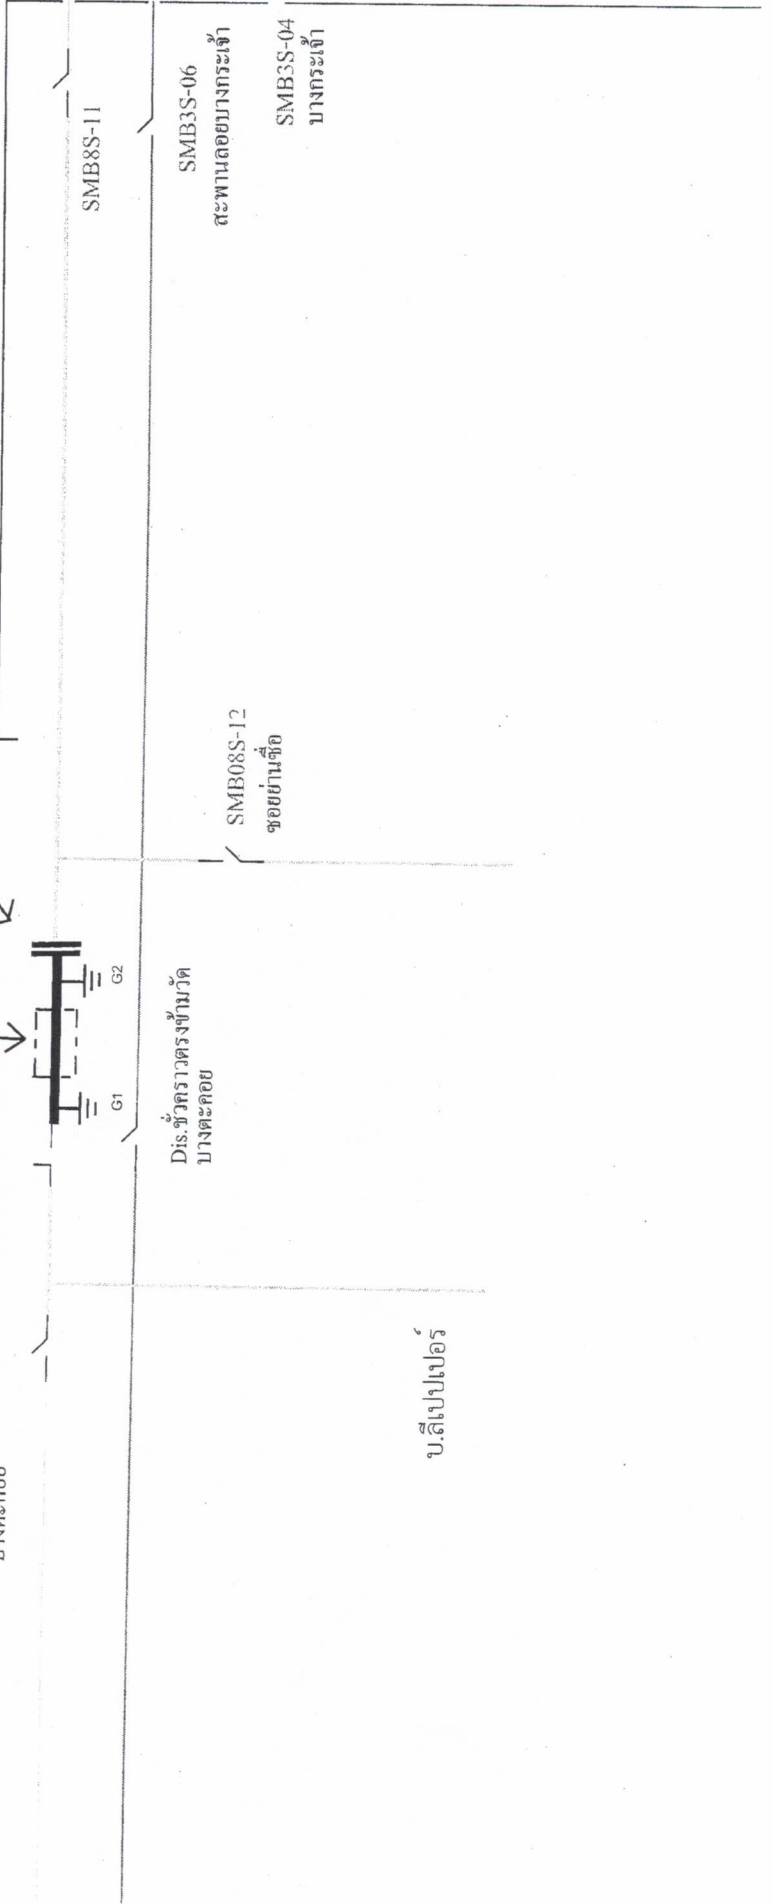
BNP2S-06

พื้นที่ปฏิบัติงาน

Dis.ชั่วคราวตรงข้ามวัด
บางตะคอก

Dis.ชั่วคราวตรงข้ามวัด
บางตะคอก

จุดตัดเบรกโดยวิธีชอทไลน์
กระเซา 22 เควี เลยปากซอยยานซื่อ



ระราม 2

บ.ตีเปเปอร์
