



เลขที่ ก.๓.พท. ๐3๐ /๒๕๖๘
ชื่อผู้รับ นายพิทธรินทร์ พิชิตสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายศักดิ์สิทธิ์ พรายศรี

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๘
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง หล.ก.ป.ร.ษ.ผ.จ.ก.ฟ.ส.พ.น.ท.ท.น.


ด้วยการไฟฟ้า พนมทวน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุม งาน
๑	UTG09	๒๖ ม.ค.๖๘	๐๙.๐๐ น.	๑๒.๐๐ น.	ติดต่อล่อฟ้าแรงสูงแยกไฟสี่	จุดเปิด DDE แยกไฟสี่	จุดเปิด DDE ร.ร.หัวขจรระเจา	นายอนุชา ชำนาญเรือ
๒	UTG05	๒๖ ม.ค.๖๘	๑๓.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ติดต่อล่อฟ้าแรงสูงแยกไฟสี่	จุดเปิด DDE แยกไฟสี่	UTG05R-01	นายอนุชา ชำนาญเรือ

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ๐ ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ ปราโมทย์ ชาญยุทธ ตำแหน่ง พชง.๔ โทร ๐๘๑-๙๔๓๙๙๖๔

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
 ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
 ๓. พิกัดพื้นที่ไฟดับ ๓.๑ จุดเริ่มต้น lat: ๑๔.๓๓๕๘๒๒, long: ๙๙.๗๕๕๖๒
 ๓.๒ จุดสิ้นสุด lat: ๑๔.๓๔๑๔๖๔, long: ๙๙.๗๕๓๙๔๙

ลงชื่อ 
(นายศักดิ์สิทธิ์ พรายศรี)
ตำแหน่ง หล.ก.ป.ร.ษ.ผ.จ.ก.ฟ.ส.พ.น.ท.ท.น.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)


ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเดอร์ UTG 9 จาก DDE แยกไฟสี่ ถึง DDE ร.ร.หัวขจรระเจา
ในวันที่ 26 ม.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 195/68

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พิดเดอร์ UTG 5 จาก DDE แยกไฟสี่ ถึง UTG 5R-01
ในวันที่ 26 ม.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่


พนักงานศูนย์ฯ นาย พิทธรินทร์ พิชิตสุวรรณชล ประสานงานการขอตัดไฟกับ ผช. ปราโมทย์ ชาญยุทธ


(นายศักดิ์สิทธิ์ พรายศรี)
พ.ท. 7 ปฏิบัติงาน หล.ก.ป.บ.


สำหรับผู้อนุมัติ
ที่ ก.๓ ก.ป.บ.(ค.ฟ.)
เรียน ผ.จ. ก.ส.ค. ก.ค. , ก.พ.ค.ค.
อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จ.ป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 3 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น
ผ.จ. (สถานี)


(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)


ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	แยกไผ่สี					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	26 ม.ค. 68	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	26 ม.ค. 68	12.00น.
	26 ม.ค. 68	ระหว่าง	13.00 น.	ถึง	26 ม.ค. 68	16.30น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.พทน.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย		ตามใบขอปฏิบัติงาน 195/2567	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพนิต ราชภรณ์นิม				วันที่	25 มกราคม 2568
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย	 นายพนิต ราชภรณ์นิม				วันที่	25 มกราคม 2568
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	25 มกราคม 2568
7. สั่งทำสวิตชิงโดย					1. นายจิรวัดมน, นายวัฒนนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมโนช 3. นายนครินทร์, นายพีรภัทร์, นายขุนทอง, นายพนิต	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		-
3	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		-
4	UTG09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		-
5	UTG05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทกจ.		R.สละลงเรือ
6	ย้ายโหลด UTG09 บางส่วนไปจ่ายจาก UTG05						
7	UTG05S-13	ปลด	สับ		ลช.		SF6 หน้าร้านจรงเรือวัสดุก่อสร้าง
8	UTG09S-04	สับ	ปลด, ล็อกคาน		ทกจ.		SF6 แยกไผ่สีเลาขวัญ
9	แจ้งชุดฮอทไลน์ตัดDDE บริเวณ รร.ห้วยกระเจา (ตามผังแนบ UTG09)						
10	เมื่อชุดฮอทไลน์ตัดDDE บริเวณ รร.ห้วยกระเจา (ตามผังแนบ UTG09) แล้วเสร็จ						
11	แจ้งชุดฮอทไลน์ตัดDDE บริเวณแยกไผ่สี (ตามผังแนบ UTG09)						
12	เมื่อชุดฮอทไลน์ตัดDDE บริเวณแยกไผ่สี (ตามผังแนบ UTG09) แล้วเสร็จ						
13	แจ้ง กฟส.พทน. ตรวจสอบ SF6 UTG05S-08 ดึงข้ามถนนแยกไผ่สี อยู่สถานะ OFF พร้อมล็อกคาน						
14	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานทราบ						
15	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
16	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
17	เมื่อชุดปฏิบัติงาน Test ไฟ และ Short Ground พร้อมลงใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
18	แจ้งชุดปฏิบัติงานปฏิบัติงานได้						
19	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		-
20	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		-
21	UTG09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		-
22	UTG05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทกจ.		R.สละลงเรือ
สิ้นสุด Switching ช่วงที่ 1							
23	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานไลน์UTG09แล้วเสร็จ พร้อมทำงานไลน์UTG05 ต่อ						
24	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		-
25	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		-
26	UTG05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		-
27	UTG09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		-
28	UTG05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทกจ.		R.สละลงเรือ
29	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
30	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2						
31	ยืนยันการลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
32	แจ้งชุดขอทไลน์เชื่อมDDE บริเวณแยกไฟสี่ (ตามผังแนบ UTG09)						
33	เมื่อชุดขอทไลน์เชื่อมDDE บริเวณแยกไฟสี่ (ตามผังแนบ UTG09) แล้วเสร็จ						
34	แจ้งชุดขอทไลน์เชื่อมDDE บริเวณ รร.ห้วยกระเจา (ตามผังแนบ UTG09)						
35	เมื่อชุดขอทไลน์เชื่อมDDE บริเวณ รร.ห้วยกระเจา (ตามผังแนบ UTG09) แล้วเสร็จ						
36	ย้ายโหลด UTG05 บางส่วนไปจ่ายจาก UTG09						
37	UTG09S-04	ปลด	สับ		ทกจ.		SF6 แยกไฟสี่เลาขวัญ
38	UTG05R-01	สับ	ปลด		ทกจ.		R R.สละลงเรือ
39	Sw.ใบมีด ด้านSource	สับ	ปลด		ทกจ.		R R.สละลงเรือ
40	Sw.ใบมีด ด้านLoad	สับ	ปลด		ทกจ.		R R.สละลงเรือ
41	UTG05S-05	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		ทกจ.		SF6 แยกไฟสี่เลาขวัญ
42	แจ้งชุดขอทไลน์ตัดDDE บริเวณแยกไฟสี่ (ตามผังแนบ UTG05)						
43	เมื่อชุดขอทไลน์ตัดDDE บริเวณแยกไฟสี่ (ตามผังแนบ UTG05) แล้วเสร็จ						
44	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานทราบ						
45	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
46	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
47	เมื่อชุดปฏิบัติงาน Test ไฟ และ Short Ground พร้อมลงใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
48	แจ้งชุดปฏิบัติงานปฏิบัติงานได้						
49	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		- -
50	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		- -
51	UTG05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		- -
52	UTG09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		- -
สิ้นสุด Switching ช่วงที่2							
53	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานแล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหลดกลับ						
54	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		- -
55	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		- -
56	UTG05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		- -
57	UTG09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		- -
58	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1						
59	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2						
60	ยืนยันการลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
61	แจ้งชุดขอทไลน์เชื่อมDDE บริเวณแยกไฟสี่ (ตามผังแนบ UTG05)						
62	เมื่อชุดขอทไลน์เชื่อมDDE บริเวณแยกไฟสี่ (ตามผังแนบ UTG05) แล้วเสร็จ						
63	UTG05S-05	ปลด	สับ		ทกจ.		SF6 แยกไฟสี่เลาขวัญ
64	Sw.ใบมีด ด้านSource	ปลด	สับ		ทกจ.		R R.สละลงเรือ
65	Sw.ใบมีด ด้านLoad	ปลด	สับ		ทกจ.		R R.สละลงเรือ
66	ย้ายโหลด UTG05 กลับจาก UTG09						
67	UTG05R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		ทกจ.		R R.สละลงเรือ
68	UTG05S-13	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		ลข.		SF6 หน้าร้านจรงรุ่งเรืองวัสดุก่อสร้าง
69	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		- -


UT609 UT605

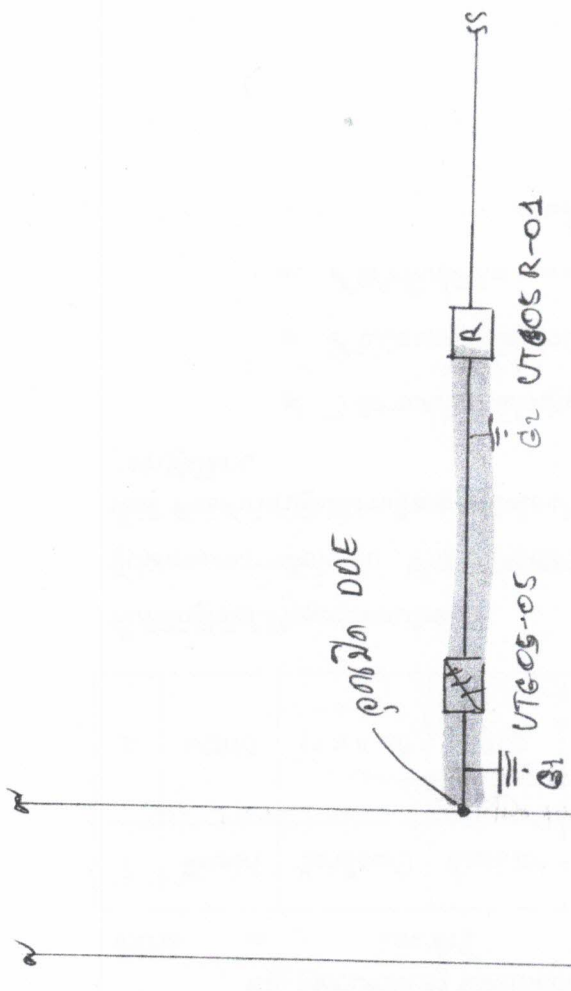

ပုံစံသော DDE

ပုံစံသော DDE ပုံစံသော

ပုံစံသော DDE ပုံစံသော ပုံစံသော (Hotline).



UT609 UT605
