



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กฟผ.บม.ง.เป.บ.ทอ.๒๖๕/๒๕๖๕

ชื่อผู้รับ นายพัทพันธ์ พิชิตสุวรรณมงคล

ชื่อผู้ส่ง นายพัฒนา หงษ์อินทร์

วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ร.จก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บ.บ.ง.

ที่	พิด เคอร์	วัน/ เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	TMV 1	16 ธค. 2565	10.00 น	12.00 น.	เปลี่ยน Dis ชั่วคราว เป็น SF.6 ช่างวัด สัมมาราม	Dis. ช่างวัด บึงวัดรั้วมหาราช	-	นายวิทยา เรือนสา

ด้วยการไฟฟ้า อ.บ้านโป่ง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย สถานีไฟฟ้า ท่วมวง ๒ ชั่วคราว
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

-ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวิทยา เรือนสา ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.บ.ง. โทร. ๐๙๖-๙๑๖๒๕๑๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายพัฒนา หงษ์อินทร์)

ร.จก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บ.บ.ง.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) ร.พ.ก.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟิวเตอร์ TMV1 จาก Dis ๓๓, บึงวิทย์พหลฯ ถึง -
ในวันที่ 16 ธ.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 1990/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟิวเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อ.ร. โฆฬพันธ์ ประสานงานการขอดับไฟกับ ช่างวิชา เรือนลำ
13 ธ.ค. 65

สภท. ธนฉัตรกิจ
ท.สภท. ธนฉัตรกิจ
ว.ก. ๗ ปฏิบัติงานแทนผคฟ.

ขั้นตอนการสวิชชิ่ง 2 แผ่น
แผ่นฝั่งแนบ 1 แผ่น

ผจพ. (สถานี) -
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. ก.พอ. ม.ป., ก.พร. ๒๒๓.
อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)



อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)


ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณข้างวัดสัมมาราม		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	16 ธ.ค. 65	ระหว่าง 10.00 น.	ถึง 12.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.บปง.	งานที่ทำ เปลี่ยน DIS ชั่วคราวเป็น SF6	ตามใบขอปฏิบัติงาน 1990/2565
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอมร โมกขพันธ์		วันที่ 14 ธันวาคม 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 14 ธันวาคม 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 14 ธันวาคม 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายสถาพร, นายพิชชา, นายสุธี, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนซ์ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์และสวิตช์ตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	TMV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMV		- -
3	TMV01R-01	Normal	Non-Reclosing		นปม.		R AVR. เขาคันทอก
4	NOM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NOM		- -
5	NOM02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NOM		- โหลด 3.01 MW
6	NOM03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NOM		- โหลด 2.26 MW
7	ย้ายโหลด TMV01 บางส่วน ฝาก NOM02						
8	NOM03S-03	ปลด, ล็อคคาน	สับ		นปม.		SF6 ข้างวัดสัมมาราม
9	DIS Loop Line	ปลด	สับ		นปม.		DIS หน้า บ.จัสเทล เนท์เวิร์ค
10	DIS ชั่วคราว	สับ	ปลด (ใช้โหลดบัสเตอร์)		นปม.		DIS ข้างวัดสัมมาราม
11	NOM03S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นปม.		SF6 ข้างวัดสัมมาราม
12	แจ้ง กฟอ.บปง. ทำการทดสอบก่อนปฏิบัติงาน พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย						
13	แจ้งชุด กฟอ.บปง. ปฏิบัติงานได้ (รื้อถอน DIS ชั่วคราว ข้างวัดสัมมาราม)						
14	*ตั้ง Manual NOM02 และ Non-Reclosing TMA01R-01 (R.เขาคันทอก) ไว้ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน						
15	TMV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMV		- -
16	NOM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NOM		- -
17	NOM03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NOM		- -
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
18	เมื่อ กฟอ.บปง. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ (เปลี่ยน DIS ชั่วคราวเป็น SF6 ข้างวัดสัมมาราม)						
19	TMV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMV		- -
20	NOM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NOM		- -
21	NOM03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NOM		- -
22	แจ้ง กฟอ.บปง. ตรวจสอบสถานะ SF6 ติดตั้งใหม่ บริเวณข้างวัดสัมมาราม อยู่สถานะ "ปลด"						
23	ย้ายโหลด TMV01 บางส่วน คืนจาก NOM02						
24	NOM03S-03	ปลด, ล็อคคาน	สับ		นปม.		SF6 ข้างวัดสัมมาราม
25	SF6. ติดตั้งใหม่	ปลด	สับ		นปม.		SF6 ข้างวัดสัมมาราม
26	DIS Loop Line	สับ	ปลด (ใช้โหลดบัสเตอร์)		นปม.		DIS หน้า บ.จัสเทล เนท์เวิร์ค
27	NOM03S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นปม.		SF6 ข้างวัดสัมมาราม
28	TMV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMV		- -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	TMV01R-01	Non-Reclosing	Normal		นปม.		R AVR. เขาคันทอก
30	NOM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NOM		- -
31	NOM02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NOM		- -
32	NOM03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NOM		- -
สิ้นสุด Switching							

แผนผัง Singleline Diagram แสดงพื้นที่ดับกระแสไฟและจุดช็อตกราวด์

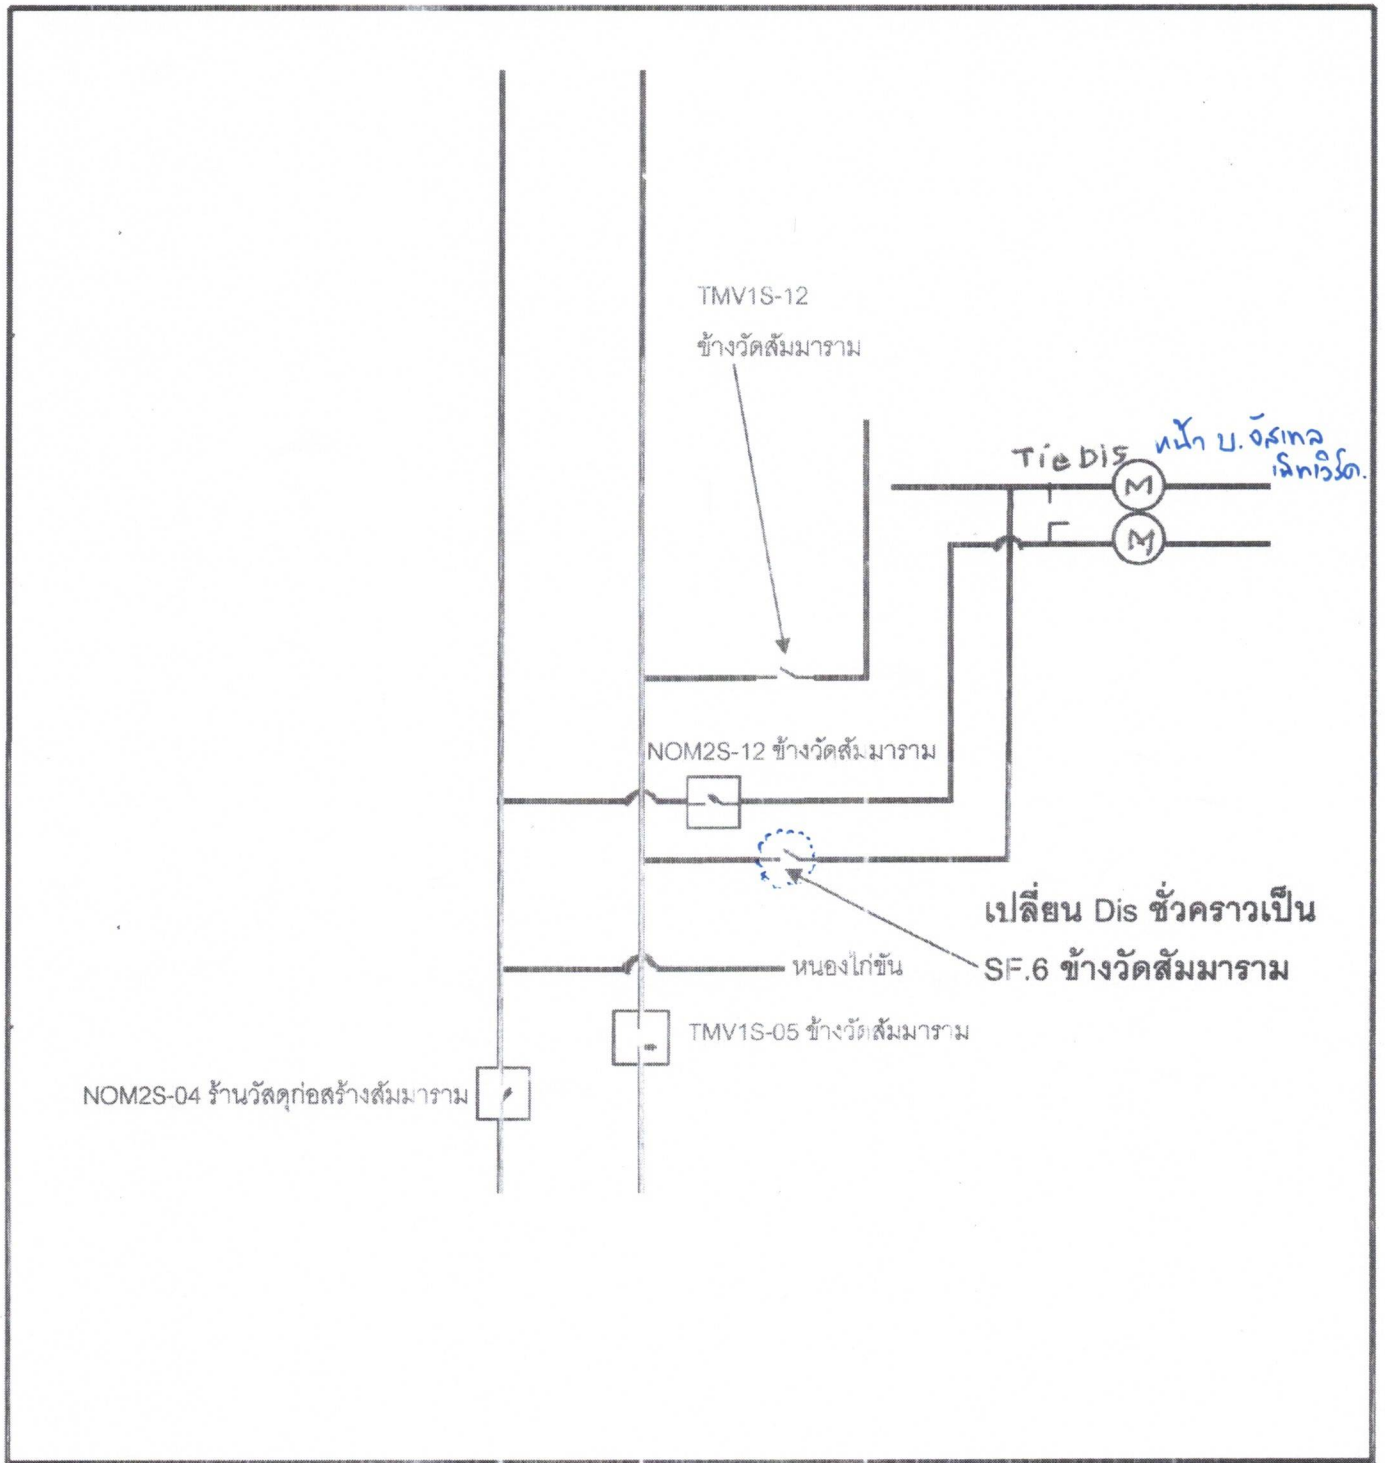

หมายเหตุ

--- เส้นแสดงพื้นที่ดับกระแสไฟเพื่อปฏิบัติงาน

⊥ ตำแหน่งจุด Short Ground

|| จุดตัดเดท

ผู้ควบคุมงาน นายวิฑฒ... เหวินสว
 ผู้ Short Ground นายวิรัชพงษ์ สวัสดิ์คณา
 จป. นายพลกิจ จงวัชรสถิตย์
