



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กทบ.(ปบ.)- ๒๗/๑ ๗/ ๒๕๖๕

ชื่อผู้รับ นายสมบูรณ์ สิงห์โตทอง

ชื่อผู้ส่ง นายอรุณ จรตล

วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.กทบ.

ด้วยการไฟฟ้า กฟอ.กทบ. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ผกส.กทบ. พาดสายแรงสูงวงจรใหม่ทีตเตอร์ ๙ ตามแผนผังสังเขปแนบ
จำนวน = ๒ = แผ่น ดังนี้

ที่	ทีตเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	KTD ๐๔	๒๖ ธ.ค. ๖๕	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	เพื่อให้ ผกส.กทบ. ปฏิบัติงาน พาดสายแรงสูงวงจรใหม่ทีตเตอร์ ๙ สถานี กทบ.๔ บริเวณหน้าสถานี กทบ.๔	CB ๐๔ KTD ๐๔ VB-๐๑ สถานี กทบ.๔	DIS KTD ๐๒S-๐๒ และถึงจุดปลด DDE ปากทางไปวัด นางสาว	นายเดิศักดิ์ วิริยพรสวัสดิ์ พง.๗ ผกส.กฟอ.กทบ. โทร.๐๘๖-๓๕๓๖๑๔๑

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบจากการตัดไฟปฏิบัติงาน

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายณเดศวร์ พรหมสรินทร์ ตำแหน่ง พง.๖ ผปบ.กฟอ.กทบ. โทร ๐๘๐-๒๕๔๐๘๗๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายอรุณ จรตล)

ตำแหน่ง รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.กทบ.

๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ 1 ทีตเตอร์ 4 จาก KTD04VB-01 ถึง KTD029-02

ในวันที่ 26 ธ.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข 2034/65

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ 0 ทีตเตอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข

พนักงานศูนย์ นาย วิวัฒน์ เสาวมิ่ง ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายสมชาย มาพันธ์

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ. กทบ.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รจก.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายวิวัฒน์ เสาวมิ่ง)

จุดก.4 11ก6 ผคฟ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ 2 แผ่น

แผนผังแนบ 2 แผ่น

ผจก. 2 (สถานี) KTD.


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รจก.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง


1. สถานที่ทำงาน	บริเวณหน้าสถานี KTD ท้ายซอยวิกรมราษฎร์					
2. กำหนดวันทำงาน	26 ธ.ค. 65	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	17.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.กทบ.	งานที่ทำ	พาดสายแรงสูงวงจรใหม่ พีดเตอร์ 9		ตามใบขอปฏิบัติงาน	2034/65
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวีรวัชร เสมามิ่ง			วันที่	21 ธันวาคม 2565	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	21 ธันวาคม 2565	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	21 ธันวาคม 2565	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนโษ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร, นายพิชชา, นายสุธี, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	KTD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTD		Load = 14.24 MW
3	SAA-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		Load = - 5.07 MW
4	KTD04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTD		Load = 0.92 MW
5	SAA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAA		Load = 3.02 MW
6	ย้ายโหลด KTD04 ไปรับไฟจาก SAA06						
7	KTD04S-05	ปลด, ล็อคคาน	ล๊ပ်		กทบ.		SF6 เซเวนปากซอยวิกรมราษฎร์
8	KTD04VB-01	ล๊ပ်	ปลด		กทบ.	SCADA	CB
9	KTD04S-01	ล๊ပ်	ปลด		กทบ.		DIS POT HEAD F.4
10	KTD09S-01	ล๊ပ်	ปลด		กทบ.		DIS POT HEAD F.9
11	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.30 น						
12	แจ้งชุด HOT LINE ตัด DDE บริเวณปากทางไปวัดนางสาว						
13	เมื่อชุด HOT LINE ทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
14	KTD04VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		KTD		
15	KTD09VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		KTD		
16	KTD04VG-01	ปลด	ล๊ပ်		KTD		Ground F4
17	KTD09VG-01	ปลด	ล๊ပ်		KTD		Ground F9
18	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ ชุด ปฏิบัติงานรับทราบ						
19	แจ้ง กฟอ.กทบ. ให้ทำการ Test ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อย ให้ทำการ Short Ground ที่จุด G1						
20	แจ้ง กฟอ.กทบ. ให้ทำการ Test ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อย ให้ทำการ Short Ground ที่จุด G2						
21	แจ้ง กฟอ.กทบ. ให้ทำการ Test ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อย ให้ทำการ Short Ground ที่จุด G3						
22	แจ้ง กฟอ.กทบ. ให้ทำการ Test ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อย ให้ทำการ Short Ground ที่จุด G4						
23	แจ้ง กฟอ.กทบ. ลง We Safe ก่อนปฏิบัติงาน						
24	KTD-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTD		
25	SAA-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
26	SAA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAA		
	%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า %%%%%%%%%%						
26	เมื่อชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
27	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	แจ้ง กฟอ.กทบ. ให้ทำการ ปลด Short Ground ที่จุด G1						
29	แจ้ง กฟอ.กทบ. ให้ทำการ ปลด Short Ground ที่จุด G2						
30	แจ้ง กฟอ.กทบ. ให้ทำการ ปลด Short Ground ที่จุด G3						
31	แจ้ง กฟอ.กทบ. ให้ทำการ ปลด Short Ground ที่จุด G4						
32	KTD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTD		
33	SAA-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
34	SAA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAA	CB	
35	KTD04VG-01	สับ	ปลด		KTD		Ground F4
36	KTD09VG-01	สับ	ปลด		KTD		Ground F9
37	KTD04VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		KTD		
38	KTD09VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		KTD		
39	แจ้งชุด HOT LINE เชื่อมสาย DDE บริเวณปากทางไปวัดนางสาว						
40	เมื่อชุด HOT LINE ทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
41	KTD04S-01	ปลด	สับ		กทบ.	DIS	POT HEAD F.4
42	KTD09S-01	ปลด	สับ		กทบ.	DIS	POT HEAD F.9
43	ย้ายโหลด KTD04 กลับจากไฟจาก SAA06						
44	KTD04VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KTD	SCADA	CB
45	KTD04S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กทบ.	SF6	เซเว่นปากซอยวิรุฬราชบุรี
46	KTD-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTD		
47	SAA-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
48	SAA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAA	CB	
49	KTD04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTD	SCADA	CB
	%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching ทั้งหมด %%%%%%%%%%						

แผนผัง ก่อนดับไฟ บริเวณหน้าสถานีกระทุ้มแบบน ๔ ท้ายซอยวิรุณราษฎร์
 เพื่อให้ ผกส. และ ผบ.กทบ. พาดสายแรงสูงรองรับการจ่ายไฟ Riser Pole KTD 09 ถึงชนแดน กทอ.สามพราน
 (ตามอนุมัติที่ ก.๓ กวว.(วร).- ๑๐๐๕ ลงวันที่ ๕ พ.ค. ๒๕๖๔) WBS.P-TDD02-3-I-KTNN.A.0010
 ขอดับไฟวันจันทร์ ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๗.๐๐ น.

หมายเหตุ
 ไม่สามารถใช้ได้รับผลกระทบจากการดับไฟปฏิบัติงาน

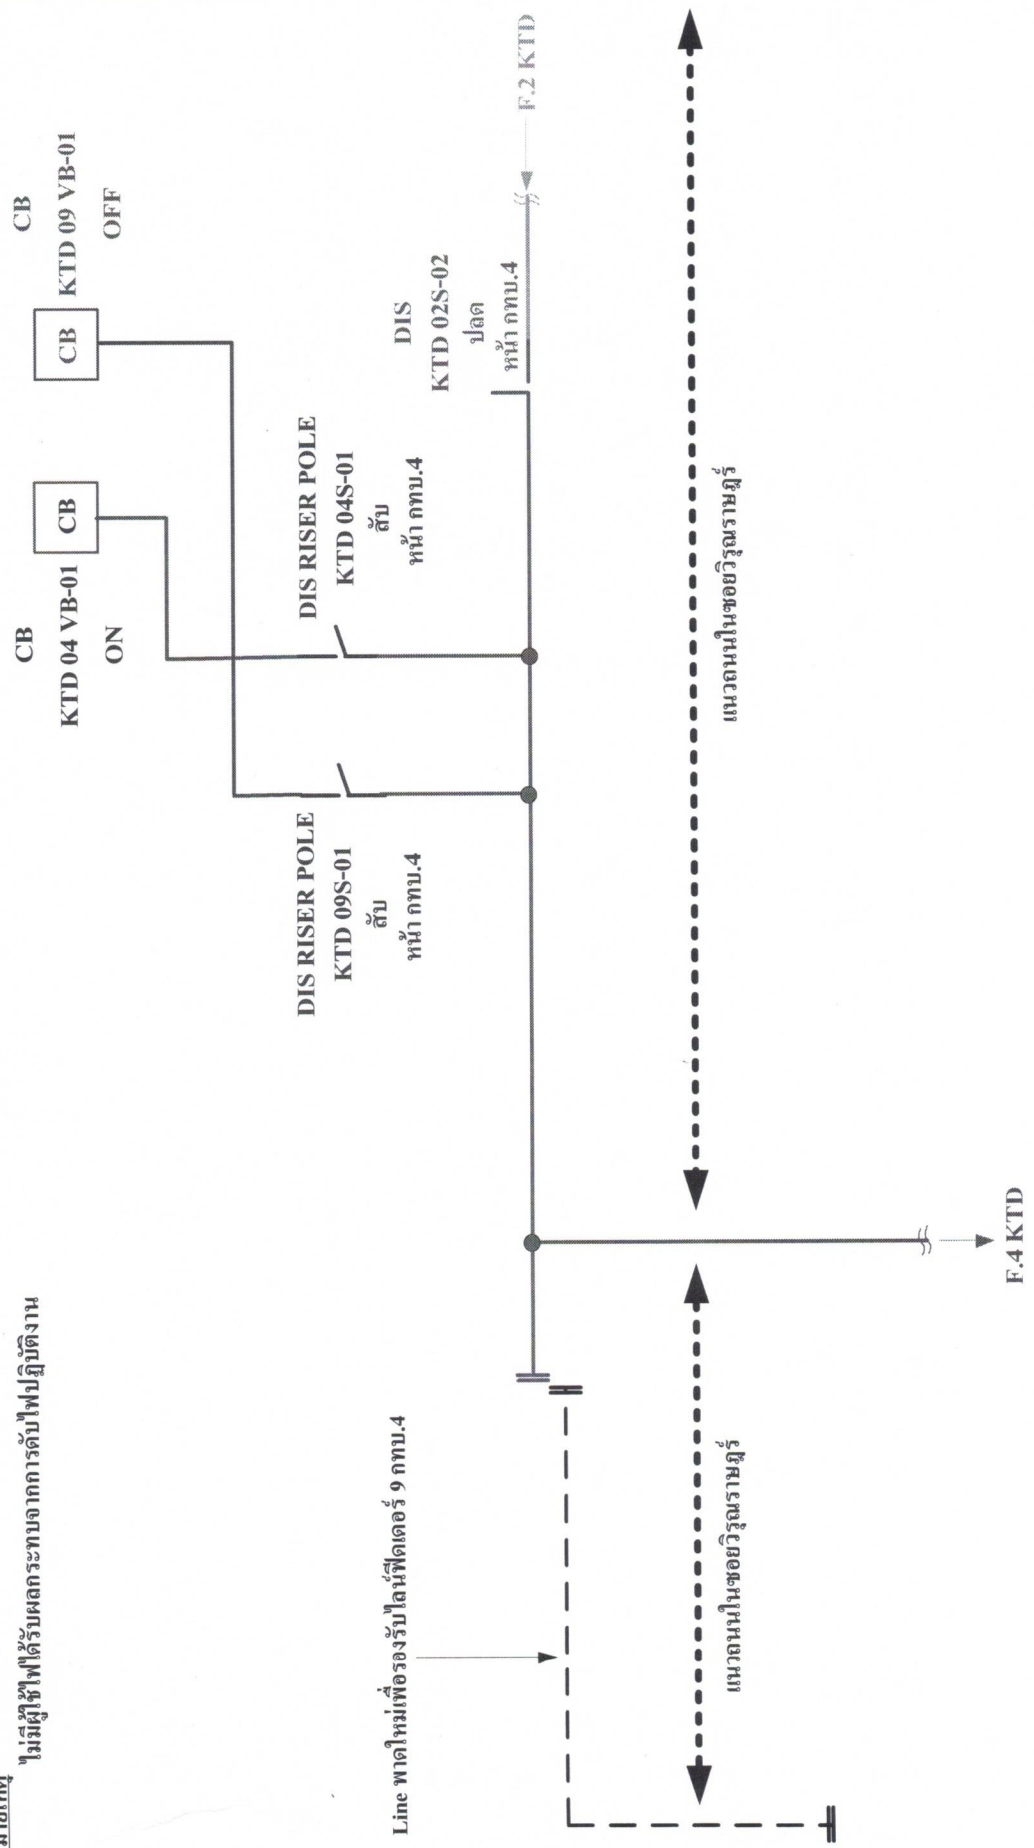

Line พาดใหม่เพื่อรองรับไลน์ฟีดเตอร์ 9 กทบ.4


แนวถนนในซอยวิรุณราษฎร์

F.4 KTD

F.2 KTD

แผนผัง หลังดับไฟ บริเวณหน้าสถานีกระตุ้มแบบ ๔ ท้ายชอຍวิรุณราษฎร์
 เพื่อให้ ผกส. และ ผบ.กทบ. พาดสายแรงสูงรองรับการจ่ายไฟ Riser Pole KTD 09 ถึงชนแดน กทอ.สามพราน
 (ตามอนุมัติที่ ก.๓ กวว.(วร).- ๑๐๐๕ ลงวันที่ ๕ พ.ค. ๒๕๖๔) WBS.P-TDD02-3-I-KTNN.A.0010

ขอตัดไฟวันจันทร์ ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๗.๐๐ น.

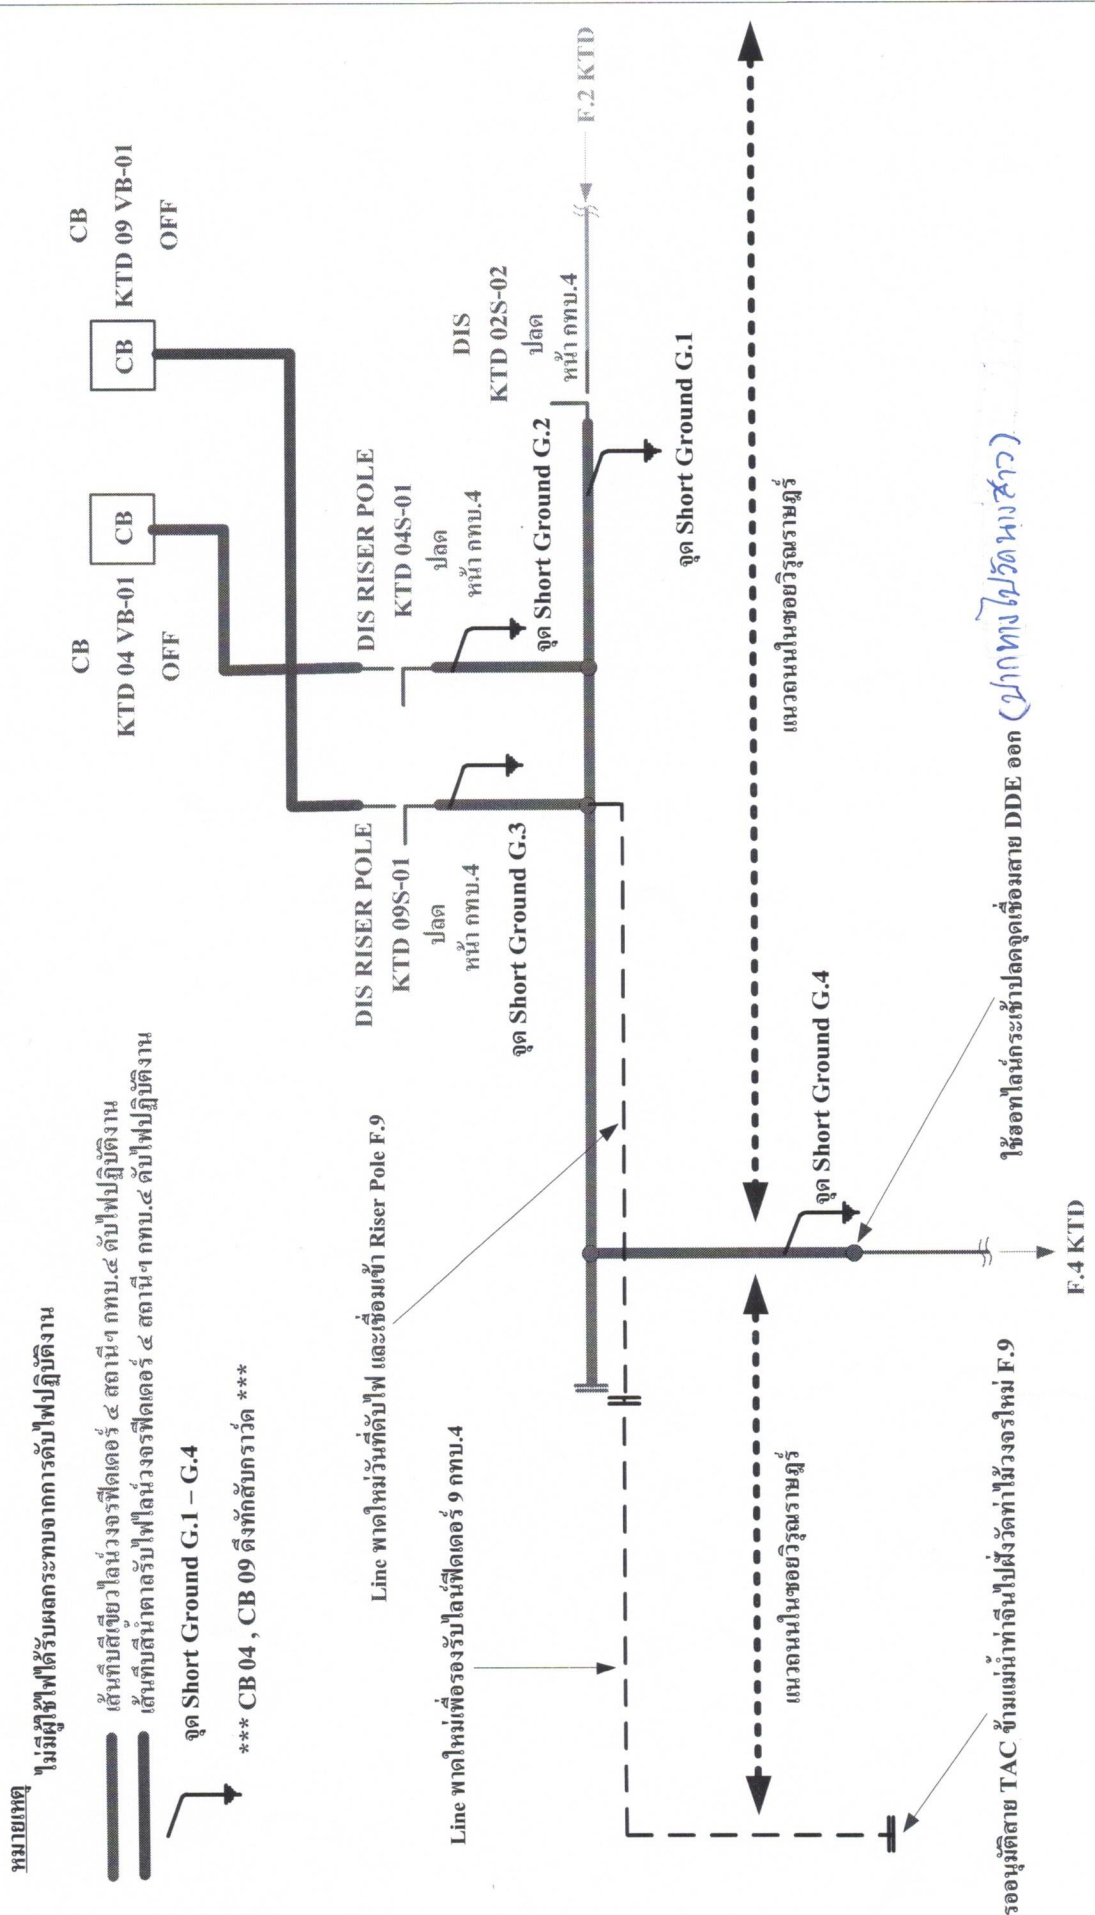

หมายเหตุ

- ไม่มีผู้ให้ได้รับผลกระทบจากการดับไฟปฏิบัติงาน
- เส้นทึบสีเขียว ไลน์วงจรีฟีดเตอร์ ๔ สถานี กทบ.๔ ดับไฟปฏิบัติงาน
- เส้นทึบสีแดง ไลน์วงจรีฟีดเตอร์ ๔ สถานี กทบ.๔ ดับไฟปฏิบัติงาน

จุด Short Ground G.1 - G.4

*** CB 04 , CB 09 ดึงกลับกราวด์ ***

Line พาดใหม่วันที่ดับไฟ และเชื่อมเข้า Riser Pole F.9

Line พาดใหม่เพื่อรองรับไลน์ฟีดเตอร์ 9 กทบ.4

แนวถนนในชอຍวิรุณราษฎร์

รออนุมัติสาย TAC ข้ามแม่น้ำทำเงินไปฝั่งวัดทำไม้วงจรีใหม่ F.9

ใช้ชอทไลน์กระเช้าปลดจุดเชื่อมสาย DDE ออก (ปากทางไปวัดหนองขาว)
