



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓...../๒๕๖๖ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๗
 ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พธิราสุวรรณชล ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
 ชื่อผู้ส่ง นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอักษรเขตฯ ตำแหน่ง รจก.(ท.) กฟจ.สท.

ด้วยการไฟฟ้าสุพรรณบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อรื้อถอน ปีกเสาและพาดสายแรงสูง สถานีสุพรรณบุรี๒ บริเวณบ่อปลาศิริเพ็ญ-แพล้นปูนมันคงติ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	๑๐ สท.๒	๑๗/๐๒/๖๗	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	รื้อถอนปีกเสา และพาดสาย เส้นเลี้ยงเมือง	SPB๑๐S-๐๒	DDEแพล้น ปูนมันคงติ	โทร.๐๙๘- ๒๗๕๓๖๕๐

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธนากร สุวรรณประทีป ตำแหน่ง พทง.๖ (สข.) โทร. ๐๘๑-๔๓๒๐๒๖๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
 ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอักษรเขตฯ.....)

ตำแหน่ง..... รจก.(ท.) กฟจ.สท.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
 เรียงน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเดอร์ SPB10 จาก SPB10S-02 ถึง DDE แพล้นปูนมันคงติ
 ในวันที่ 17 ก.พ. 67 ตั้งแต่เวลา 08-00 น. ถึง 17-00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 207/2567
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พิดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
 ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
 พนักงานศูนย์ฯ นาย อมร ไชยภักดิ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย ธนากร สุวรรณประทีป
 10 ก.พ. 67

(นาย.....
 ผค.๖ ปฏิบัติการ ผค.๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจพ. - (สถานี) -

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียง ผจก. กฟจ.สท.

อก.บข.(ก.๓),

อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
 พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครป
 ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณถนนเส้นเสี้ยวเมือง		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	17 ก.พ. 67	ระหว่าง 08.00 น.	ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ.สพ.	งานที่ทำ	ปักเสา, พาดสาย
4. เตรียมการสวิตชิงโดย			ตามใบขอปฏิบัติงาน 207/2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย	นายอมร โมกขพันธ์		วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย			วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567
	1. นายอมรพันธ์,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
	2. นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีร์วัชร,นายอมร		(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
	3. นายพีรภัทร,นางสาวสุภัชชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต		(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์และสวิตซ์ตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SPB10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPB		-
3	DOA09R-02	Normal	Non-Reclosing, ALT		สพ.		R วัดพันต่าสิ่ง
4	ย้ายโหลด SPB10 บางส่วนไปรับไฟจาก SPB04						
5	DOA09S-09	ปลด	สับ		สพ.		DIS ลานตากข้าวสามเหลี่ยม
6	SPB10S-02	สับ	ปลด (ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS บ่อปลาสิริเพ็ญ
7	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน เวลา 08.00 น.						
8	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการไลน์โหลดหม้อแปลงในระบบออกทั้ง 3 เฟส						
9	แจ้งชุดฮอทไลน์ สพ. ทำการตัด DDE บริเวณแพลันปูนต้นคองติ ออกทั้ง 3 เฟส						
10	หลังจากชุดฮอทไลน์ สพ. ดำเนินการแล้วเสร็จ						
11	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการเทสไฟ, ข้อตรวจวัดจุด G1						
12	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการเทสไฟ, ข้อตรวจวัดจุด G2						
13	หลังจากดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย						
14	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ผู้ควบคุมงานรับทราบและปฏิบัติงานได้						
15	SPB10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPB		-
16	DOA09R-02	Non-Reclosing, ALT	Normal		สพ.		R วัดพันต่าสิ่ง
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
17	เมื่อผู้ควบคุมงาน ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
18	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการปลดข้อตรวจวัดจุด G1						
19	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการปลดข้อตรวจวัดจุด G2						
20	หลังจากดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย						
21	SPB10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPB		-
22	DOA09R-02	Normal	Non-Reclosing, ALT		สพ.		R วัดพันต่าสิ่ง
23	จ่ายไฟคืนสู่ระบบ						
24	แจ้งชุดฮอทไลน์ สพ. ทำการเชื่อม DDE บริเวณแพลันปูนต้นคองติ เข้าทั้ง 3 เฟส						
25	หลังจากชุดฮอทไลน์ สพ. ดำเนินการแล้วเสร็จ						
26	ย้ายโหลด SPB10 บางส่วนไปรับไฟจาก SPB04						
27	SPB10S-02	ปลด	สับ		สพ.		DIS บ่อปลาสิริเพ็ญ

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	DOA09S-09	สับ	ปลด (ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS ลานตากข้าวสามเหลี่ยม
29	SPB10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPB		- -
30	DOA09R-02	Non-Reclosing, ALT	Normal		สพ.		R วัดพันต่าสิ่ง
สิ้นสุด Switching							



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผ.บ.กฟง.สพ.

เลขที่ ก.๓ สพ.(ปบ.)

เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟง.สพ./รองก.กฟง.สพ.

ถึง ผจก.กฟง.สพ.

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓


ด้วยในวันที่...๑๗...เดือน...กุมภาพันธ์...พ.ศ. ...๒๕๖๓... ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๑.๐๐ น. กฟง.สุพรรณบุรี มีแผนงานดับไฟฟ้าบริเวณ ...บ่อปลาศิริเพ็ญ แพล้นปุมั่นคงดี ...เพื่อ...รื้อถอน,ปักเสาแรงสูงและพาดสายแรงสูง สถานีสุพรรณบุรี๒...โดยมีรายละเอียดฟีดเดอร์ที่ขอปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

ฟีดเดอร์ ...๑๐... สถานี ...สุพรรณบุรี ๒... ตั้งแต่บริเวณ ...บ่อปลาศิริเพ็ญ แพล้นปุมั่นคงดี

กฟง.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้นายปริชา ทองระย้า พง.๖ ผจก.กฟง.สพ. เบอร์โทรศัพท์ ...๐๕๖๓ ๓๖๕๑๑๐๙

เป็นผู้ควบคุมงานและให้...นายวรพล สุทธิไกร ...ตำแหน่ง ผ.ม.กฟง.สพ. เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อ ...๐๕๖๓ ๒๐๕๖๖๕๕ เป็นผู้ประสานงานการดับไฟเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด

แผนผังเชิงเส้น

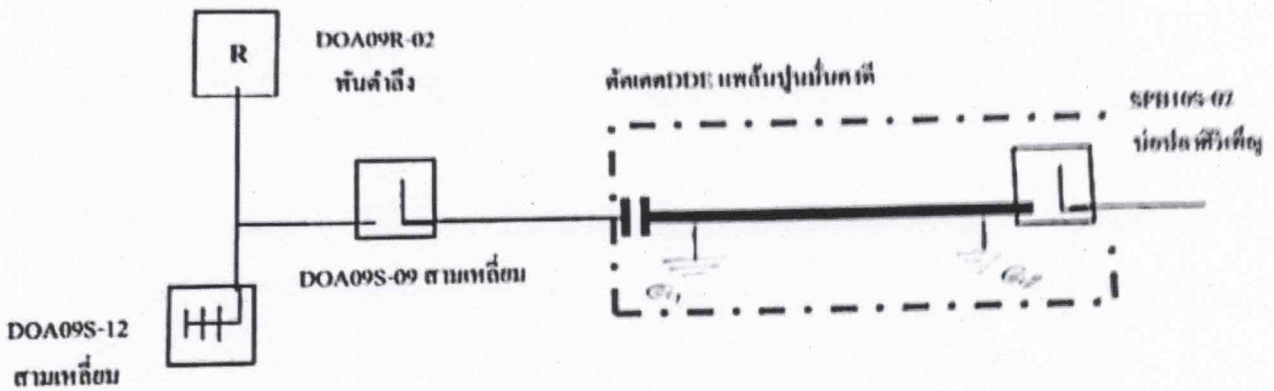

ดับไฟระบบจำหน่าย๒๒ เควี เพื่อปฏิบัติงาน รื้อถอนและปักเสาแรงสูงและพาดสายแรงสูง.

- ๑.ย้ายโหลดพื้นที่จุดปฏิบัติงาน
- ๒.ปลดโหลดพื้นที่ปฏิบัติงาน HotLineสพ. ตัดเขต ๑จุด
- ๓.ตรวจสอบไฟดับ ชุดทีมแก้ไขข้อบกพร่อง ๒ จุด
- ๔.แจ้งชุดก่อสร้างปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย

อนุมัติ

(นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอัคระเดชา)
รองผู้จัดการปฏิบัติงานแทนผู้จัดการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรี

(นายชนากร สุวรรณประทีป)
พง.๖(สข.) ผ.บ.กฟง.สพ.
