



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

5 ม.ค. 67

วิญขอดับไฟ

เลขที่ ก.๓.สพ.ร.(ปบ.) 004644  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณิชล  
ชื่อผู้ส่ง นายวิฑูรท์ ขาดิวัฒนานนท์

วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖  
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอย้ายโหลดตั้ง Manual ดับไฟ เพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ เปลี่ยน Dis(SAU๓S-๐๕) เป็น SF๖ คลองลาด  
ตะเข้ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงาน/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	OYM๐๑	๗ ม.ค.๖๗	๐๙.๐๐	๑๔.๐๐	เปลี่ยน Dis(SAU๓S-๐๕) เป็น SF๖ คลอง ลาดตะเข้			นายนิธินัย ผูกฉิม ๐๘๖-๓๑๗๗๗๖๑

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนิธินัย ผูกฉิม ตำแหน่ง ข.ผ.ปบ โทร ๐๘๖-๓๑๗๗๗๖๑

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ (นายวิฑูรท์ ขาดิวัฒนานนท์)  
ผจก.กฟอ.สามพราน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓  
เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ OYM๐1 จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ๗ ม.ค ๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๔.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 23/67  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ .....  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ .....  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ .....  
พนักงานศูนย์ฯ นาย พชรกวี ภิรมนระวิศักดิ์ ประสานงานการขอดับไฟกับ นาย นิธินัย ผูกฉิม

(นายพชรกวี ภิรมนระวิศักดิ์)  
ว.ค.๔ 1 แทน น.น.ด.พ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)  
เรียน ผจก. กฟอ.สามพราน, กฟภ.๓  
อ.ก.บช.(ก.๓), อ.ก.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น  
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์  
นครปฐม ตั้งแต่เวลา ..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ผคฟ.๐๑-(rev.๐๒/๒๕๖๑)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน
2. กำหนดวันที่ทำงาน
3. ผู้ขอทำงาน
4. เตรียมการสวิตชิงโดย
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย
6. อนุมัติสวิตชิงโดย
7. สั่งทำสวิตชิงโดย

DIS คลองลาดตะเข้ (SAU3S-05)

7 ม.ค. 67	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	14.00 น.
<u>กฟอ.สพร.</u>	งานที่ทำ	รื้อถอน DIS /เปลี่ยน SF6	ตามใบขอปฏิบัติงาน	23/67
	นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์		วันที่	28 ธันวาคม 2566
			วันที่	28 ธันวาคม 2566
			วันที่	28 ธันวาคม 2566


1. นายนครินทร์, นส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
2. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
3. นายพีรภัทร, นส.สุภัสชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง							
1	OYM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYM	-	-
2	OYM01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYM	-	LOAD 5.42 MW
3	ONC-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONC	-	-
4	ONC06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONC	-	LOAD 2.61 MW
5	ONC07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONC	-	-
6	OYL-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYL	-	-
7	OYL06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL	-	LOAD 2.5 MW
8	OYL07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL	-	-
9	ย้ายโหลด OYM01 ทั้งหมดไปรับไฟจาก ONC06						
10	SAU03S-04	ปลด, ล็อกคาน	สับ		สพร.	SF6	คลองลาดตะเข้
11	OYM01VB-01	สับ	ปลด		OYM		-
12	ย้ายโหลด ONC06 บางส่วนไปรับไฟจาก OYL06						
13	ONC03S-05	ปลด, ล็อกคาน	สับ		สพร.	SF6	ตรงข้ามคอนทราย
14	OYL06S-10	ปลด	สับ		สพร.	SCADA SF6	ทางเข้า บ.ไวไว
15	SAU03S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.	DIS	ปากคลองลาดตะเข้
16	ONC03S-05	สับ	ปลด, ล็อกคาน		สพร.	SF6	ตรงข้ามคอนทราย
17	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟอ.สพร.ทราบ						
18	ให้ตั้ง Manual ONC06VB-01 , OYL06VB-01 ไว้ในขณะชุดทำงานปฏิบัติงานอยู่						
19	OYM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYM	-	-
20	ONC-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONC	-	-
21	ONC07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONC	-	-
22	OYL-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYL	-	-
23	OYL07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL	-	-
24	แจ้ง กฟอ.สพร.ปฏิบัติงานได้						
***สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า***							
25	เมื่อ กฟอ.สพร.แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหลดกลับ						
26	OYM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYM	-	-
27	ONC-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONC	-	-
28	ONC07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONC	-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
29	OYL-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYL		-	-
30	OYL07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		-	-
31	ย้ายโหลด ONC06 บางส่วนกลับจาก OYL06							
32	ONC03S-05	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สพร.		SF6	ตรงข้ามคอนทราย
33	SAU03S-04	ปลด	สับ		สพร.		DIS	ปากคลองลาดตะเข้
34	OYL06S-10	สับ	ปลด		สพร.	SCADA	SF6	ทางเข้า บ.ไวไว
35	ONC03S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6	ตรงข้ามคอนทราย
36	ย้ายโหลด OYM01 ทั้งหมดกลับจาก ONC06							
37	OYM01VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		OYM			-
38	SAU03S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6	คลองลาดตะเข้
39	OYM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYM		-	-
40	OYM01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYM		-	-
41	ONC-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONC		-	-
42	ONC06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONC		-	-
43	ONC07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONC		-	-
44	OYL-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYL		-	-
45	OYL06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		-	-
46	OYL07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		-	-
***สิ้นสุด Switching ทั้งหมด***								

งานวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2567 เปลี่ยน Dis SAU3S-05 เป็น SF6

ตามแผนงานตัดจ่ายสถานีอ้อมใหญ่ 4

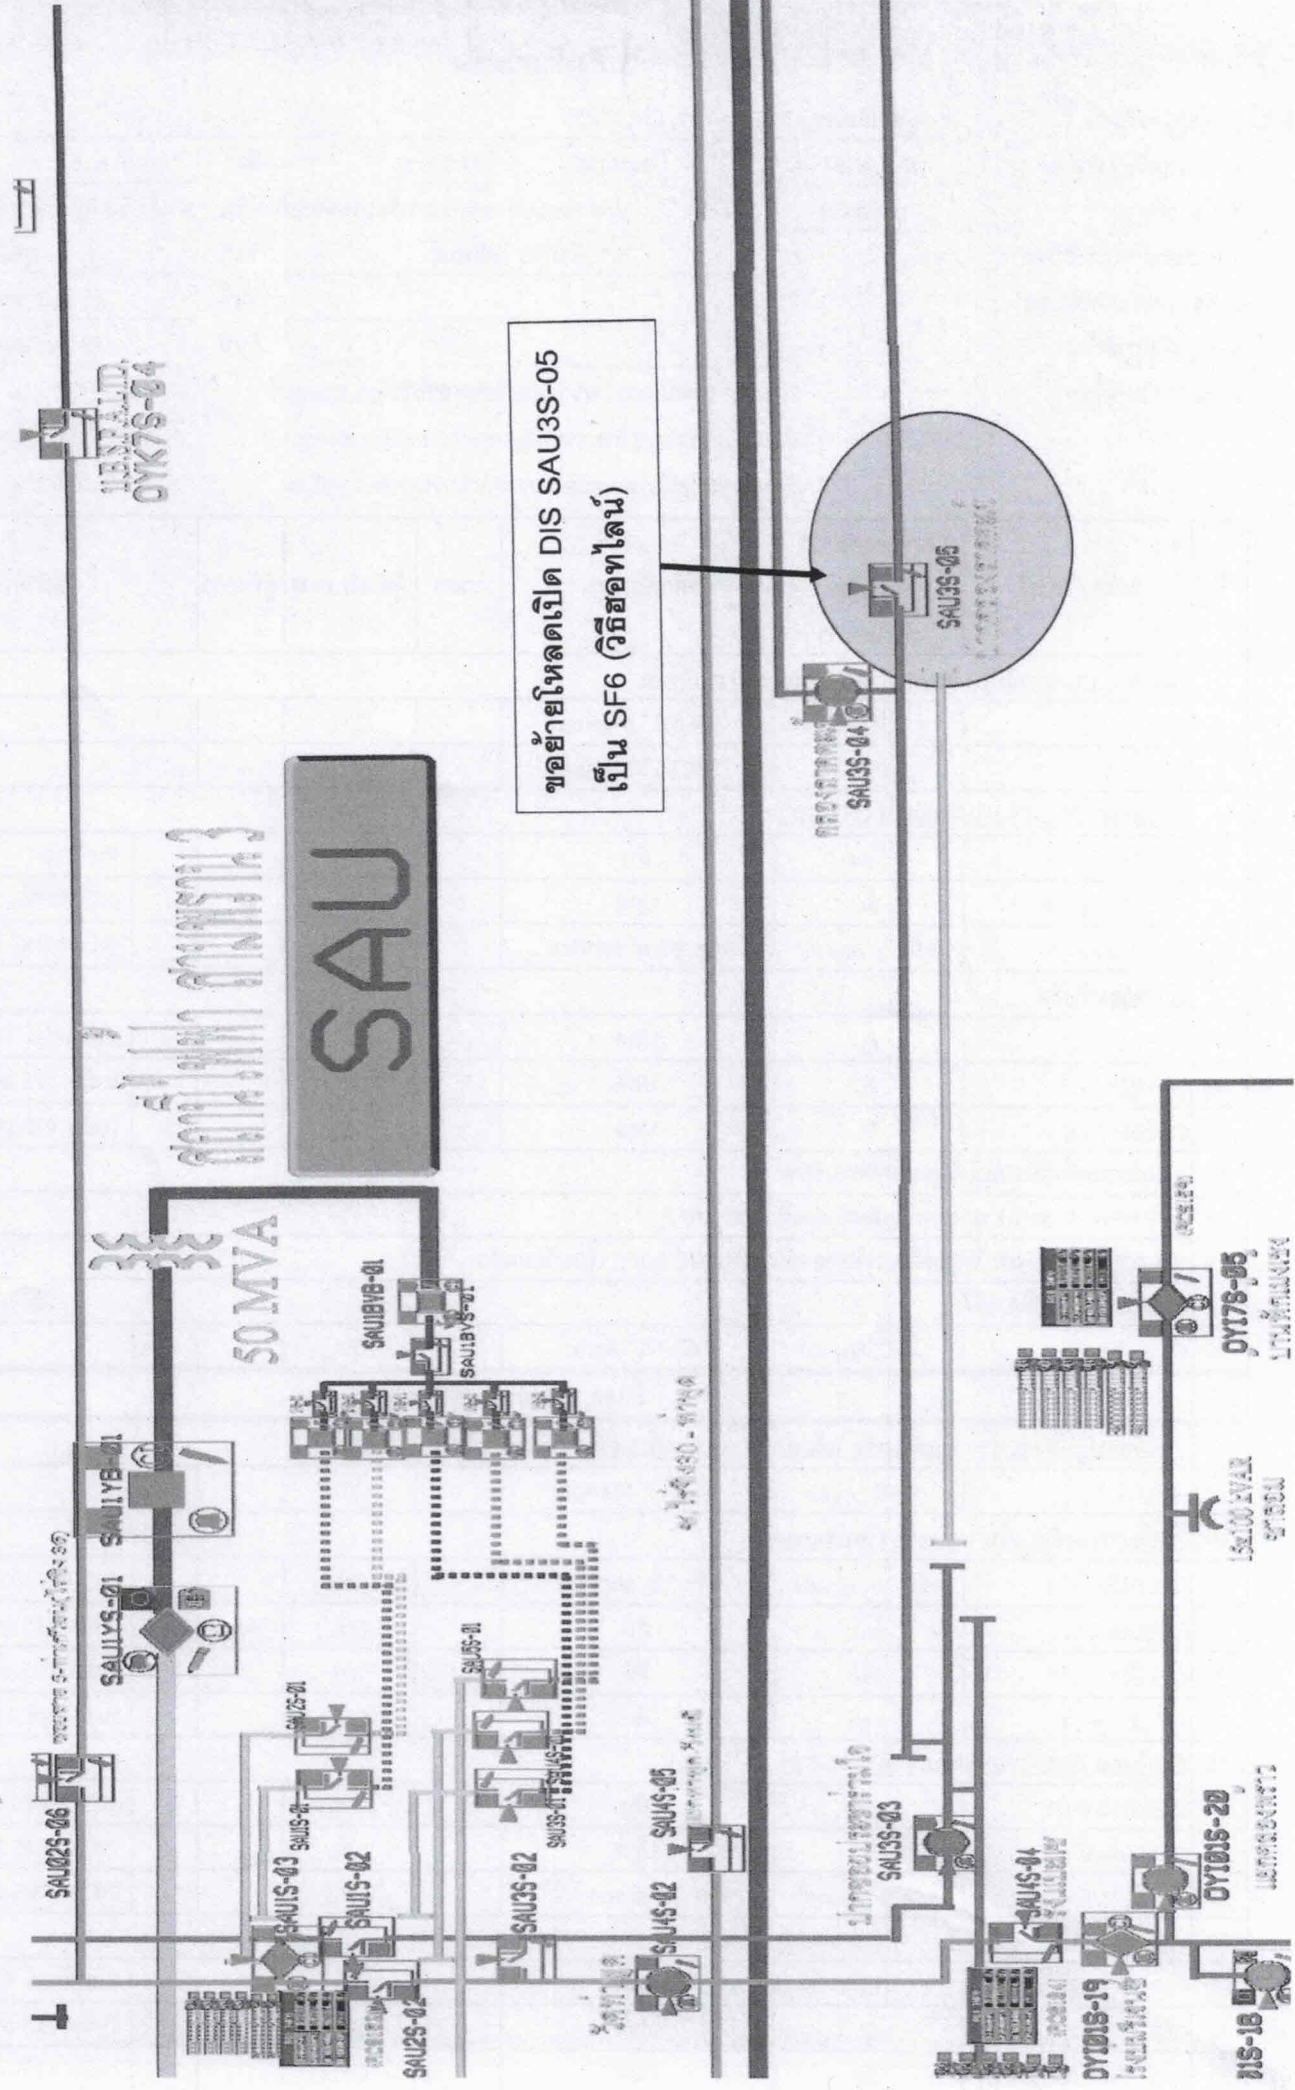

ขอย้ายโหมลเปิดเปิด Dis SAU3S-05 เป็น SF6 (วิธีชอทไลน์)

