

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ บสน.(ปบ.) ๒๓๓๓ /๒๕๖๘

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายเอกชัย หິงสุวรรณ

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.บางเลน

ด้วย กฟส.บางเลน จะขอตัดไฟแรงสูง ๑๑๕ kV. และ ๒๒ kV. เพื่อปฏิบัติงานติดตั้งสวิตช์ใบมีด ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	BEA10	22 ก.พ.68	08:30 น.	12:00 น.	ติดตั้งสวิตช์ใบมีด	BEA10S-03	BEA10S-06	นายธนภณ มีจันเพชร พงษ.5 ผบ.กฟส. บางเลน
2.	DTM6					DTM6S-04	DTM6S-05	
3.	115 kV.					BEA	DTM	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ดับไฟ) บ้านไม้คอกวัว

ผู้ประสานงานการดับไฟชื่อ นายประดิษฐ์ ไทยงามศิลป์ ตำแหน่ง ทพ.ปบ. โทร ๐๘๓-๖๓๒๒๖๕๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสขำรด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสขำรด ๑.๒ ไม่มีโอกาสขำรด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายเอกชัย หິงสุวรรณ)

ผจก.กฟส.บางเลน

หมายเหตุ

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ.พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ 1,2 จาก BEA10-03, DTM6S-04 ถึง BEA10S-06, DTM6S-05
ในวันที่ 22 ก.พ.68 ตั้งแต่เวลา 8:30 น. ถึง 12:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 238/2568

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ 3 จาก BEA24S-01 ถึง DTM24S-01
ในวันที่ ๒๒ ก.พ.68 ตั้งแต่เวลา 8:30 น. ถึง 12:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย วิศรุต วิจิตรไพโรจน์แก้ว ประสานงานขอตัดไฟกับ นายประดิษฐ์ ไทงามศิลป์ 10 ก.พ. 68

(นายธนภณ มีจันเพชร)

ก.๓, 7 วัจก.กฟส.บางเลน

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส. บก, กฟส. ดตบ.

อก.บข.(ก.๓),อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 3 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจฟ.1(สถานี) BEA, DTM

เพื่อทราบและจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา 8:00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

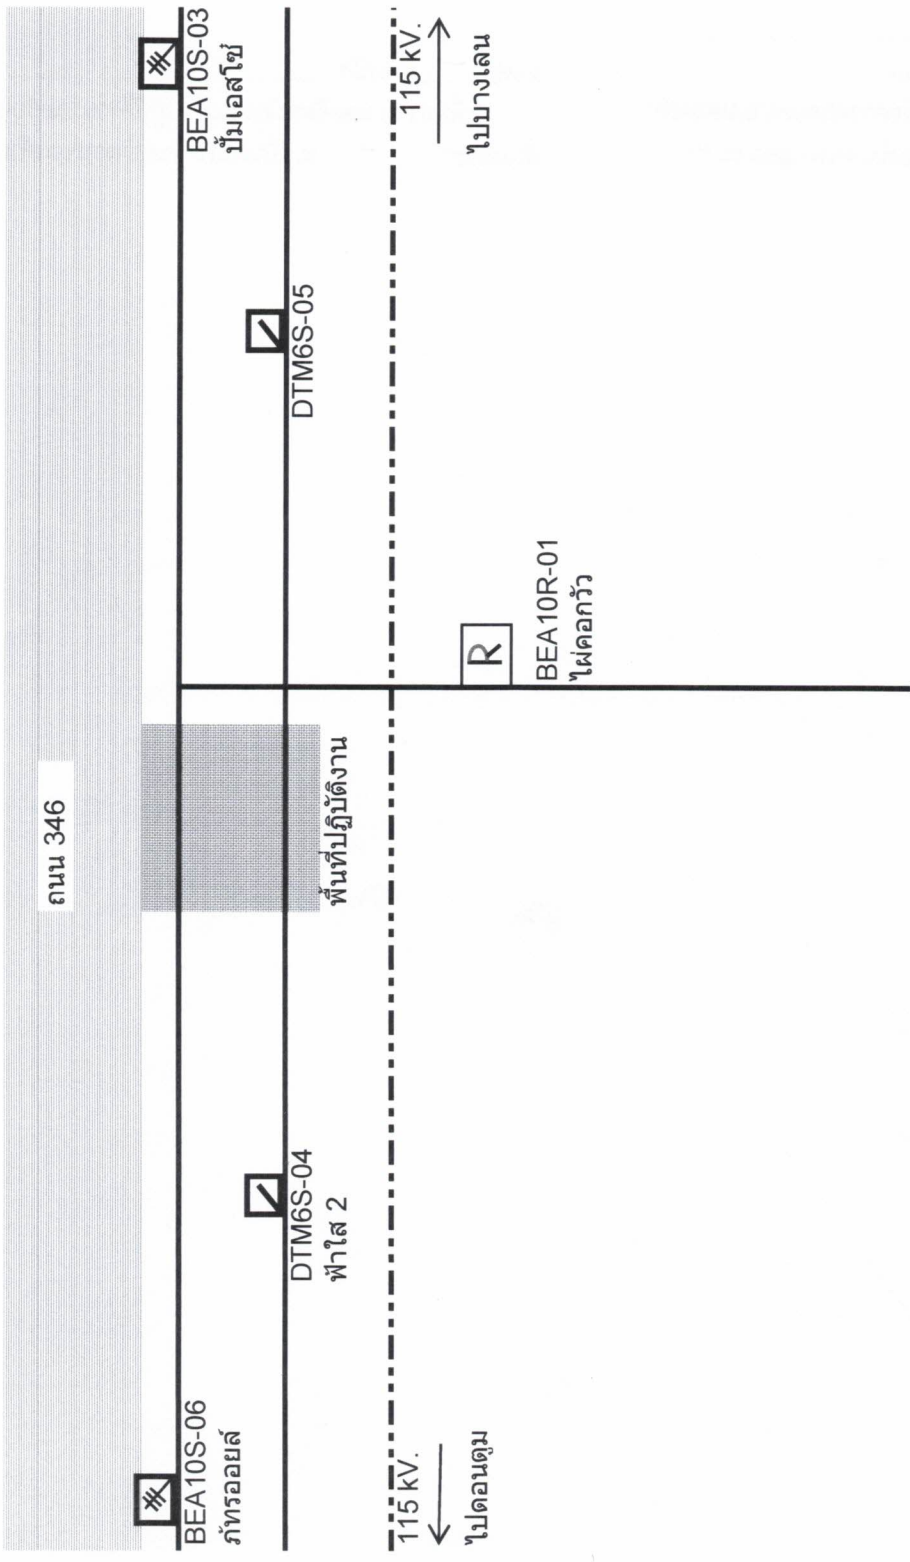
1. สถานที่ทำงาน	บริเวณปากทางเข้าวัดไม้คอกวัว					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	22 ก.พ. 68	เวลา	08.30 น.	ถึง	12.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.บล.	งานที่ทำ	ติดตั้ง DIS	ตามใบขอปฏิบัติงาน	238/2568	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวัฒนา สามศรีโพธิ์แก้ว			วันที่	12 กุมภาพันธ์ 2568	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	12 กุมภาพันธ์ 2568	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	12 กุมภาพันธ์ 2568	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมนอช 3. น.ส.สุภัชชา, น.ส.พิชญา, นายณัฐกาญจน์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายสามารถ				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	KS 7022	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EGAT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
3	DTM02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
4	BEA02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
5	BEA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEA		- โหลด 7.2 MW
6	BEA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEA		- โหลด 11.2 MW
7	BEA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		- โหลด 2.5 MW
8	BEA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		- โหลด 3.0 MW
9	BEA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		- โหลด 2.4 MW
10	DTM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		- โหลด 18.0 MW
11	DTM-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		- โหลด 12.5 MW
12	DTM01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		- โหลด 2.6 MW
13	DTM06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		- โหลด 1.6 MW
14	BEA10R-01	Normal	Nonreclosing		บล.		R ไม้คอกวัว
15	ย้ายโหลด BEA10 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก BEA05 (ผู้ใช้ไฟ 2 ราย โรงงานหุ่นยนต์, เหมืองทองพิดส์)						
16	BEA0BVB-01	ปลด	สับ		BEA	SCADA	CB ขนานบัส
17	BEA05S-08	ปลด	สับ		บล.		DIS รง.เหมืองทองพิดส์
18	BEA10S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บล.		DIS ตรงข้าม รง.เหมืองทองพิดส์
19	BEA05S-11	ปลด	สับ		บล.		DIS รง.หุ่นยนต์
20	BEA10S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บล.		DIS ตรงข้าม รง.หุ่นยนต์
21	BEA0BVB-01	สับ	ปลด		BEA		CB ขนานบัส
22	ย้ายโหลด DTM06 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก BEA06						
23	BEA06S-04	ปลด, ล็อคคาน	สับ		บล.		SF6 แยกไฟแดงอยู่ตามี้น
24	BEA10S-06	ปลด	สับ		บล.	SCADA	SF6 ภัทรออยล์
25	DTM0BVB-01	ปลด	สับ		DTM		CB ขนานบัส
26	DTM06S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บล.		DIS ฟ้าไส 2
27	DTM0BVB-01	สับ	ปลด		DTM		CB ขนานบัส

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	BEA10S-06	สับ	ปลด, ล็อกคาน		บล.	SCADA	SF6 ภัทรออยล์
29	ย้ายโหลด 115 เควี สถานีฯ ดอนตูม ไปรับไฟจาก สถานีฯ กำแพงแสน (EGAT)						
30	OFF ATS สถานีฯ ดอนตูม						
31	ตรวจสอบใบมีด 115 เควี รหัส DTM04YS-01,02 อยู่สถานะ "สับ"						
32	DTM04YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		DTM		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
33	DTM02YB-01	สับ	ปลด		DTM		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
34	DTM02YS-01	สับ	ปลด		DTM		- ใบมีด 115 เควี
35	DTM02YS-02	สับ	ปลด		DTM		- ใบมีด 115 เควี
36	ตรวจสอบ SF6 BEA10S-06 บริเวณ ภัทรออยล์ อยู่สถานะ "ปลด, ล็อกคาน"						
37	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
38	BEA02YB-01	สับ	ปลด		BEA		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
39	BEA02YS-01	สับ	ปลด		BEA		- ใบมีด 115 เควี
40	BEA02YS-02	สับ	ปลด		BEA		- ใบมีด 115 เควี
41	BEA10S-03	สับ	ปลด, ล็อกคาน		บล.		SF6 ปัมเอสโซ่
42	DTM06S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บล.		DIS ไค้งอีซูซู
43	BEA10R-01	สับ	ปลด		บล.		R บ้านไผ่คอกวัว
44	SW.Load R	สับ	ปลด		บล.		DIS SW.Load R บ้านไผ่คอกวัว
45	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
46	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G1						
47	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G2						
48	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G3						
49	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G4						
50	เมื่อไฟฟ้าทำงาน ทำการเทสไฟ และซ็อตกราวด์ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมให้ลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย						
51	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
52	KS 7022	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EGAT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
53	DTM04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
54	BEA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEA		-
55	BEA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEA		-
56	BEA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		-
57	BEA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		-
58	BEA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		-
59	DTM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		-
60	DTM-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		-
61	DTM01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		-
62	DTM06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		-
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
63	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จทุกชุด พร้อมจ่ายไฟทั้งหมด						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
64	KS 7022	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EGAT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
65	DTM04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
66	BEA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEA		-
67	BEA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEA		-
68	BEA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		-
69	BEA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		-
70	BEA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		-
71	DTM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		-
72	DTM-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		-
73	DTM01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		-
74	DTM06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		-
75	แจ้งพนักงาน ปลดช็อตกราวด์ จุด G1						
76	แจ้งพนักงาน ปลดช็อตกราวด์ จุด G2						
77	แจ้งพนักงาน ปลดช็อตกราวด์ จุด G3						
78	แจ้งพนักงาน ปลดช็อตกราวด์ จุด G4						
79	ตรวจสอบ DIS ติดตั้งใหม่ รหัส BEA10S-09 บริเวณปากทางเข้าวัดไผ่คอกวัว อยู่สถานะ "สับสนิทั้ง 3 เฟส"						
80	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
81	BEA02YS-01	ปลด	สับ		BEA		- ไบมีด 115 เควี
82	BEA02YS-02	ปลด	สับ		BEA		- ไบมีด 115 เควี
83	BEA02YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BEA		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
84	BEA10S-03	ปลด, ล็อคคาน	สับ		บล.		SF6 ปัมเอสโซ่
85	DTM06S-05	ปลด	สับ		บล.		DIS ไค้งฮือชู
86	SW.Load R	ปลด	สับ		บล.		DIS SW.Load R บ้านไผ่คอกวัว
87	BEA10R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing		บล.		R บ้านไผ่คอกวัว
88	ย้ายโหลด 115 เควี สถานีฯ ดอนตูม กลับจาก สถานีฯ กำแพงแสน (EGAT)						
89	DTM02YS-01	ปลด	สับ		DTM		- ไบมีด 115 เควี
90	DTM02YS-02	ปลด	สับ		DTM		- ไบมีด 115 เควี
91	DTM02YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		DTM		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
92	DTM04YB-01	สับ	ปลด		DTM		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
93	ON ATS สถานีฯ ดอนตูม						
94	ย้ายโหลด DTM06 บางส่วนกลับจาก BEA06						
95	BEA10S-06	ปลด, ล็อคคาน	สับ		บล.	SCADA	SF6 ภัทรออยล์
96	DTM0BVB-01	ปลด	สับ		DTM		CB ขนานบัส
97	DTM06S-04	ปลด	สับ		บล.		DIS ไฟฟ้า 2
98	DTM0BVB-01	สับ	ปลด		DTM		CB ขนานบัส
99	BEA10S-06	สับ	ปลด		บล.	SCADA	SF6 ภัทรออยล์
100	BEA06S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บล.		SF6 แยกไฟแดงอู่ท่าเมี้ยน

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
101	ย้ายโหลด BEA10 บางส่วนกลับจาก BEA05 (ผู้ใช้ไฟ 2 ราย โรงงานวุ้นเส้น, เจริญทองฟีดส์)						
102	BEA0BVB-01	ปลด	สับ		BEA	SCADA	CB ขนนานบัส
103	BEA10S-04	ปลด	สับ		บล.		DIS ตรงข้าม รง.เจริญทองฟีดส์
104	BEA05S-08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บล.		DIS รง.เจริญทองฟีดส์
105	BEA10S-05	ปลด	สับ		บล.		DIS ตรงข้าม รง.วุ้นเส้น
106	BEA05S-11	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บล.		DIS รง.วุ้นเส้น
107	BEA0BVB-01	สับ	ปลด		BEA	SCADA	CB ขนนานบัส
108	KS 7022	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EGAT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
109	DTM02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
110	BEA02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
111	BEA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEA		-
112	BEA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEA		-
113	BEA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		-
114	BEA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		-
115	BEA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		-
116	DTM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		-
117	DTM-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		-
118	DTM01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		-
119	DTM06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		-
120	BEA10R-01	Nonreclosing	Normal		บล.		R ไม้คอกวัว
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							



ฝั่งดับไฟปฏิบัติงาน ติดตั้งสวิตช์ใบมีด วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2568
