



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ ..... /๒๕๖๘  
ชื่อผู้รับ นายพัทพันธ์ พงษ์สุวรรณมงคล  
ชื่อผู้ส่ง นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอักษรเดชา

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘  
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ร.จ.ก.(ท.) กฟส.สท.

ด้วยการไฟฟ้าสุพรรณบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ย้ายจุดติดตั้ง SF6 SPA๐๗S-๐๒ ไทยประกัน เพื่อรับโหลด F๖ สฟ.๒ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑... แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	๗ สฟ.๑	๑๕/๐๓/๖๘	15.00	18.00	ย้ายจุดติดตั้ง SF6 SPA๐๗S-๐๒ ไทยประกัน	DDE ไทยสมุทร	SPA๐๗S-๐๒	นายวันฉลอง เทียนเทศ โทร. ๐๙๑-๖๐๙๑๐๙๓

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หม้อแปลงเฉพาะไลน์ ๓ เครื่อง

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายฉนวนกร สุวรรณประทีป ตำแหน่ง พ.ท.บ.(สท.) โทร ๐๙๑-๔๓๒๐๒๖๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟก. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

( นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอักษรเดชา )

ตำแหน่ง ร.จ.ก.(ท.) กฟส.สท.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ ๗ สฟ.๑ จาก ๗๐๕ ไทยสมุทร ถึง ๗๐๕ ไทยสมุทร - ๐๒  
ในวันที่ ๑๕-๓-๖๘ ตั้งแต่เวลา 15.00 น. ถึง 18.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 395/68

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ... พิดเตอร์... จาก... ถึง...  
ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่...  
พนักงานศูนย์ฯ นาย กิตติพัฒน์ สุวรรณอักษรเดชา ประสานงานการขอตัดไฟกับ กฟส.สท. สุพรรณบุรี

ร.จ.ก. (นางสาวรุจิรา วรวิญญูภักดิ์)

ชด. 5 แทน ทน.ตฟ.  
ขั้นตอนการสวิชชิ่ง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี...)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. ...

อก.บช.(ก.๓), ...

อก.ว.ว.(ก.๓)



อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

หน้าที 1 จาก 2  
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณไทยประกัน (SPA07)				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	9 มี.ค. 68	ระหว่าง	15.00 น.	ถึง	18.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สพ.	งานที่ทำ	ย้ายจุดติดตั้ง SPA07S-02 (ไทยประกัน)		ตามใบขอปฏิบัติงาน 395/2568
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด			วันที่	3 มีนาคม 2568
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	3 มีนาคม 2568
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	3 มีนาคม 2568
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นครินทร์,พีรภัทร,ขุนทอง,พนิต 2. ศุภสวัสดิ์,อนุสรณ์,วรรณพงษ์,มนเษ 3. จิรวัดน์,วัฒนา,พิชชา,วีรวัชร,อมร				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SPA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		CB -
3	SPB06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPB		CB -
4	ตรวจสอบ SPA07S-02 (SF6 ไทยประกัน) อยู่สถานะ <b>ปลด</b> และให้ดำเนินการ <b>Lock คาบ</b>						
5	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 15.00 น.						
6	แจ้ง กฟส.สพ. ให้ขอทไลน์ปลดสายลิตแรงสูง SPA07S-02 (SF6 ไทยประกัน) ทั้ง 2 ฟัง โดยวิธีขอทไลน์ แบบมีไฟได้						
7	เมื่อ กฟส.สพ. แจ้งขอทไลน์ปลดสายลิตแรงสูง SPA07S-02 (SF6 ไทยประกัน) ทั้ง 2 ฟัง แล้วเสร็จ						
8	แจ้ง กฟส.สพ. ไลน์โหลด SPA07 ตั้งแต่ SPA07S-02 (SF6 ไทยประกัน) - จุดตัด DDE บริเวณไทยสมุทร						
9	เมื่อ กฟส.สพ. แจ้งไลน์โหลด SPA07 ตั้งแต่ SPA07S-02 (SF6 ไทยประกัน) - จุดตัด DDE บริเวณไทยสมุทร แล้วเสร็จ						
10	แจ้ง กฟส.สพ. ให้ขอทไลน์ตัด DDE วงจร SPA07 บริเวณไทยสมุทร (ตามผังแนบ) โดยวิธีขอทไลน์ แบบมีไฟได้						
11	เมื่อ กฟส.สพ. แจ้งขอทไลน์ตัด DDE วงจร SPA07 บริเวณไทยสมุทร แล้วเสร็จ						
12	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
13	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
14	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
15	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe						
16	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย						
17	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
<b>สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า</b>							
18	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
19	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1						
20	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G2						
21	แจ้ง กฟส.สพ. ตรวจสอบสถานะ SPA07S-02 (SF6 ไทยประกัน) ที่ย้ายจุดติดตั้งใหม่ อยู่สถานะ <b>ปลด ,Lock คาบ</b>						
22	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
23	แจ้ง กฟส.สพ. ให้ขอทไลน์เชื่อมสายลิตแรงสูง SPA07S-02 (SF6 ไทยประกัน) ทั้ง 2 ฟัง โดยวิธีขอทไลน์ แบบมีไฟได้						
24	เมื่อ กฟส.สพ. แจ้งขอทไลน์เชื่อมสายลิตแรงสูง SPA07S-02 (SF6 ไทยประกัน) ทั้ง 2 ฟัง แล้วเสร็จ						
25	แจ้ง กฟส.สพ. ให้ขอทไลน์เชื่อม DDE วงจร SPA07 บริเวณไทยสมุทร (ตามผังแนบ) โดยวิธีขอทไลน์ แบบมีไฟได้						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	เมื่อ กฟส.สพ. แจ้งขอทไลน์เชื่อม DDE วงจร SPA07 บริเวณไทยสมุทร แล้วเสร็จ						
27	SPA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		CB -
28	SPB06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPB		CB -
29	แจ้ง กฟส.สพ. <u>ปลด .Lock คาน</u> SPA07S-02 (SF6 ไทยประกัน) ออก						
<u>สิ้นสุด Switching ทั้งหมด</u>							



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบ.กฟส.สพ.

ถึง ผจก.กฟส.สพ.

เลขที่ ก.๓ สพ.(ปบ.)-

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟส.สพ./รจก.กฟส.สพ.

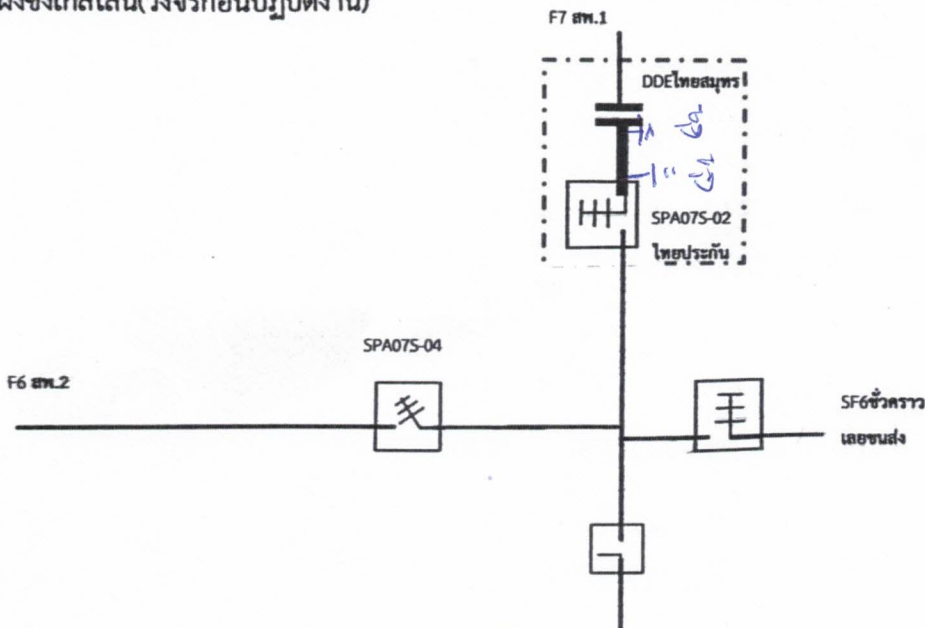
ด้วยในวันที่.. ๗ มี.ค.๖๘ ... ตั้งแต่เวลา 15.00 - 18.00 น. กฟส.สุพรรณบุรี มีแผนงานดับไฟบริเวณ อบจ.สพ.-

SF๖ SPA๐๗S-๐๒ ไทยประกัน เพื่อย้ายSF๖ SPA๐๗S-๐๒ ไทยประกัน

ฟีดเดอร์ ๗ สถานีสุพรรณบุรี๑

กฟจ.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้นายวันฉลอง เทียนเทศ พงช.๖ ผบ.กฟจ.สพ. โทร ๐๙๑-๖๐๙๑๐๙๓ เป็นผู้ควบคุมงานและ ให้นายพิบูล ปานขำ ตำแหน่ง ขม.ปบ.สพ. โทร ๐๙๘-๒๗๕๓๖๔๐ เป็นผู้ประสานงานการ จ่ายไฟเพื่อ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด

แผนผังเชิงเกิดไลน์(วงจรก่อนปฏิบัติงาน)



ดับไฟระบบจำหน่าย ๒๒ เควี เพื่อปฏิบัติงานย้ายจุดติดตั้งSF๖ไทยประกัน SPA๐๗S-๐๒

๑.ย้ายโหนดพื้นที่จุดปฏิบัติงาน

๒.ปลดโหนดพื้นที่ปฏิบัติงาน Hotlineสพ.ตัดเคด ๑จุด

๓.ชุดHotlineสพ.ปฏิบัติงานร่วมกับชุดซ่อมย่อยสุพรรณ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย

อนุมัติ

(นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอัครเดชา)

รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สพ.

(นายธนากร สุวรรณประทีป)

พงช.๖(สข.) ผบ.กฟส.สพ.

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา โทร. ๐๓๕-๕๓๕๑๖๗-๘ , ๑๔๘๕๕ , ๑๔๘๖๐
