



Switching Deadline

28 ก.พ. 68

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.นญช.(ก) ๒๖/๒๕๖๘
 ชื่อผู้รับ นายพัทธรินทร์ พงษ์สุวรรณชล
 ชื่อผู้ส่ง นายนิศากร แซ่มโซติ

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
 ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)
 ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.นญช.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.หนองหญ้าไซ ขอตัดกระแสไฟฟ้าชั่วคราวเพื่อดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายหลัง DIS บ้านหนองหัวเรือ DAA๐๖S-๐๙ วงจร LWA๐๓ สถานีไฟฟ้าเลขขวัญ ตามแผนผังสังเขปแนบจำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	LWA๐๓	๑ มี.ค. ๒๕๖๘	๑๓.๐๐ น.	๑๕.๐๐ น.	ขอตัดกระแสไฟฟ้าชั่วคราวเพื่อดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านหนองหัวเรือ ชุดแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง เปิด DIS บ้านหนองหัวเรือ DAA๐๖S-๐๙	วงจรพิดเดอร์ ๓ สถานีเลขขวัญ LWA๐๓ DIS บ้านหนองหัวเรือ DAA๐๖S-๐๙ สถานีเลขขวัญพิดเดอร์ ๑๔.๗๖๖๑๘๘, ๑๙.๘๕๓๒๓๘	สุดไลน์พิดเดอร์ ๑๔.๗๔๒๙๒๘, ๑๙.๘๕๙๙๙๕	นายศุภลักษณ์ อังศิริ
เร่งด่วน								

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายศุภลักษณ์ อังศิริ ตำแหน่ง ช.ผ.ก.ป. โทร. ๐๘๖-๖๖๘-๕๑๕๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
 ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายนิศากร แซ่มโซติ)

ผู้จัดการ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาหนองหญ้าไซ

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ LWAS จาก D9A6S-๑9 ถึง ๑๓ ไลน์
ในวันที่ 15.๑.๖8 ตั้งแต่เวลา 13.๐๐ น. ถึง 15.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่ A10/2568

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่.....
พนักงานศูนย์ฯ นาย วัฒนพงษ์ วัฒนชัย ประสานงานการขอดับไฟกับ นายอดิศักดิ์ อธิวิ

อดิศักดิ์ อธิวิ
นายอดิศักดิ์ อธิวิ
๖๗๖-5 ๓๓๓๓.๐๗.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ.๓
อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชซึ่ง 1 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น
ผจฟ. (สถานี.....)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน DAA06S-09(บ้านหนองหัวเรือ)-สุตระบบจำหน่าย
2. กำหนดวันที่ทำงาน 1 มี.ค. 68 ระหว่าง 13.00 น. ถึง 15.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟส.นญช. งานที่ทำ ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงกรณีเร่งด่วน ตามใบขอปฏิบัติงาน 410/2568
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายมน โทงย้อย วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย ~~กัม~~ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568
6. อนุมัติสวิตชิงโดย ~~กัม~~ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายนครินทร์, นายพิภกร, นายขุนทอง, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายโมช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวิรัช, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	แจ้ง กฟส.นญช. ให้ บริษัททีเอ็ม พาวเวอร์ แมเนจเมนต์ หยุดขนานไฟ พร้อมลง Do หน้า บ. ทีเอ็ม พาว/อกร 00ก.						
3	DAA06R-03	Normal	Non-Reclosing		นญช.		R วัตทองเงิน
4	พร้อมดับไฟ เวลา 13.00 น.						
5	DAA06S-09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นญช.		DIS บ้านหนองหัวเรือ
6	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ กฟส.นญช. รับทราบ						
7	แจ้งชุดปฏิบัติงาน กฟส.นญช. ทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G1						
8	แจ้งชุดปฏิบัติงาน กฟส.นญช. ทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G2						
9	เมื่อ กฟส.นญช. ทำการ Test ไฟ และ Short Ground พร้อมลงข้อมูลใน WeSafe เรียบร้อยแล้ว แจ้งให้ชุดปฏิบัติงานได้						
10	DAA06R-03	Non-Reclosing	Normal		นญช.		R วัตทองเงิน
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
11	เมื่อ กฟส.นญช. แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
12	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
13	แจ้งชุดปฏิบัติงาน กฟส.นญช. ทำการปลด Short Ground จุด G1						
14	แจ้งชุดปฏิบัติงาน กฟส.นญช. ทำการปลด Short Ground จุด G2						
15	หลังจากชุดปฏิบัติงานปลด Short Ground แล้วเสร็จ พร้อมยืนยันลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
16	DAA06R-03	Normal	Non-Reclosing		นญช.		R วัตทองเงิน
17	พร้อมจ่ายไฟ						
18	DAA06S-09	ปลด	สับ		นญช.		DIS บ้านหนองหัวเรือ
19	แจ้ง กฟส.นญช. ให้ บริษัททีเอ็ม พาวเวอร์ แมเนจเมนต์ ขนานไฟได้ปกติ ลง Do หน้า บ. ทีเอ็ม พาว/อกร 00ก.						
20	DAA06R-03	Non-Reclosing	Normal		นญช.		R วัตทองเงิน
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							


แผ่นที่ ๑

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่บริการไฟฟ้าชั่วคราว

เพื่อดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณบ้านหนองหัวเรือ

หลัง DIS บ้านหนองหัวเรือ DAA06S-09 วงจร LWA03 สถานีไฟฟ้าเสาขาว

วันเสาร์ที่ ๑ มี.ค. ๒๕๖๘ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.

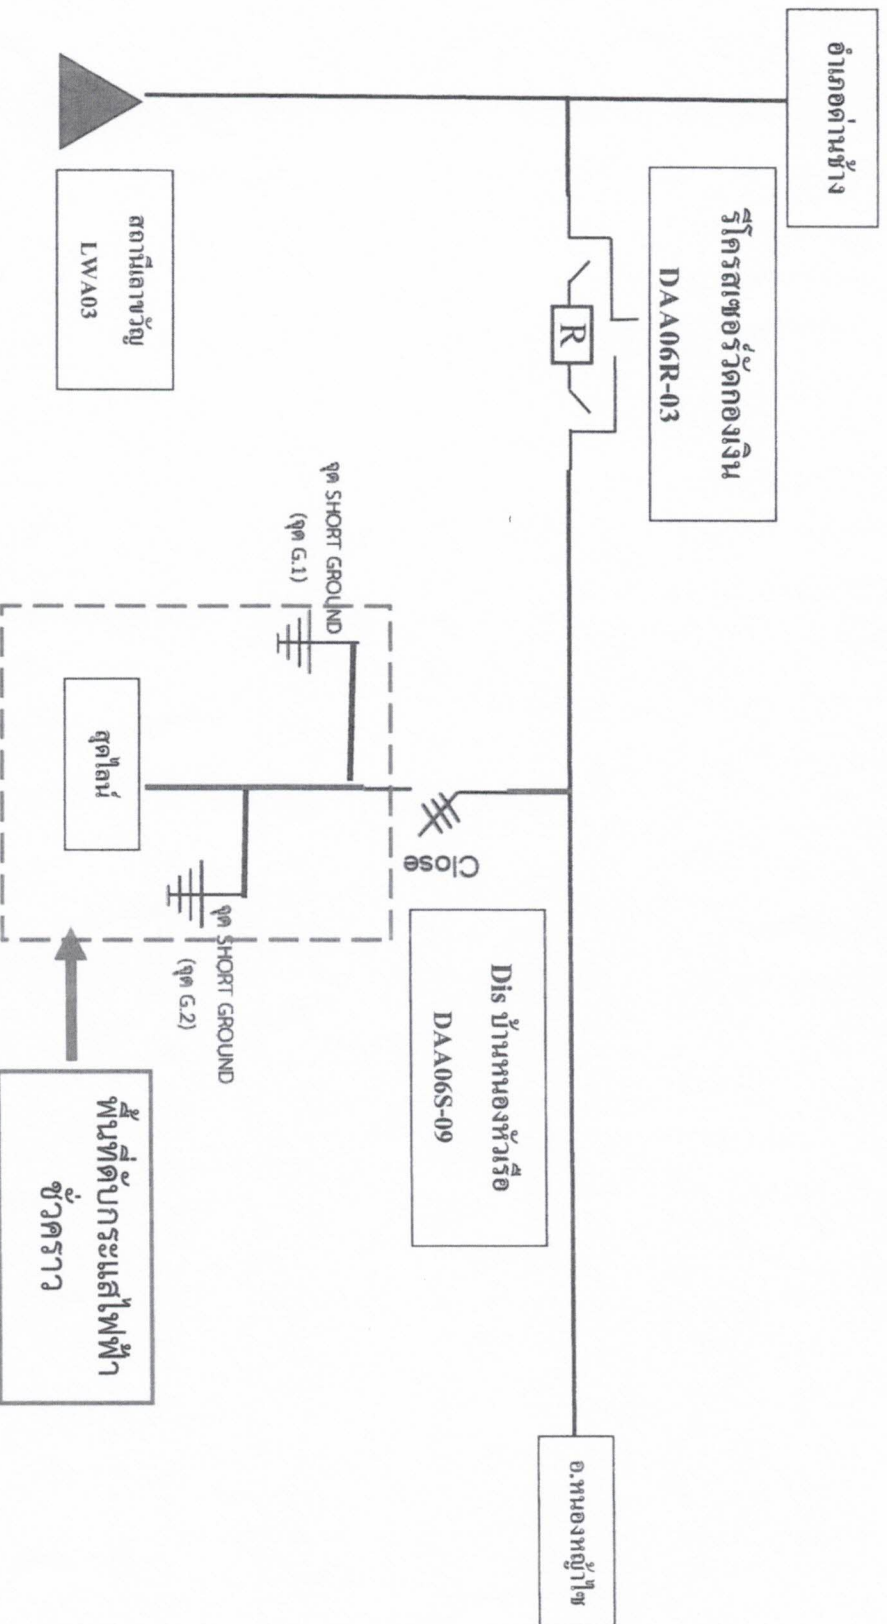

หมายเหตุ หลังการปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ ย้ายโหนดกลับสภาพเดิม
