



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline

12 มี.ค. 68

เลขที่ ก.ต.สพร.(ปบ.) **00851**
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณพิชิต
ชื่อผู้ส่ง นายวณภูมิ บำรุงศรี

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๘
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ ตัดไฟปรับปรุง ๒๒KV ช่วงโค้งบ่อกุ้ง - ตรอ.คลองจินดา ตาม
แผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงาน/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SAB๐๕	๑๕ มี.ค.๖๘	๐๘.๓๐	๑๖.๓๐	-ตัดไฟปรับปรุง ๒๒KV ช่วง Disชั่วคราว บ่อกุ้ง-ตรอ.คลองจินดา	Disชค.บ่อกุ้ง	-Disชค. ก่อนถึง คลอง ผญ.โต๊ะ	นายนพดล ปึกษาทอง ๐๘๘-๙๖๒๖๕๙

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ตั้งแต่โค้งบ่อกุ้ง - ตรอ.คลองจินดา

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายนิติชัย ผูกนิม ตำแหน่ง ชผ.ปบ. โทร ๐๘๖-๓๑๗๗๗๖๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓. พิกัดพื้นที่ตัดไฟ

๓.๑ เริ่มต้น Lat : ๑๓.๗๐๙๓๙

Long : ๑๐๐.๑๕๒๐๕

๓.๒ สิ้นสุด Lat : ๑๓.๗๐๑๖๐

Long : ๑๐๐.๑๔๘๒๓

ลงชื่อ 

(นายวณภูมิ บำรุงศรี)

รจก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สามพราน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร


อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ | ฟีดเดอร์ SAB๐๕ จาก Dis. โค. บ่อกุ้ง ถึง Dis ชค. ก่อนถึง คลอง ผญ.โต๊ะ
ในวันที่ 15 มี.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 432/68

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สวรรค์ จิตภานุศักดิ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ ผอ.ศูนย์ฯ ผูกนิม


(นางสาวสุภาวรา ลงดับบุษพัก)

รจก. 5 แทน นพดล

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. นพส. สนิท, นพส. กชช.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา...น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รจก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน
2. กำหนดวันที่ทำงาน
3. ผู้ขอทำงาน
4. เตรียมการสวิตชิงโดย
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย
6. อนุมัติสวิตชิงโดย
7. สั่งทำสวิตชิงโดย

DIS ชค.บ่อแก้ว - DIS ชค.ก่อนถึงคลอง ผญ.โต๊ะ

15 มี.ค. 68	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	16.30 น.
กฟอ.สพร.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	ตามใบขอปฏิบัติงาน	432/68
	นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์		วันที่	10 มีนาคม 2568
	<i>จุสมท</i>		วันที่	10 มีนาคม 2568
			วันที่	10 มีนาคม 2568

1. นส.สุภัชชา, นส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายส (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
2. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีร์วัชร, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
3. นายนครินทร์, นายพีรภัทร, นายชุนทอง, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง							
1	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
2	SAB05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สพร.	R	อบต.คลองจินดา, วัตวังน้ำขาว
3	KTE-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTE	-	-
4	KTE07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE	-	LOAD 5.59 MW
ย้ายโหลด SAB05 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก KTE07							
6	KTE07S-06	ปลด	สับ		สพร.	SCADA SF6	ก่อนแยก รร.หนองนกไข่
7	KTE07S-07	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สพร.	SCADA SF6	คลอลาดชะโด
8	DIS ชค.ไลน์ SAB05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.	DIS	ก่อนคลอลง ผญ.โต๊ะ
9	KTE07S-06	สับ	ปลด		สพร.	SCADA SF6	ก่อนแยก รร.หนองนกไข่
เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.30 น.							
11	DIS ชค.ไลน์ SAB05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.	DIS	บ่อแก้ว
แจ้ง กฟส.สพร Test ไฟดับแล้วทำการ Short Ground จุด G1							
แจ้ง กฟส.สพร Test ไฟดับแล้วทำการ Short Ground จุด G2							
แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงาน รับทราบ							
แจ้งให้ผู้ควบคุมงานทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อย							
16	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
17	SAB05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สพร.	R	อบต.คลองจินดา, วัตวังน้ำขาว
18	KTE-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTE	-	-
19	KTE07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE	-	-
แจ้ง กฟส.สพร.ปฏิบัติงานได้							
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
เมื่อ กฟส.สพร.แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
22	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
23	SAB05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สพร.	R	อบต.คลองจินดา, วัตวังน้ำขาว
24	KTE-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTE	-	-
25	KTE07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE	-	-
แจ้ง กฟส.สพร.ทำการปลด Short Ground จุด G1							
แจ้ง กฟส.สพร.ทำการปลด Short Ground จุด G2							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
29	KTE07S-06	ปลด	สับ		สพร.	SCADA	SF6 ก่อนแยก รร.หนองนกไข่
30	DIS ชค.ไลน์ SAB05	ปลด	สับ		สพร.	DIS	บ่อกึ่ง
31	ย้ายโหลด SAB05 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก KTE07						
32	DIS ชค.ไลน์ SAB05	ปลด	สับ		สพร.	DIS	ก่อนคลอง ผญ.โต๊ะ
33	KTE07S-07	สับ	ปลด		สพร.	SCADA	SF6 คลองลาดชะโด
34	KTE07S-06	สับ	ปลด		สพร.	SCADA	SF6 ก่อนแยก รร.หนองนกไข่
35	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
36	SAB05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สพร.	R	อบต.คลองจินดา, วัดวังน้ำขาว
37	KTE-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTE	-	-
38	KTE07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE	-	-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

งานดับไฟวันเสาร์ที่ 15 มีนาคม 2568 ปรับปรุงระบบ 22KV

ช่วงโค้งบ่อกุ่ม - ตรอก.คลองจันทา

RECR BY
SABSS BY
R.08 K

ขนาด

FRTR Close


อุปกรณ์	ขนาด
Bus Bar	100mm ²
Bus Line	100mm ²
Bus Load	100mm ²
Substation	100mm ²

Dis ชก.ก่อนคลอง
ผญ.โต๊ะ

Dis ชก.บ่อกุ่ม



SABSS-18
คลอง ผญ.โต๊ะ

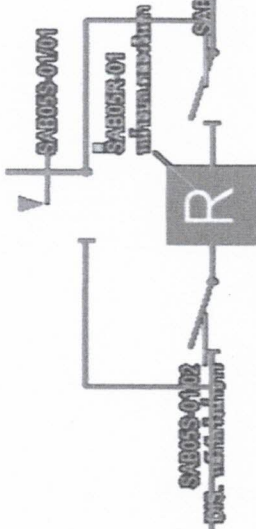

SAB5R-01 หน้า อบต.คลองจันทา	
31 A	Mode Remote
31 A	AR On
32 A	OND Trip Normal
21.67 A	Relay On
FRTR Close	

D/O สหพานคลองจันทา
SAB05F-20
