



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทย์ขอดับไฟ

Switching Deadline

11 เม.ย. 68

เลขที่ ก.ต.สค.(ปน) ๑๙๕๓ / ๒๕๖๘
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พธิวรธรรมชล
ชื่อผู้ส่ง นายวิโรจน์ เอกอำไพ

วันที่ ๒๖ มี.ค. ๒๕๖๘
ตำแหน่ง อ.ก.ปน.(กต)
ตำแหน่ง ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สค.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.สค. จะขอดับไฟเพื่อติดตั้งระบบการวัดค่าสายลานไก จุดจ่ายไฟชั่วคราวสถานีท่าทราย ๑ ตาม
แผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๑๑๕ kV SME	๑๕ เม.ย. ๖๘	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ติดตั้งระบบการวัดค่า สายลานไก จุดจ่ายไฟ ชั่วคราวสถานีท่าทราย ๑	จุดปลดสายโดยวิธี ฮอทไลน์กระเช้า ๑๑๕ เควี สะพานลอยหน้า นิคมอุตสาหกรรม	สถานีท่าทราย ๑	นายศราวุธ ชื่นจิตร โทร. ๐๖๑๓๔๒๕๕๔๖

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายจิรวัฒน์ บุญพร้อม ตำแหน่ง พชง.๒ โทร ๐๘๖๓๘๓๒๐๙๐

พื้นที่ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ.(หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ ☐ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ☐ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายวิโรจน์ เอกอำไพ)

ตำแหน่ง ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สค.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 15kv จาก TH505YB-01 ถึง จุดตัด DDE อู่ซ่อมสายอากาศบริเวณ
ในวันที่ 15 เม.ย. 68 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 501/68
อู่ซ่อมสาย
☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย จีรวัฒน์ แก้วอินทธี ประธานงานการขอดับไฟฟ้า พณ จีรวัฒน์ บุญช่วย
7 เม.ย. 68

(พณ จีรวัฒน์ แก้วอินทธี)
อ.ศก.5 เขต ๖ แผนฯ คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. คฟ.๓

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ 3 แผน
แผนผังแนบ 2 แผน

ผจฟ. 1 (สถานี TH5)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง


1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ ท่าทราย 1			
2. กำหนดวันทำงาน	15 เม.ย. 68	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สค.	งานที่ทำ	ติดตั้งกราวด์ตาข่ายลานโก	ตามใบขอปฏิบัติงาน 501/2568
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายจิรวัฒน์ แก้วสมนึก			วันที่ 7 เมษายน 2568
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่ 7 เมษายน 2568
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่ 7 เมษายน 2568
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจิรวัฒน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นางสาวสุภัชชา,นางสาวพิชยา,นายณัฐภาณุจน์,นายศักดิ์สิทธิ์,นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายวรรณพงษ์,นายมนโชน (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)			

[illegible]

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
32	เมื่อชุด Hotline 115 เควี ทำการปลดจุดจัม 115 เควี บริเวณสะพานลอยปากทางนิคมฯ สมุทรสาคร ออกแล้วเสร็จ						
33	แจ้งสถานะพื้นที่ไต่ดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
34	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe						
35	THS15VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THS		CB
36	THU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THU		TP1
37	THUBR-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THU		R
38	THUBR-02	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THU		R
39	THUBR-03	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		THU		R
40	SN2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		TP
41	SMB01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB		CB
42	SMD03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMD		CB
43	SMO01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMO		CB
44	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย						
45	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
46	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
47	THS15VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THS		CB -
48	THU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THU		TP1 -
49	THUBR-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THU		R -
50	THUBR-02	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THU		R -
51	THUBR-03	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		THU		R -
52	SN2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		TP -
53	SMB01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB		CB -
54	SMD03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMD		CB 115 เควี
55	SMO01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMO		CB 115 เควี
56	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟสายส่ง 115 kV						
57	แจ้งชุด Hotline 115 เควี ทำการจัม DDE 115 เควี บริเวณสะพานลอยปากทางนิคมฯ สมุทรสาคร เข้าได้						
58	เมื่อชุด Hotline 115 เควี ทำการจัม DDE 115 เควี บริเวณสะพานลอยปากทางนิคมฯ สมุทรสาคร แล้วเสร็จ						
59	- จ่ายไฟสถานี THS						
60	THS05YS-01	ปลด	สับ		THS		DIS ใบมีด 115 เควี
61	THS05YS-02	ปลด	สับ		THS		DIS ใบมีด 115 เควี
62	THS05YB-01	ปลด	สับ		THS		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
63	ควบคุมปรับแรงดันหม้อแปลง THS-TP3 ไว้ 22.7 kV						
64	THS03BVB-01	ปลด	สับ		THS		CB INC.03
65	THS15S-03	สับ	ปลด		สก.	SCADA	SF6 บ.สยามอินเตอร์ลีดคเทค
66	- ย้ายโหลด THS11 กลับจาก SMB01						
67	THS11VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		THS		CB THS11
68	SMB01S-05	สับ	ปลด		สก.	SCADA	SF6 ปากช.นิคมฯ
69	- ย้ายโหลด THS13 กลับจาก THU01						
70	THS13VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		THS		CB THS13
71	THS10S-02	สับ	ปลด		สก.	SCADA	SF6 บ.แบ่งเด็กนารัก
72	- ย้ายโหลด THS14 ไปรับไฟจาก THU03						

[illegible]

สถานการณ์การจ่ายไฟฟ้าก่อนปฏิบัติงาน

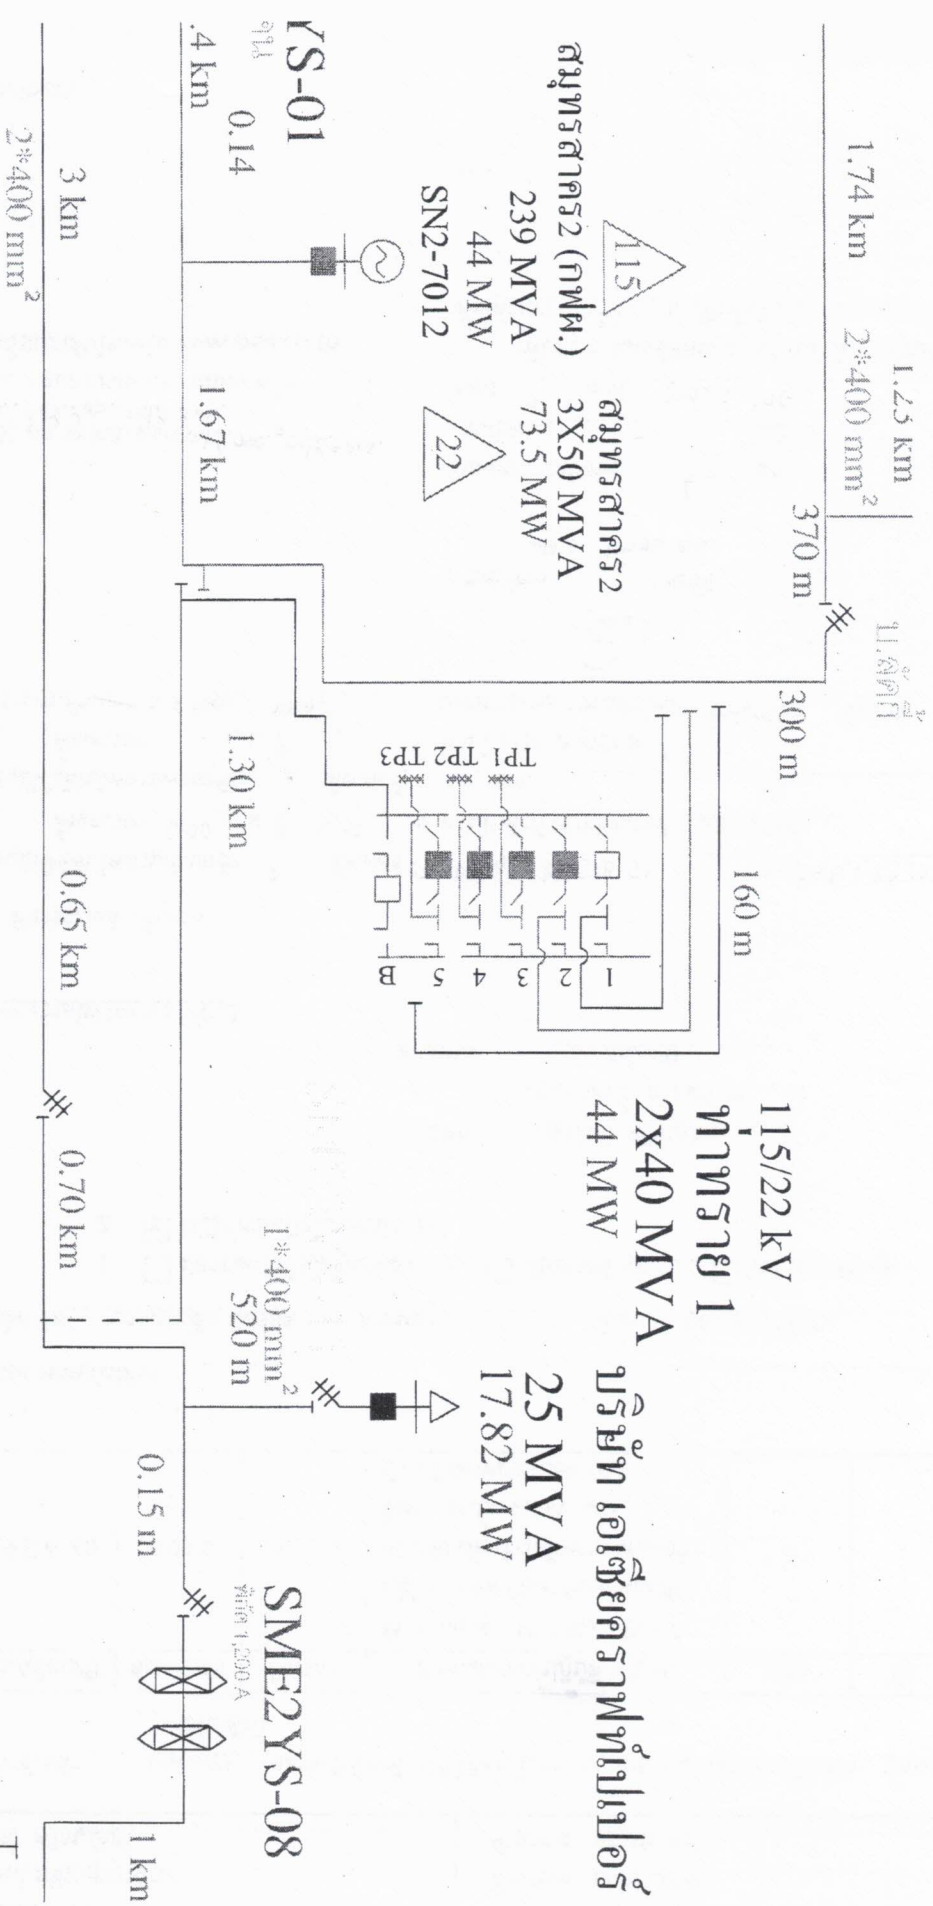

สถานการณ์จ่ายไฟฟ้าก่อนปฏิบัติงาน

